



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Construção da Vara do Trabalho de Arroio Grande/RS

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE OBRAS CONTRATO TRT Nº 140/2017

Período 23/02/2019 a 27/03/2019

Medição 12

Execução

CONSTRUTORA LF LTDA - EPP

Fiscalização

SEFISC - SEÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

Eng. Civil Frederico Zerfass CREA RS 150.968 D



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO
Av. Praia de Belas, 1.100 – CEP 90.110-903 – Porto Alegre/RS
Fone: (51) 3255-2000 - <http://www.trt4.jus.br/>

Relatório

No período de 23/02/2019 a 27/03/2019 a contratada executou:

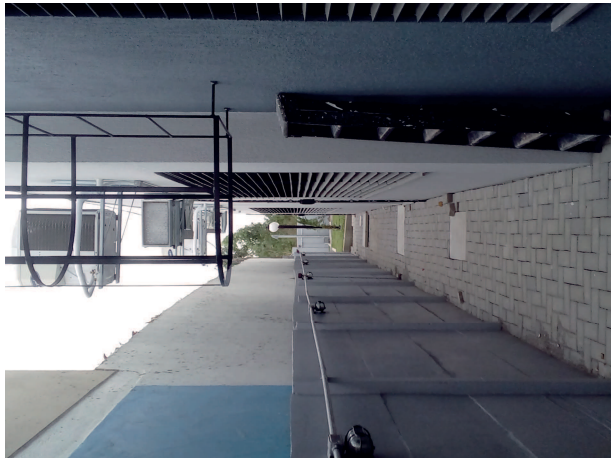
- Pisos internos e externos;
- Ajardinamento;
- Revestimentos internos;
- Instalações de acessibilidade;
- Pinturas internas;
- Pinturas dos brises, grades e corrimãos;
- Instalação de louças e metais;
- Instalações de esgoto;
- Instalações elétricas;
- Instalações de balcão copa;
- Muros;
- Gradil;
- Acessórios externos.

A fiscalização realizou a 12ª medição, que totalizou R\$141.142,11 (8,25% do valor atualizado do contrato). A medição acumulada totaliza 94,19% do total do contrato. Transcorreram 406 dias de um total de 365.

Frederico Zerfass


Seção de Fiscalização de Obras e Serviços


Eng. Civil CREA RS 150.968 D





OBRA				ARROIO GRANDE				12ª MEDIÇÃO				R\$ 141.142,11												SALDO GERAL			
CONTRATADA:				Construtora LF LTDA - EPP																							
PROCESSO PRINCIPAL:				nº 0006774-20.2017.5.04.0000																							
PROCESSO LIQUIDAÇÃO:				nº 0000421-27.2018.5.04.0000																							
CONTRATO:				140/2017																							
ORDEM DE INÍCIO:				14/02/2018																							
VALOR ORIGINAL DO CONTRATO:				R\$ 1.691.165,78																							
VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO:				R\$ 1.710.499,21																							

Página 2 de 3

Página 3 de 3
