


# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

## PROJETOS DA SETIC PDTI 2016-2017

Data: Dezembro/2017 v1.2

### 1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria

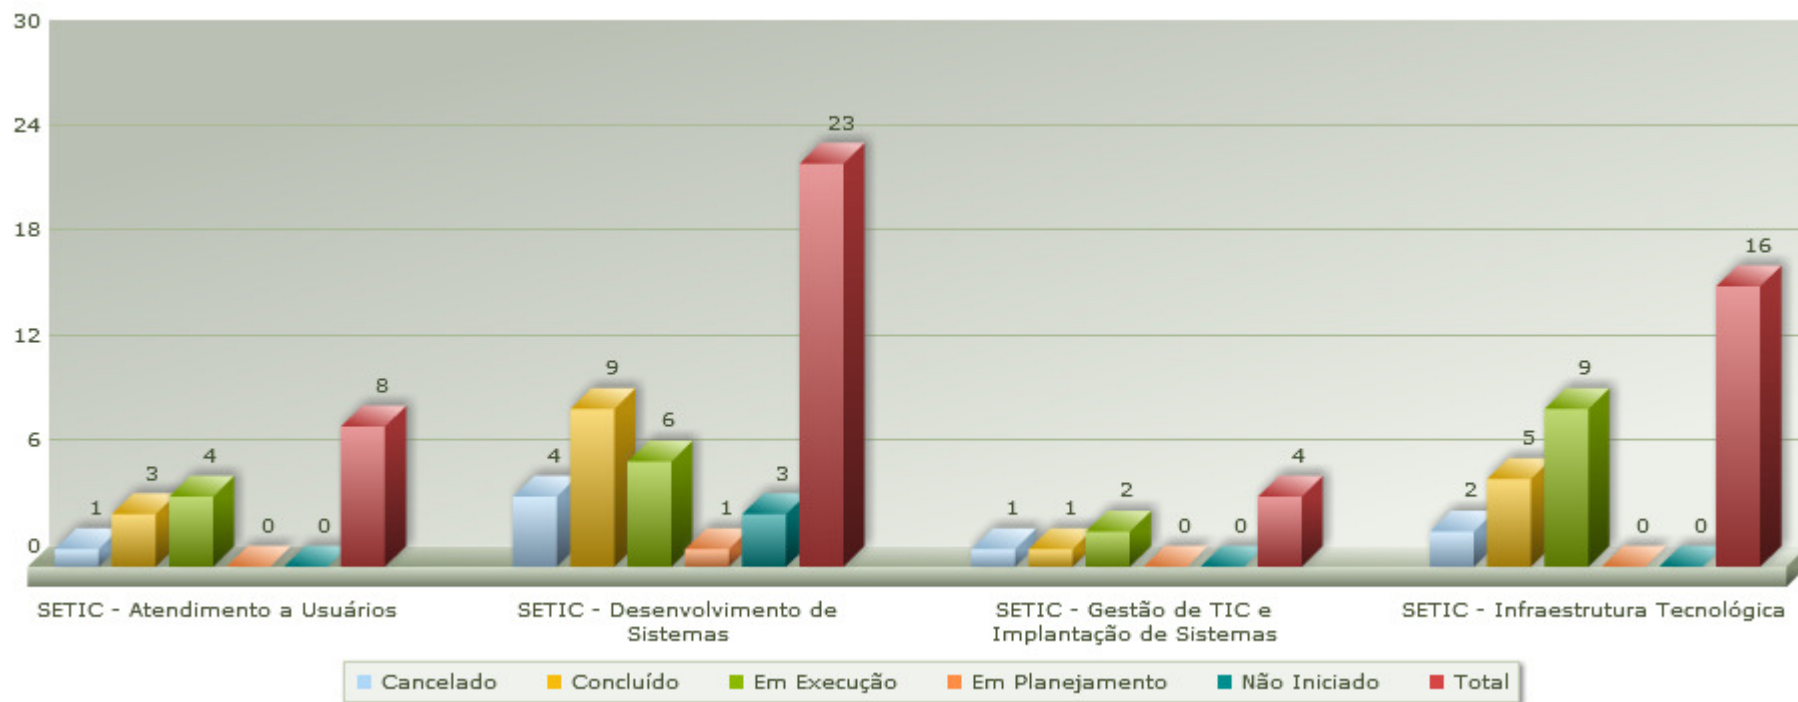


### Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p><b>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo</b> Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}</math></p>	<p><b>IEP - Indicador de Execução do Projeto</b> Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}</math></p>
<p><b>IDC - Indicador de Desempenho do Custo</b> Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}</math></p>	<p><b>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia</b> Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}</math></p>
<p><b>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento</b> Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IPR = ((\text{Duração Real do Projeto} / \text{Duração da Primeira Linha de Base}) - 1) * 100</math></p>	

## ATENDIMENTO A USUÁRIOS

### Andamento dos projetos - últimos 3 meses

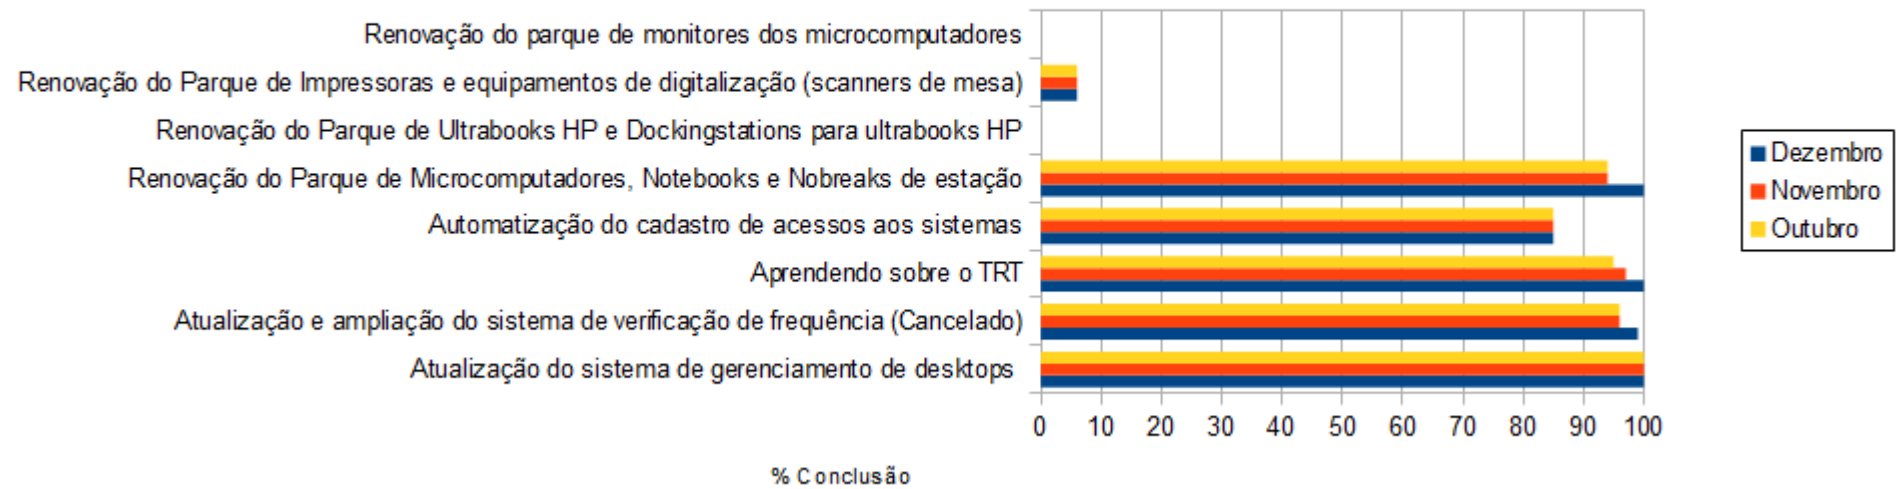


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
199	Atualização do sistema de gerenciamento de desktops	ANA LUCIA MOREIRA	Aceite do produto (Assyst) em 20/01/2016. ***PROJETO CONCLUÍDO***. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	05/02/2014	18/05/2015	11/04/2014	10/10/2016	100			1	1	0	0,83	117,98		20/01/2016
242	Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	ANA LUCIA MOREIRA	Projeto cancelado em dezembro/2017. Motivo do cancelamento: o objetivo e o escopo do projeto não foram atendidos (inexecução do contrato com o fornecedor) e a área usuária manifestou não ter interesse em buscar, por ora, uma nova solução.	Cancelado	10/04/2014	11/11/2016	10/04/2014		99,99	R\$ 222.650,00	R\$ 0,00	0	0	0		27,02		
425	Aprendendo sobre o TRT	EVERTON RAFAEL POLINA	***PROJETO CONCLUÍDO***. Entrega do produto final em 30/10/2017. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	04/05/2017	20/11/2017	15/05/2017	18/01/2018	100	R\$ 6.896,18	R\$ 6.896,18	1	1	1	1	0		30/10/2017
438	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/17: GP vai encaminhar mudança para registrar que os sistemas administrativos não estarão no escopo e registrar novas datas acordadas para o projeto. Concluído o desenvolvimento das equipes CDS1 e CDS2. Pendentes: 1) Desenvolvimento por parte da SM 2) Desenvolvimento por parte da CIT; 3) Após, a homologação será realizada, provavelmente em Fevereiro (a confirmar); 4) Desenvolvimento por parte do Pje: aguardando definição do prazo.	Em Execução	24/03/2017	28/09/2017	03/04/2017		84,88			0,33	0,84	0	0,8	46,51	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definição da listagem de métodos necessária para a integração com cada sistema (MARCO)-Em andamento; Plano de implementação dos serviços para gestão do cadastro (MARCO)-Concluída; Desenvolvimento de serviços de automatização dos registros nas bases de dados (MARCO)-Em andamento; Desenvolvimento de uma interface de usuário única para a gestão de credenciais (MARCO)-Em andamento	14/07/2017
451	Renovação do Parque de Microcomputadores, Notebooks e Nobreaks de estação	EVERTON RAFAEL POLINA	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 08/12/2017. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	18/07/2016	31/01/2018	20/07/2016	23/01/2018	100	R\$ 6.056.908,00	R\$ 6.224.943,13	1	1	1,02	1	52,83		08/12/2017
459	Renovação do Parque de Ultrabooks HP e Dockingstations para ultrabooks HP	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/17: TRT4 será participe da licitação nacional (TRT2). Everton irá validar com Müller os prazos da licitação nacional, para ajustar cronograma e enviar para aprovação. Anexar documentos no Trace. Está sendo verificado se a Infra poderá assumir formatação dos ultrabooks que estão no interior.	Em Execução	01/06/2017	26/10/2018			0	R\$ 1.362.000,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Elaborar documentação técnica dos notebooks e docking stations para licitação (MARCO)-Em planejamento; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos recebidos no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos patrimoniados (MARCO)-Em planejamento; Entrega dos equipamentos adquiridos aos usuários (MARCO)-Em planejamento; Preparação e entrega dos Ultrabooks HP 840 aos assistentes dos magistrados (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos HP Elitebook 8460 e suas respectivas docking stations indicados para desfazimento (MARCO)-Em planejamento	

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
460	Renovação do Parque de Impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/17: já instaladas 508 impressoras, faltando apenas 10, a serem instaladas ainda em Janeiro. Houve redução do nro de scanners (de 30 para 20). Fazer gestão de mudanças para constar os novos prazos, novo nro de scanners e alteração de escopo incluindo a contratação da entrega dos equipamentos.	Em Execução	01/06/2017	05/06/2018	26/06/2017		6,21	R\$ 1.283.172,11	R\$ 0,00	0,12	0,11	0	0,8	-0,85	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Designada; Documentação técnica das impressoras para licitação elaborada (MARCO)-Designada; Documentação técnica dos escâneres para licitação elaborada (MARCO)-Designada; Contratos assinados com os fornecedores de impressoras (MARCO)-Designada; Contratos assinados com os fornecedores de escâneres (MARCO)-Designada; Impressoras recebidas no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Escâneres recebidos no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Instalação das impressoras (MARCO)-Em planejamento; Instalação dos escâneres (MARCO)-Em planejamento	
476	Renovação do parque de monitores dos microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/17: pendente anexar no trace proposta de projeto, plano e ata de kick off. Sendo instalados os 2000 monitores comprados em 2017. A compra dos 2360 restantes vai ser avaliada/encaminhada.	Em Execução	03/07/2017	19/07/2018			0			0	0	0	0	0	Plano de Projeto Aprovado (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Equipamentos recebidos no TRT (MARCO)-Em planejamento; Distribuição de software (MARCO)-Em planejamento; Instalação dos equipamentos para os usuários (MARCO)-Em planejamento	

## DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

### Andamento dos projetos - últimos 3 meses

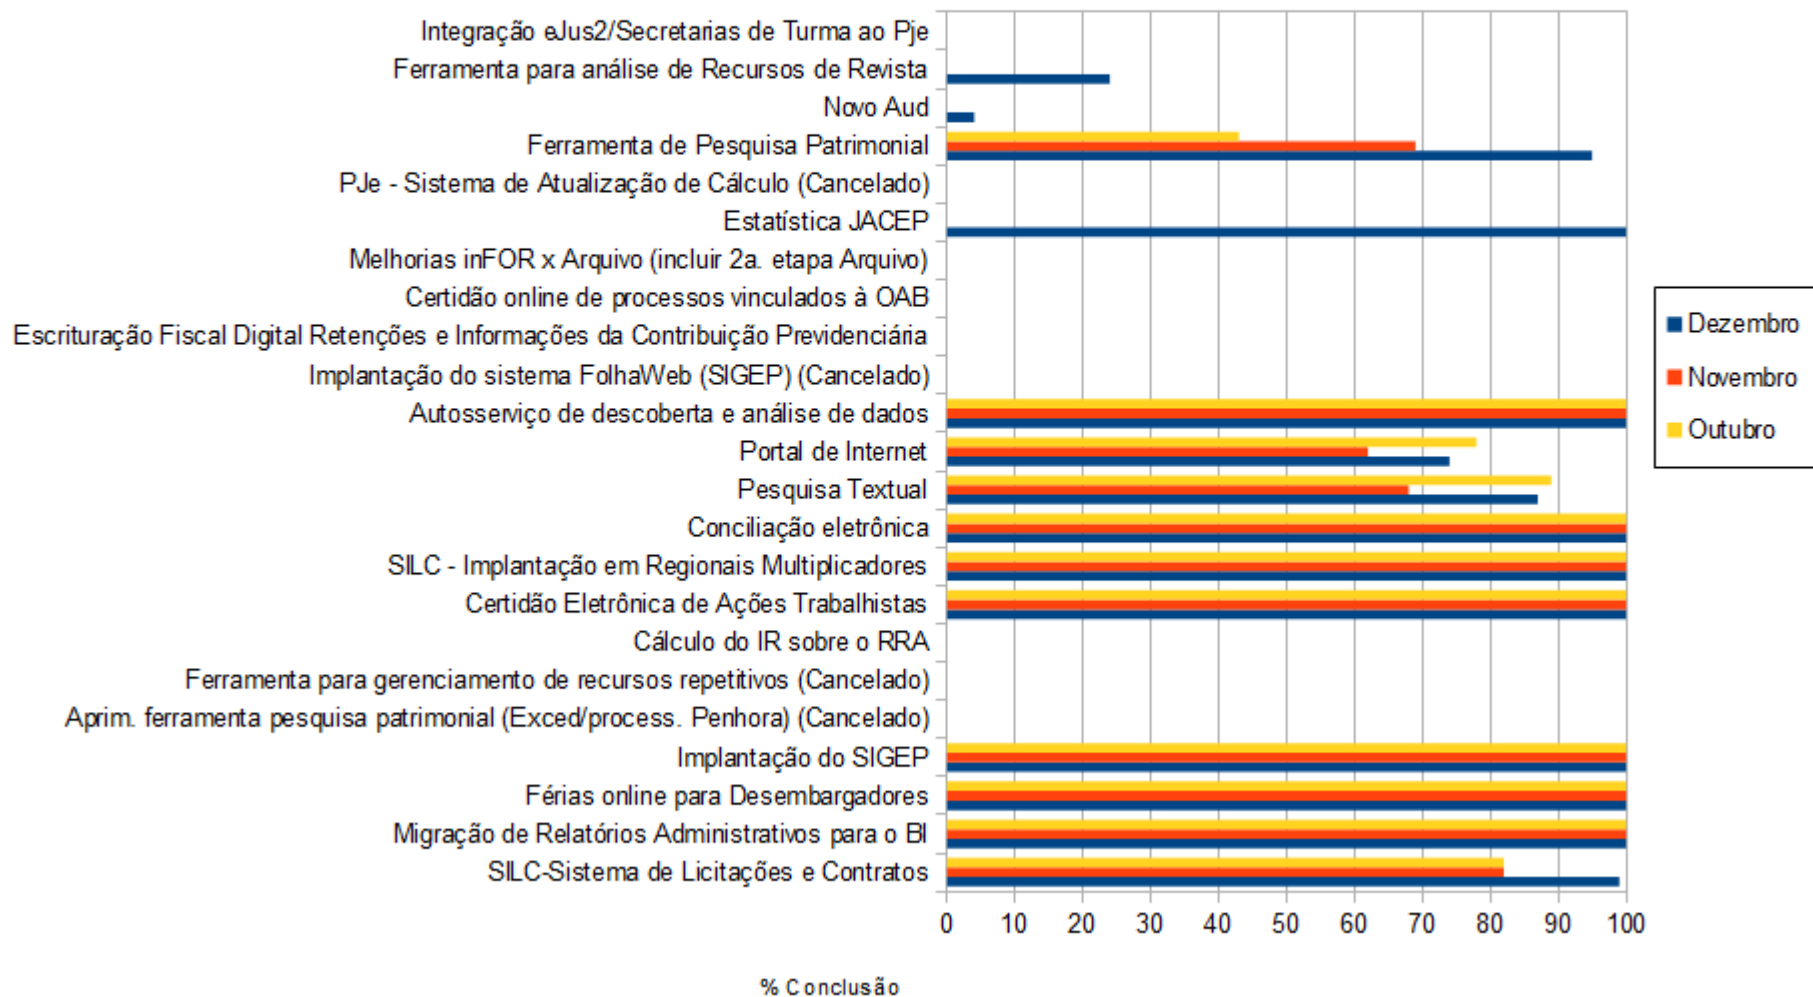


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
256	SILC - Sistema de Licitações e Contratos	MARCIO BYSTRONS KI	Posição dez/17: implantação do sistema realizada no final de semana de 02 e 03/dez. Iniciado o uso do sistema em produção a partir de 04/dez/2017. Em realização do aceite e encerramento do projeto.	Concluído	07/03/2014	01/12/2017	05/06/2014	08/02/2017	99,95	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,93	1,02	0	0,85	195,91		04/12/2017
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	TIAGO GOMES SANTOS	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 30/01/2017. Mapa benefícios anexado.	Concluído	25/02/2015	25/07/2017	25/02/2015	31/07/2017	100			1	1	0	1	61,42		30/01/2017
402	Férias online para Desembargadores	MARCIO BYSTRONS KI	Início utilização do sistema em produção dia 06/março/17. *** PROJETO CONCLUÍDO ***. Mapa de benefícios anexado no Trace.	Concluído	23/03/2015	18/11/2015	23/03/2015	23/03/2017	100			1	1	0	0,83	0		06/03/2017
404	Implantação do SIGEP	MARCIO BYSTRONS KI	*** PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 30/09/2016. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	12/01/2015	30/09/2016	12/01/2015	25/07/2017	100			1	1	0	0,7	15,61		30/09/2016
428	Aprimoramento de ferramenta de pesquisa patrimonial (Excedentes e processamento de penhora)	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Projeto cancelado em dez/2017. MOTIVO DO CANCELAMENTO: Projeto 428 cancelado e criado projeto 474 - Ferramenta de Pesquisa Patrimonial, com a definição de escopo mais aderente ao projeto que está sendo conduzido pela AGE.	Cancelado	12/04/2016	22/04/2016			0			0	0	0		0		
430	Ferramenta para gerenciamento de recursos repetitivos	TIAGO GOMES SANTOS	Projeto cancelado em dez/2017. MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tecnologia de Inteligência Artificial ainda não dominada pela SETIC. Projeto 430 cancelado e criado projeto 477 - Ferramenta para análise de Recursos de Revista, o qual irá atender a um escopo menor, de acordo com o projeto estratégico da AGE.	Cancelado	12/04/2016	22/04/2016			0			0	0	0		0		
436	Cálculo do IR sobre o RRA	MARCIO BYSTRONS KI	Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016). DG deverá fornecer maiores informações antes do início. Conforme conversa entre Farias e Éder em julho, esse projeto é menos prioritário do que o REINF (463). Não priorizado.	Não Iniciado	13/04/2016	25/04/2016			0			0	0	0		0		
446	Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	*** PROJETO CONCLUÍDO***. Produto entregue em 29/06/2017. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	03/05/2016	08/03/2017	03/05/2016	04/07/2017	100			1	1	0	1	230,5		29/06/2017
447	SILC - Implantação em Regionais Multiplicadores	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	Estudos Técnicos Preliminares aprovado pelo CSJT. A implantação nos demais regionais será projeto gerenciado pelo Conselho. *** Projeto CONCLUÍDO NO TRACE ***. Mapa de Benefícios enviado.	Concluído	12/09/2016	10/01/2017	12/09/2016	26/06/2017	100			1	1	0	1	-2,94		22/02/2017
448	Conciliação Eletrônica	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Produto final entregue em 09/05/2017. *** CONCLUÍDO NO TRACE***. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	12/12/2016	29/03/2017	12/12/2016	26/06/2017	100			1	1	0	1	23,06		09/05/2017
457	Pesquisa Textual	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição dez/2017: concluídos: pesquisa de sentenças, de acórdãos, de documentos internos e-jus2 e pesquisa de decisões e-jus2. As demais aplicações, denominadas de pesquisas complementares, a princípio serão migradas até 13/04. Talvez o prazo seja impactado devido a atraso decorrido a problemas identificados na homologação (incompatibilidade de docs RTF da novaJus4 com o indexador elastic e problemas na visualização de cash HTML). Priorizar o recurso "citação" na pesquisa de acórdãos.	Em Execução	20/03/2017	30/04/2018	20/03/2017		86,84			1	1,03	0	1	45,19	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Estudo preliminar-Concluída; Entrega - Pesquisa em Atos normativos (internet)-Concluída; Entrega 1a. etapa HOMOLOGAÇÃO INTERNA - Pesq. de ac. ampla-Designada; Pesquisas complementares-Em planejamento; Entrega 2a. etapa - Pesquisas complementares-Em planejamento; Finalização-Em planejamento	16/04/2018

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
458	Portal de Internet	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição dez/2017: em migração a página de "Orgãos Julgadores". Projeto replanejado, para entregas até 30/04. Em andamento conforme o previsto.	Em Execução	20/03/2017	08/05/2018	20/03/2017		74,23			1	0,98	0	1	140,36	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definir escopo do produto-Concluída; Programação Portal - parte 1-Concluída; Lançamento do Portal ao público externo-Concluída; Programação Portal - parte 2-Em andamento; Finalização-Em planejamento	30/04/2018
461	Autosserviço de descoberta e análise de dados	TIAGO GOMES SANTOS	*** PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 29/06/2017. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	15/12/2016	14/07/2017	15/12/2016	14/07/2017	100	R\$ 122.519,00	R\$ 122.519,00	1	1	1	0,62	3,2		29/06/2017
462	Implantação do sistema FolhaWeb (SIGEP)	MARCIO BYSTRONS KI	Motivo cancelamento: projeto sendo conduzido e gerenciado pela AGE. Internamente na SETIC, solicitações serão tratadas como demandas. Com isso, o Comitê Gestor de TIC sugeriu para a Comissão de Informática o cancelamento do projeto.	Cancelado	10/04/2017	04/05/2017			0			0	0	0		0		
463	Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF)	MARCIO BYSTRONS KI	Posição dez/2017: não será feito no projeto nacional e o projeto do TRT4 deverá iniciar imediatamente. Prazo para implementação junho/2018. GP aguardando definições do PO e do Farias, para concluir o Plano de Projeto.	Em Planejamento	10/04/2017	28/04/2017			0			0	0	0		0		
464	Certidão online de processos vinculados à OAB	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Férias validou com Adriana a possibilidade de fazer a partir da consulta de processos no site: não é viável, pois atualmente eles consultam todo o acervo de processos (físicos/eletrônicos, ativos ou não, incluindo os arquivados). Projeto não priorizado ainda. Validar com Farias se será mesmo da área SDINT.	Não Iniciado	10/04/2017	28/04/2017			0			0	0	0		0		
465	Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo)	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	Férias já avaliou a lista com as solicitações (Natacha) e o chamado no Assyst, para avaliar o que precisa ser feito. Projeto não priorizado nesse momento mas será mantido no PDTIC para execução no primeiro trimestre de 2018. Revalidar a prioridade e quando realmente precisa estar concluído.	Não Iniciado	10/04/2017	04/05/2017			0			0	0	0		0		
466	Estatística JACEP	TIAGO GOMES SANTOS	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto entregue em 27/11/2017. Novas demandas serão tratadas pontualmente. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	10/04/2017	27/11/2017	10/04/2017	29/11/2017	100			1	1	0	0,85	0		27/11/2017
467	PJe - Sistema de Atualização de Cálculo	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Projeto cancelado em dez/2017. MOTIVO DO CANCELAMENTO: Não houve autorização do CSJT para desenvolvimento do projeto (decisão reportada pela Dra Alciane).	Cancelado	10/04/2017	05/05/2017			0			0	0	0		0		
474	Ferramenta de Pesquisa Patrimonial	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Posição dez/17: liberado para uso em produção, para as unidades piloto, em 13/dez. Agendada reunião de aceite para 28/fev.	Em Execução	09/08/2017	13/12/2017	14/08/2017		94,53			1	0,94	0	1	0	DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 3 - FINALIZAR QUADRO VALORES E DEFINIR DADOS QUADRO AÇÕES-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 5 - FINALIZAR QUADRO AÇÕES E DEFINIR DADOS QUADRO BNDT E DILIGÊNCIAS-Concluída; DESENVOLVIMENTO (F) SPRINT 7 - FINALIZAR QUADRO BNDT E DILIGÊNCIAS-Concluída; IMPLANTAR-Concluída; Treinar SAU-Concluída	13/12/2017
475	Novo Aud	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Posição dez/17: em aprovação do plano de projeto. Ajustar marcos no cronograma. Entregas serão feitas a partir de 18/05/18, com a entrega final prevista para 18/03/19.	Em Execução	02/10/2017	22/03/2019	02/10/2017		4,03			0	0,4	0		0	IMPLANTAR-Em planejamento; Treinar SAU-Em planejamento	18/03/2019



Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
477	Ferramenta para análise de Recursos de Revista	TIAGO GOMES SANTOS	Posição dez/17: Anexar aprovação do plano do projeto e apresentação do kickoff. Entrega do protótipo planejada para 23/março/18.	Em Execução	01/09/2017	23/03/2018	22/09/2017		23,82			0,5	0,25	0	0,75	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Execução-Em andamento; Entrega do protótipo-Designada	23/03/2018
478	Integração eJus2/Secretarias de Turma ao PJe	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição dez/17: plano de projeto aprovado. Em andamento a melhoria no lançamento dos RESU, conforme planejamento.	Em Execução	06/11/2017	11/12/2018			0			0	0	0	0,75	0	Etapa 1 - melhoria do lançamento dos RESU-Em planejamento; Etapa 2 - integração dos processos não julgados-Em planejamento; Etapa 3 - integração da pauta-Em planejamento	07/12/2018


GESTÃO DE TIC e IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS  
Andamento dos projetos - últimos 3 meses

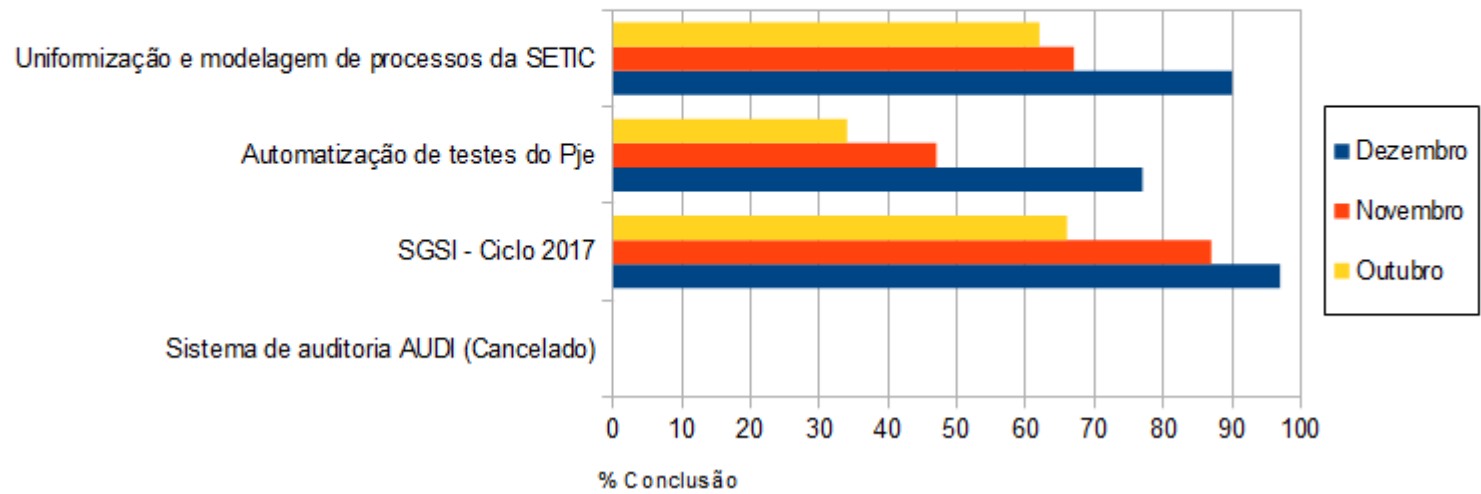

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
433	Sistema de auditoria AUDI	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	Motivo cancelamento: em 22/06/2017, projeto cancelado diante da informação recebida da SECONTI de que o CNJ irá disponibilizar o sistema AUDITAR que vai atender STJ, CSJT com a coordenação CNJ, no prazo de até 06 meses. Quando houver a demanda pela implantação do AUDITAR, a demanda será avaliada pela SETIC e será atendida por projeto ou ação, conforme a complexidade.	Cancelado	13/04/2016	01/08/2016			0			0	0	0		0		
452	SGSI - Ciclo 2017	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Posição dez/17: PTR e Plano de Continuidade de TIC concluídos. Pendente a revisão de 2 normas da Política de Segurança da Informação, até final de janeiro. Indicadores SGSI e análise crítica do SGSI realizados, pendente apenas revisão pelo Comitê Gestor de TIC e aprovação pela Presidência.	Em Execução	01/03/2017	29/01/2018	01/03/2017		96,79			0,75	0,97	0	1	-19,15	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Formalização do Escopo do SGSI-Concluída; Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos -Concluída; Análise e Avaliação de Riscos-Concluída; Declaração de Aplicabilidade-Concluída; Plano de Tratamento de Riscos-Concluída; Testes do Plano de Continuidade de TIC-Concluída; Revisão do Plano de Continuidade de TIC-Concluída; Treinamento e Conscientização em SI-Concluída; Revisão da Política de Segurança da Informação-Em andamento; Indicadores SGSI-Em andamento; Análise Crítica do SGSI-Em andamento	19/12/2017
470	Automatização de testes do PJe	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	Posição dez/17: todos testes já automatizados e treinamentos realizados. GP fará registro de mudança para prorrogar fim do projeto até a data fim do PDTI, para execução da regulamentação e de uma avaliação dos benefícios das automatizações nas tarefas de homologação de novas versões do PJe nas áreas de negócio.	Em Execução	12/06/2017	16/11/2017	16/06/2017		76,59			0,66	0,76	0	0,8	-0,93	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Treinamentos relativos à testes de softwares pelos servidores da CIS-Concluída; Automatização dos casos de testes de prioridade alta-Concluída; Atualização e regulamentação do processo de testes do PJe-Em andamento; Orientação das áreas de negócios sobre a operação das automatizações desenvolvidas-Concluída	30/11/2017
471	Uniformização e modelagem de processos da SETIC	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	***PROJETO CONCLUÍDO***. Regulamentação concluída em 11/dez/2017. Em realização da reunião de encerramento.	Concluído	22/05/2017	31/01/2018	22/05/2017		90,48			1	0,93	0	1	0		11/12/2017

## INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

### Andamento dos projetos - últimos 3 meses

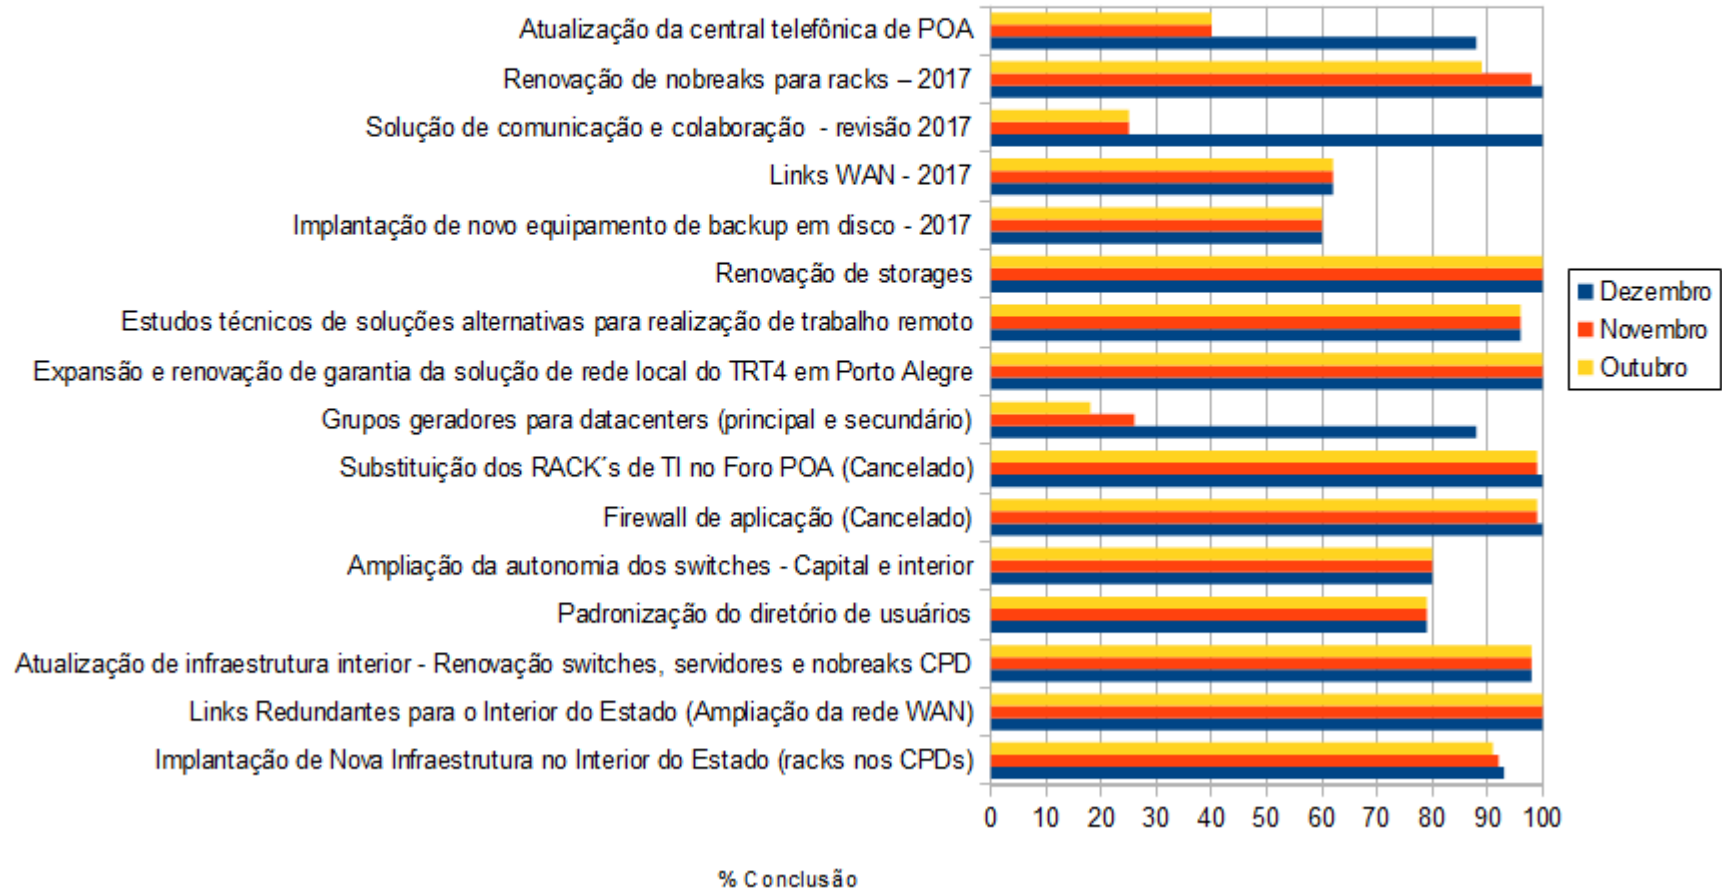

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição dez/17: Arroio Grande: nova sede prevista para 2018. Rede ficará como está. Camaquã: concluído. Cruz Alta: 2018. Ijuí: concluído. Três Passos: 2018. Canoas: dezembro/2017 (será agendado em seguida). Viamão: mudou para nova sede em dezembro/2017. Santiago: concluído. Gramado: a sala não comporta novo rack (seria necessária a realização de obra) e o CPD a princípio não apresenta problemas, não será feito. Montenegro: concluído. Lagoa Vermelha (excluída do projeto).	Em Execução	09/01/2012	04/06/2018	19/04/2012		93,39	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	1	0,98	1	1	200,99	Localidades 2012/1-Concluída; Localidades 2012/2-Concluída; Localidades 2013/1-Concluída; Localidades 2013/2-Concluída; Localidades 2014/01-Concluída; Localidades 2014/02-Concluída; Compra de 5 racks-Concluída; Localidades 2015/01-Em andamento; gerencia do projeto-Em andamento	01/06/2018
105	Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)	ADRIANO SIMIONI	PROJETO CONCLUÍDO. Anexar Mapa de Benefícios. Informações solicitadas para Adriano e Gustavo, dia 29/05 e para Paulo em 11/07. Solicitado novamente para Adriano e Paulo no dia 07/11.	Concluído	07/05/2010	14/11/2016	17/01/2014	11/05/2017	100	R\$ 1.326.840,00	R\$ 1.326.840,00	1	1	1	0,77	136,51		30/11/2016
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição dez/2017: Canoas: dezembro/2017 (será agendado em seguida). Em conversa com o Luis da Sempro este informou que eles farão a reforma em Canoas em 1 VT de cada vez, instalando rack de parede, puxando a rede eletrológica, e incluindo o switch que forneceremos. As mudanças iniciaram e já realizada nas 1, 2 e 4 VT a migração do rack.	Em Execução	07/02/2014	11/01/2018	07/02/2014		98,26	R\$ 1.479.568,40	R\$ 1.479.559,40	0,81	0,98	0,99	1	4,94	Foros atendidos até 08/2014-Concluída; Canoas-Em andamento; Caxias do Sul-Concluída; Erechim-Concluída; Esteio-Concluída; Santa Rosa-Concluída; Santa Rosa II-Concluída; São Jerônimo-Concluída; São Leopoldo I-Concluída; Sapucaia do Sul-Concluída; Gerência de Projetos-Em andamento	19/12/2017
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	Posição dez/2017: Já elaborada solução para autenticação local no caso de indisponibilidade dos dois links de acesso ao autenticador central (sem necessidade de aquisição de novos servidores). Testes em Capão da Canoa apresentaram obstáculos e estão sendo avaliados (conflito com assinador instalado nas máquinas). Aguardando decisão da Natacha sobre substituir o assinador por um autenticador (do TRT) ou aguardar finalização do autenticador (Renato-CDES).	Em Execução	28/08/2014	19/12/2017	28/08/2014		78,72			0,5	0,78	0	0,5	125,94	Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Em andamento; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência do Projeto-Em planejamento	
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição dez/17: Prédios Sede, Anexo Adm, Foro 1, Passo Fundo, Caxias do Sul, Esteio, Uruguai e São Leopoldo: concluídos. Prédio Foro 2: SEMPRO concluiu o cabeamento mas ainda é necessária organização do rack do segundo andar. SETIC migrará todos os andares, exceto o segundo (pendente). Prédio Foro 3: sem previsão, SETIC fará migração no andar térreo e aguardará SEMPRO finalizar demais andares, que requerer infraestrutura que inclui perfuração de laje. Erechim: SEMPRO informou a conclusão, SETIC validar.	Em Execução	25/08/2014	16/11/2017	10/11/2014		80,19	R\$ 77.900,00	R\$ 77.900,00	0,6	0,8	1	1	103,77	Análise de viabilidade do projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Prédios Interior (cabeamento elétrico)-Concluída; Prédios Capital-Em andamento; Gerencia de Projeto-Em andamento	31/10/2017
211	Firewall de aplicação	ADRIANO SIMIONI	Motivo do cancelamento: A ferramenta adquirida não passou nos testes com o PJE. Somente com a reestruturação da arquitetura do PJE (em andamento, mas sem previsão de entrega) será viável utilizar ferramenta de firewall. É possível que as questões de segurança envolvidas sejam atendidas por licitação que será realizada pelo TRT12 e a adesão, se for o caso, será feita oportunamente.	Cancelado	09/02/2015	21/10/2016	04/03/2015	15/09/2016	100	R\$ 248.437,00	R\$ 248.437,00	0	0	0		48,71		
389	Substituição dos RACKs de TI no Foro POA	ADRIANO SIMIONI	Motivo do cancelamento (ago/2017): SETIC tem a necessidade porém depende de obra e organização da SEMPRO. Comissão de informática encaminhará demandas para a DG.	Cancelado	24/04/2015	15/02/2016	24/04/2015	30/06/2015	100	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	0	0	0		0		
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/17: geradores instalados e funcionando, em 22/dez/2017. Aguardando ajustes por parte do fornecedor, para conclusão do projeto.	Em Execução	01/06/2015	19/12/2017	01/06/2015		88,16	R\$ 797.085,61	R\$ 0,00	0,5	0,88	0	1	240,34	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Contratação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	24/11/2017
392	Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4 em Porto Alegre	ADRIANO SIMIONI	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto entregue em 16/06/2017. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	02/03/2015	28/02/2017	02/03/2015	31/08/2017	100	R\$ 1.330.448,13	R\$ 1.324.798,93	1	1	0,99	1	197,43		16/06/2017

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/17: ambiente do VDI e GV3 estão instáveis e sendo ajustados. Testes com os Desembargadores ainda não realizados. Testes estavam previstos até final de nov/17.	Em Execução	02/03/2015	12/12/2016	14/08/2015		96,27	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,5	0,96	0	0,8	72,35	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento	06/11/2017
442	Renovação de solução de storage	ADRIANO SIMIONI	PROJETO CONCLUÍDO. Mapa de Benefícios anexado.	Concluído	14/04/2016	17/03/2017	25/04/2016	15/05/2017	100	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.400.000,00	1	1	1,08	1	-16,78		17/03/2017
453	Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/17: Pregão realizado em 11/12. GP fazer novo registro de mudança, de acordo com os prazos contratuais. Total de 2 VTLs e 1 Tape Library.	Em Execução	13/03/2017	09/01/2018	19/05/2017		60,7	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0,28	0,6	0	0,75	1,06	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	19/12/2017
454	Links WAN - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/17: prorrogado o prazo do contrato atual da Oi, até a migração (prorrogado até 26/fev/2018 e será renovado por mais 120 dias, que correspondente a previsão do novo link). Necessário entrar em contato com a SEMPRO (provável necessidades de adequações por troca da Oi pra Claro). Será necessário registro de mudança.	Em Execução	10/01/2017	30/11/2017	09/03/2017		62,08	R\$ 2.033.643,48	R\$ 0,00	0,28	0,62	0	0,8	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	30/11/2017
455	Solução de comunicação e colaboração - revisão 2017	ADRIANO SIMIONI	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 08/11. Novo contrato com a Google entra em vigor a partir de 09/nov/2017. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	13/03/2017	16/11/2017	06/06/2017	10/01/2018	100	R\$ 414.612,00	R\$ 478.440,00	1	1	1,15	0,83	0		08/11/2017
456	Renovação de nobreaks para racks - 2017	ADRIANO SIMIONI	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 20/10/2017. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	07/07/2016	07/11/2017	30/09/2016	14/12/2017	100	R\$ 144.000,00	R\$ 144.000,00	1	1	1	1	26,42		20/10/2017
473	Atualização da central telefônica de POA	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/17: não será adquirida nova central e sim, substituí-das partes da central atual. Atualização realizada dia 22/dez/2017. Pendente: configuração no software de bilhetagens e; solicitação de licenças adicionais, ambos previstos para Janeiro/2018.	Em Execução	01/06/2017	11/01/2018	29/06/2017		88,34	R\$ 500.000,00	R\$ 0,00	0,78	0,88	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Documentação técnica para licitação elaborada-Concluída; Contrato assinado com o fornecedor-Concluída; Monitoramento da entrega-Concluída; Central telefônica instalada-Concluída; Carga inicial da blacklist realizada-Concluída; Todos os terminais digitais substituídos por terminais IP-Concluída; Unidade de resposta audível implantada com 3 destinos configurados-Concluída; Homologação-Concluída; Treinamento da equipe de TIC-Concluída; Treinamento da equipe de operação de telefonia-Concluída; Destinação das partes originais não reaproveitadas-Em planejamento; Integração das centrais telefônicas do interior com o sistema de tarifação-Em andamento	19/12/2017
