


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PROJETOS DA SETIC PDTI 2018-2019

Data: Junho/2018 v1.0

1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria

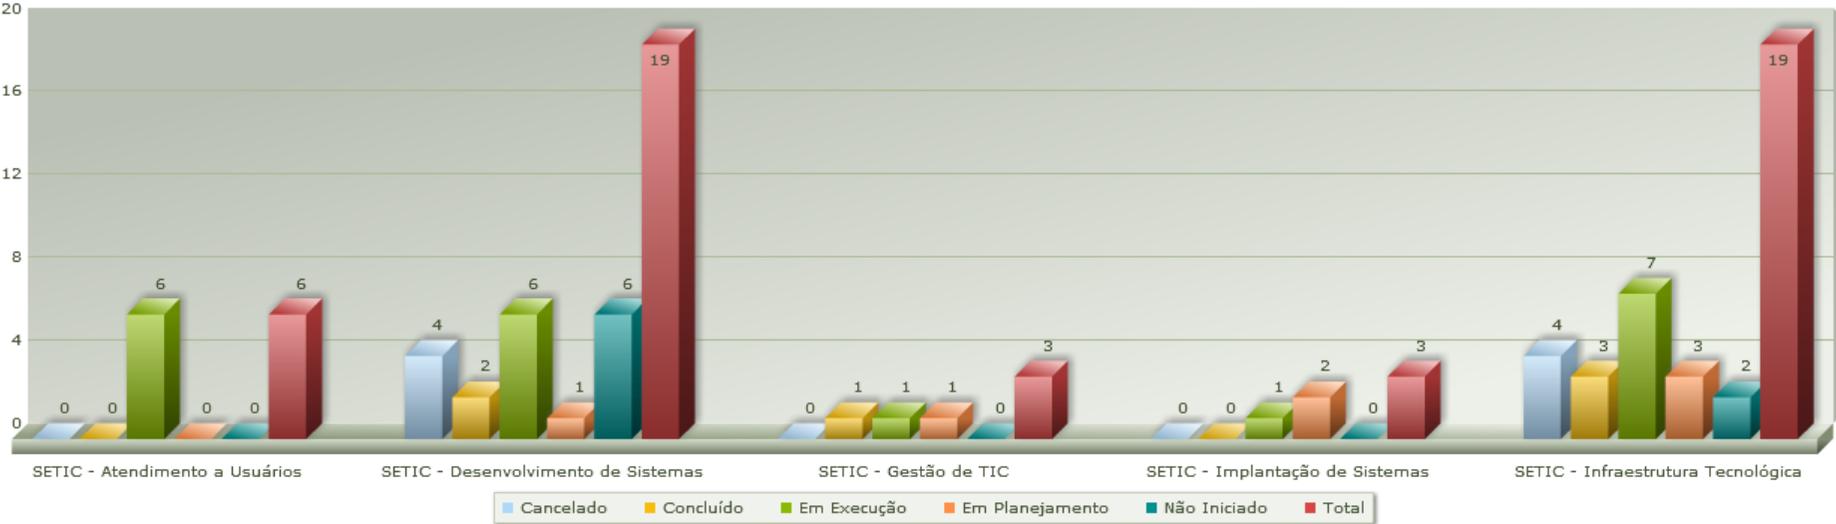


Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo</p> <p>Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}$</p>	<p>IEP - Indicador de Execução do Projeto</p> <p>Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}$</p>
<p>IDC - Indicador de Desempenho do Custo</p> <p>Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}$</p>	<p>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia</p> <p>Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p>Fórmula $IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}$</p>
<p>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento</p> <p>Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p>Fórmula $IPR = \left(\frac{\text{Duração Real do Projeto}}{\text{Duração da Primeira Linha de Base}} - 1 \right) * 100$</p>	


ATENDIMENTO A USUÁRIOS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

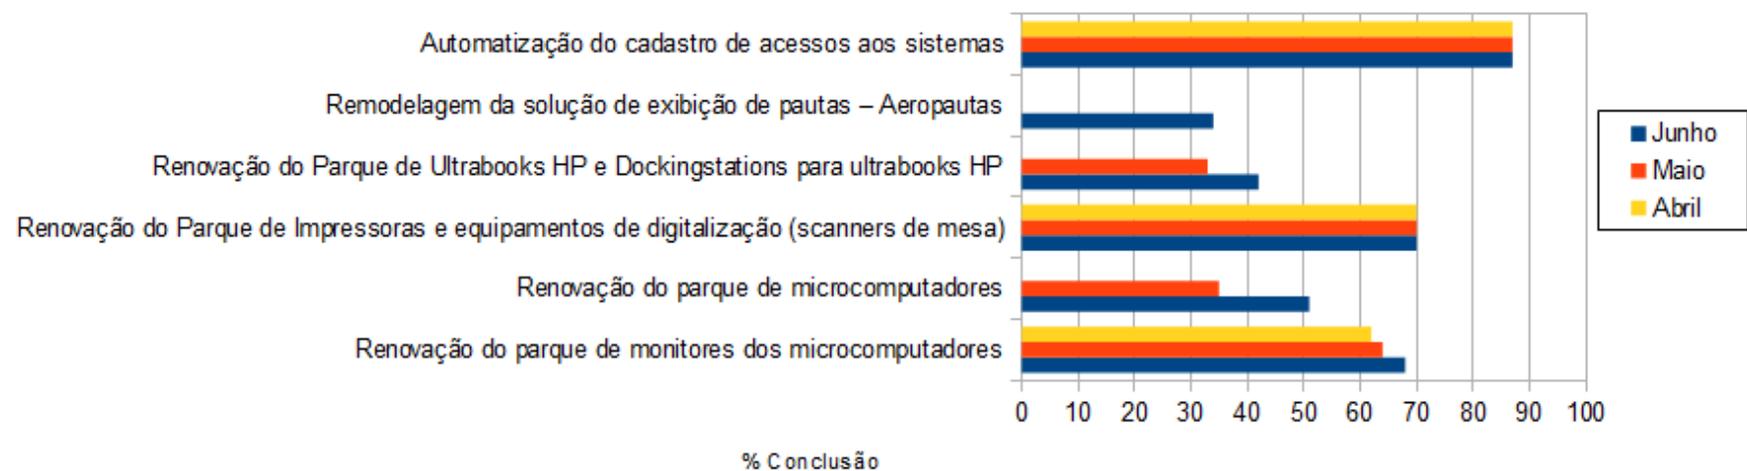


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização
476	Renovação do parque de monitores dos microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição jun/18: instalados os 2000 monitores comprados em 2017. Feita a aquisição da segunda parte da compra, de 1984 monitores (previsão de chegada: julho e agosto). A intenção é instalar essa segunda remessa com os microcomputadores (projeto 479).	Em Execução	03/07/2017	07/11/2018	03/07/2017		67,95			1	0,89	0	1	30,32	Plano de Projeto Aprovado (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Concluída; Equipamentos recebidos no TRT (MARCO)-Em andamento; Distribuição de software (MARCO)-Concluída; Instalação dos equipamentos para os usuários (MARCO)-Em andamento	19/10/2018	4750
479	Renovação do parque de microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição jun/18: A intenção é realizar a compra no 1o semestre (assinatura do contrato está na Presidência) e a instalação no 2o semestre/2018.	Em Execução	16/03/2018	16/01/2019	10/04/2018		51,5	R\$ 5.679.100,00	R\$ 0,00	1	1,1	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Em andamento; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Em andamento; Computadores recebidos no TRT4 (MARCO)-Designada; Instalação dos computadores desktop (MARCO)-Em andamento	07/12/2018	4750
460	Renovação do parque de impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição jun/18: já instaladas as 518 impressoras. Realizada a compra dos 20 scanners aprovados (previsão aproximada de recebimento dia 22/julho). GP fazer gestão de mudanças para constar os novos prazos e novo nro de scanners (passou de 30 para 20).	Em Execução	01/06/2017	05/06/2018	26/06/2017		69,48	R\$ 1.283.172,11	R\$ 0,00	0,54	0,69	0	0,8	-0,85	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Em andamento; Documentação técnica das impressoras para licitação elaborada (MARCO)-Concluída; Documentação técnica dos escâneres para licitação elaborada (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de impressoras (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de escâneres (MARCO)-Designada; Impressoras recebidas no TRT4 (MARCO)-Concluída; Escâneres recebidos no TRT4 (MARCO)-Designada; Instalação das impressoras (MARCO)-Concluída; Instalação dos escâneres (MARCO)-Designada	14/05/2018	4500
459	Renovação do Parque de Ultrabooks	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição jun/18: TRT4 será participe da licitação nacional (TRT2). Realizada a compra de 333 + 8 notebooks (a serem recebidos até 20/junho).	Em Execução	01/06/2017	14/01/2019	26/06/2017		41,67	R\$ 1.577.125,00	R\$ 0,00	0,6	0,91	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Em andamento; Elaborar documentação técnica dos notebooks e docking stations para licitação (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Concluída; Equipamentos recebidos no TRT4 (MARCO)-Designada; Equipamentos patrimoniados (MARCO)-Designada; Entrega dos equipamentos adquiridos aos usuários (MARCO)-Em andamento; Preparação e entrega dos Ultrabooks HP 840 aos assistentes dos magistrados (MARCO)-Em andamento; Preparação e entrega do Notebooks HP Elitebook 8460 para as unidades judiciárias (MARCO)-Designada		4250

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização
480	Remodelagem da solução de exibição de pautas - Aeropautas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição jun/18: Escopo inicial contempla o estudo da solução. Conforme o resultado, o projeto poderá ser replanejado para conter a execução da remodelagem (poderá definir compras para 2019). Em realização dos estudos, conforme plano de projeto aprovado.	Em Execução	15/05/2018	04/09/2018	28/05/2018		33,75			1	0,91	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Estudo de mercado e soluções para o Aeropauta (MARCO)-Em andamento; Relatório com as descrições das soluções identificadas (MARCO)-Designada; Parecer do comitê de governança de TIC (MARCO)-Designada	13/08/2018	3500
438	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição jun/18: Sistemas administrativos não fazem mais parte do escopo. Concluído o desenvolvimento das equipes CDS1 e CDS2. Pendentes: desenvolvimento da CIT e do PJe. Homologação feita pela SM, com as integrações liberadas. No aguardo da previsão da entrega da CIT (API de sincronização do AD com o RH) para reavaliação do projeto. A princípio somente o InFOR e NovaJus4 estarão automatizados. Cronograma alterado, mas GP ainda não fez mudança.	Em Execução	24/03/2017	20/04/2018	03/04/2017		86,68			0,33	0,86	0	0,8	194,18	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definição da listagem de métodos necessária para a integração com cada sistema (MARCO)-Em andamento; Plano de implementação dos serviços para gestão do cadastro (MARCO)-Concluída; Desenvolvimento de serviços de automatização dos registros nas bases de dados (MARCO)-Em andamento; Desenvolvimento de uma interface de usuário única para a gestão de credenciais (MARCO)-Em andamento	03/04/2018	2250

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

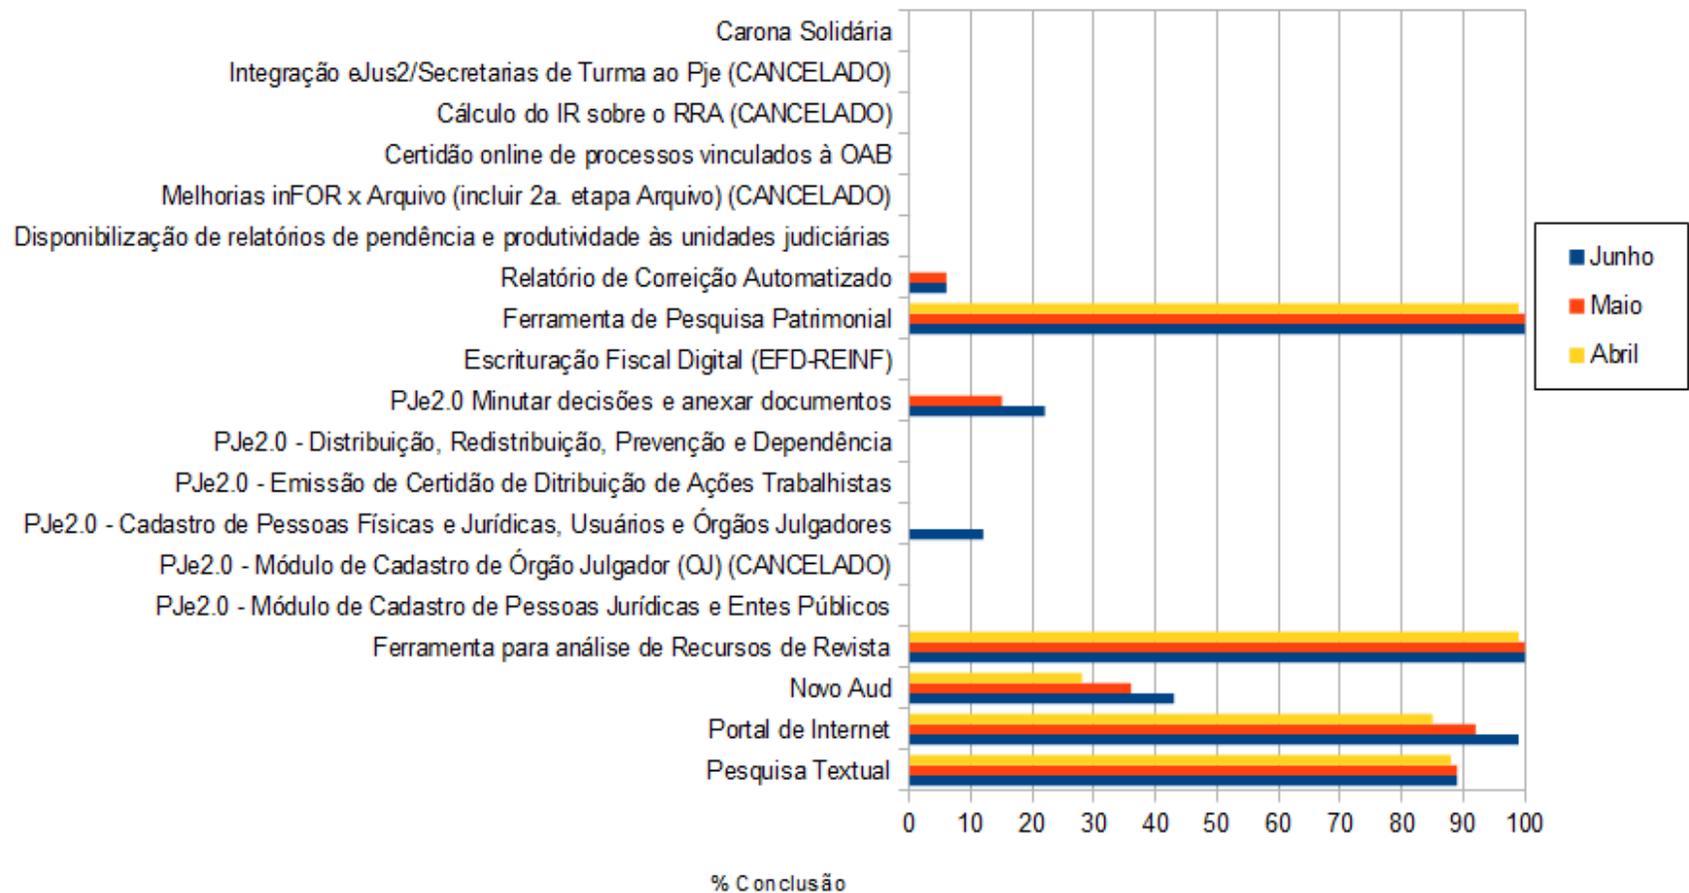


GESTÃO DE TIC Andamento dos projetos - últimos 3 meses

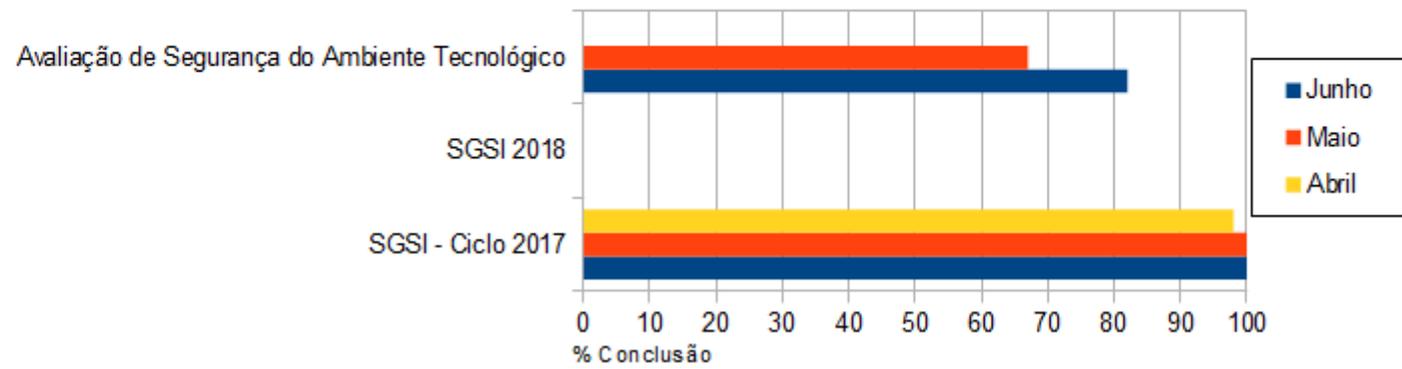

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização
452	SGSI - Ciclo 2017	LUCAS POZATTI	PROJETO CONCLUÍDO. Produto final entregue em 23/04/2018. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	01/03/2017	16/05/2018	01/03/2017	10/05/2018	100			1	1	0	1	7,66		23/04/2018	3250
503	SGSI 2018	LUCAS POZATTI	Posição jun/18: kick-off marcado para 20/junho.	Em Planejamento	18/06/2018	18/03/2019			0										2875
490	Avaliação de Segurança do Ambiente Tecnológico	LUCAS POZATTI	Posição jun/18: as soluções estudadas foram apresentadas. Definido que será feito registro de preço pelo prazo de 1 ano, contemplando até 4 PenTests (será realizado no mínimo 1). Projeto será replanejado para contemplar o primeiro PenTest (planejamento, execução e apresentação do resultado). Não fará parte do escopo correções necessárias que venham a ser indicadas. Os demais PenTests serão definidos conforme a necessidade.	Em Execução	19/01/2018	20/06/2018	19/01/2018		81,82			1	0,82	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Estudo das soluções disponíveis no mercado-Concluída; Decisão de adoção de solução-Concluída	28/05/2018	2625

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS


Andamento dos projetos - últimos 3 meses

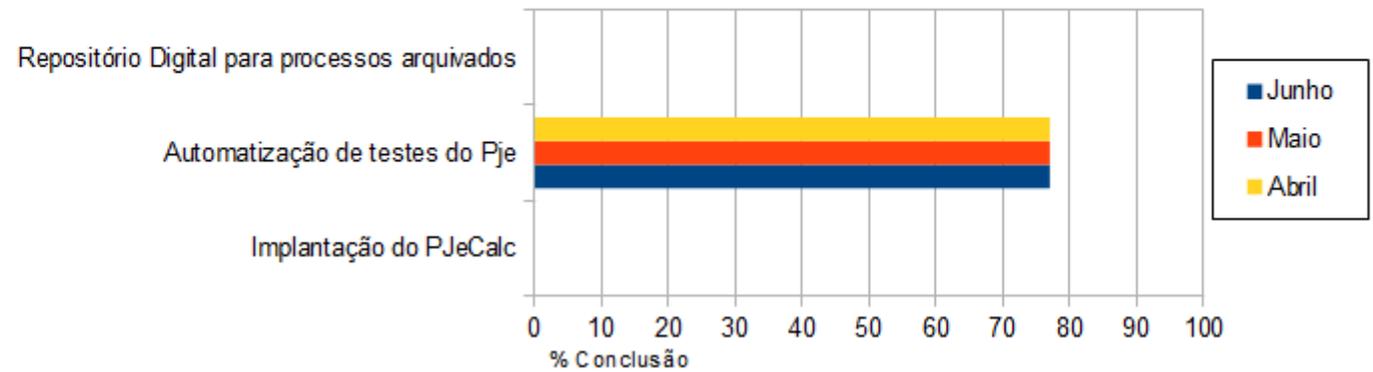

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização
491	Implantação do PJeCalc	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	Posição jun/18: sistema instalado em produção (equipe trabalhando para promover a sua utilização). Definido Dr Evandro Urnau como representante de negócio. E.J se preparando para oferecer cursos sobre esse módulo. Necessário realizar Kickoff.	Em Planejamento	19/03/2018	03/07/2018			0										4750
470	Automatização de testes do PJe	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	Posição jun/18: testes inicialmente automatizados com a versão atual do PJe (1x) e na tecnologia Selenium (não implantado em produção). Alguns testes refeitos na versão nova do PJe (2.0) e com nova tecnologia de automatização (RedWood). CSJT iniciando projeto de teste similar, o qual faremos parte. GP vai elaborar documento com o resultado do trabalho feito até o momento. Após definido projeto nacional, sugerido pelo GP que seja acompanhado como ação estratégica. Sugerido o cancelamento desse projeto (VALIDAR COM O COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC).	Em Execução	12/06/2017	16/11/2017	16/06/2017		76,59			0,66	0,76	0	0,8	-0,93	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Treinamentos relativos à testes de softwares pelos servidores da CIS-Concluída; Automatização dos casos de testes de prioridade alta-Concluída; Atualização e regulamentação do processo de testes do PJe-Em andamento; Orientação das áreas de negócios sobre a operação das automatizações desenvolvidas-Concluída	30/11/2017	3625
484	Repositório Digital para processos arquivados	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	Posição jun/18: troca de GP de Lucia para Pablo. Treinamento da ferramenta ATOM será realizado em agosto. GP elaborar plano e fazer kick-off.	Em Planejamento	16/03/2018	17/04/2018			0										3250

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Andamento dos projetos - últimos 3 meses

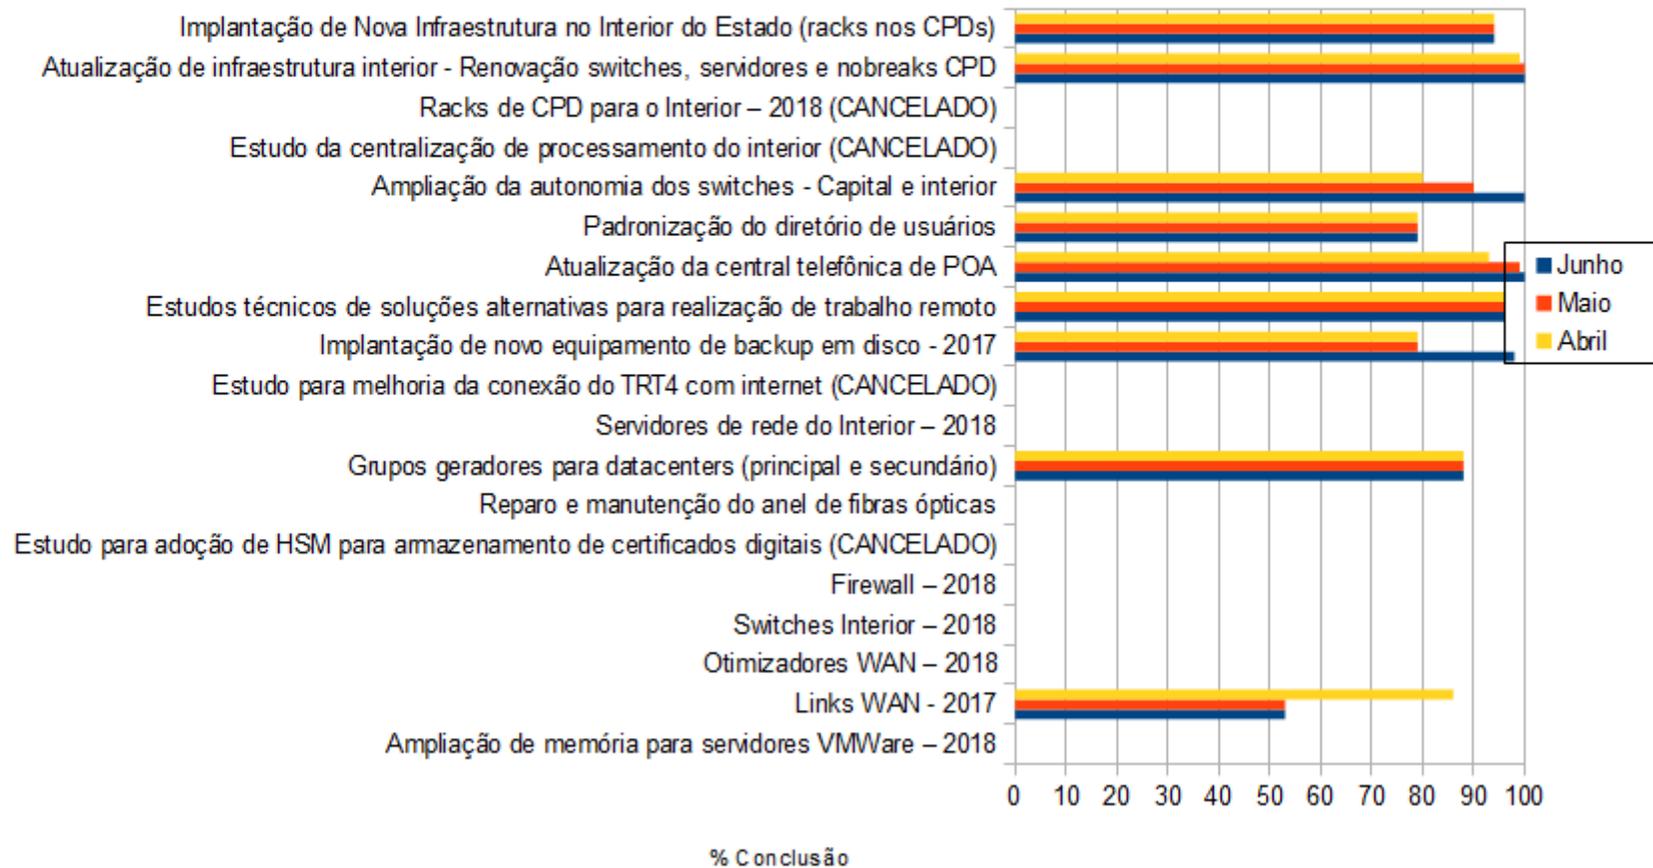

ID	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização	
492	Ampliação de memória para servidores VMWare - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição jun/18: kick-off agendado para dia 26/jun.	Em Planejamento	19/03/2018	03/07/2018			0											5000
454	Links WAN - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição jun/18: Instalações já iniciadas. Instalado 47% do interior, fora os nós centrais. Fornecedor (Claro) tem 90 dias para concluir, até 23/07. Caso atrase, GP validar com a CGTIC nova renovação do link da Oi (vigente até 27/07), até que o novo link esteja instalado. Data contida no último plano diferente do cronograma do trace (verificar necessidade de mudança).	Em Execução	10/01/2017	15/08/2018	09/03/2017		52,66	R\$ 2.033.643,48	R\$ 0,00	1	0,68	0	0,8	75	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Concluída; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em andamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	14/09/2018	4750	
493	Otimizadores WAN - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição jun/18: Projeto com alto risco. Kickoff realizado dia 04/maio. GP revendo alternativas para que o plano de projeto consiga atender às restrições: inicialmente seria dia 17/maio para infra encaminhar para CGTIC e 31/maio CGTIC para a CLC (novas datas são: 20 e 22/junho); Garantia vence em 28/11; e Projeto precisa ser pago com orçamento de 2018. Alternativas: SETIC vai instalar parte da solução e reduzir prazo de entrega do fornecedor (de 90 para 75 dias).	Em Execução	19/03/2018	18/12/2018	26/04/2018		0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Em andamento; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Em planejamento; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento		4750	
494	Switches Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição jun/18: em planejamento. Aquisição sendo feita pelo TRT8. Edital ainda não publicado (problemas no Pregão).	Em Planejamento	19/03/2018	03/07/2018			0											4750
495	Firewall - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição jun/18: em planejamento. Aquisição sendo feita pelo TRT12. Edital em homologação (terceiro fornecedor). Se não for homologado, a compra será encaminhada por aqui.	Em Planejamento	19/03/2018	03/07/2018			0											4750
496	Estudo para adoção de HSM para armazenamento de certificados digitais	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0											4375
497	Reparo e manutenção do anel de fibras ópticas	ADRIANO SIMIONI	Posição jun/18: PA encaminhado para a DG/Presidência, com informações sobre o que foi danificado. Paulo solicitou que fosse transformado em Ação Estratégica, caso seja dado seguimento. Validar com o Comitê de Governança de TIC.	Não Iniciado	19/03/2018	03/07/2018			0											4375
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição jun/18: geradores instalados e funcionando, em 22/dez/2017. Fornecedor realizou ajustes que faltavam, mas ainda pendente documentação técnica e instalação do conversor RS485. Gerador antigo permanece fornecendo carga para os sistemas de telefonia e de segurança (verificar como ficará essa questão, antes da conclusão do projeto).	Em Execução	01/06/2015	19/12/2017	01/06/2015		88,16	R\$ 797.085,61	R\$ 0,00	0,5	0,88	0	1	240,34	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Contratação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	24/11/2017	4000	
498	Servidores de rede do Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	Obs.: parte da garantia dos servidores vence em maio, outra, em novembro/2019.	Não Iniciado	19/03/2018	03/07/2018			0											3875
499	Estudo para melhoria da conexão do TRT4 com internet	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0											3750
453	Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição jun/18: Total de 2 VTLs e 1 Tape Library. Tape Library recebida e em produção, mas falta a fonte de energia elétrica redundante. Validar esse item para o aceite.	Em Execução	13/03/2017	30/04/2018	19/05/2017		98,21	R\$ 1.071.124,10	R\$ 0,00	0,85	0,98	0	1	40,1	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em andamento; Contratação-Concluída; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Concluída; Homologação-Concluída; Transição para a Produção-Concluída	30/04/2018	3500	

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Priorização
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição jun/18: criado novo ambiente (GV4). Necessário estabelecer grupo de testadores. GP replanejar projeto.	Em Execução	02/03/2015	12/12/2016	14/08/2015		96,27	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,5	0,96	0	0,8	72,35	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento	06/11/2017	3375
473	Atualização da central telefônica de POA	ADRIANO SIMIONI	***PROJETO CONCLUÍDO***. Atualização da central realizada dia 22/12/2017. Produto final entregue dia 04/04/2018. Medir Benefícios dia 30/agosto (Marlene e Madison).	Concluído	01/06/2017	11/01/2018	29/06/2017	08/06/2018	100	R\$ 500.000,00	R\$ 593.000,00	1	1	1,18	1	0		04/04/2018	3125
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	Posição jun/18: solução da autenticação local já validada e em uso na 3a. vara de São Leopoldo (aprovado pelo juiz Rodrigo Almeida e pelos secretários de audiência). Em implantação na 1a. vara de São Leopoldo. Após, cronograma poderá ser confirmado e mudança será realizada (esboço de cronograma de migração para o AD em todas as localidades já elaborado).	Em Execução	28/08/2014	19/12/2017	28/08/2014		78,72			0,5	0,78	0	0,5	125,94	Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Em andamento; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência do Projeto-Em planejamento		2750
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue 30/04/2018. Medir benefícios (definir SLA para autonomia computadores).	Concluído	25/08/2014	16/11/2017	10/11/2014	15/06/2018	100	R\$ 77.900,00	R\$ 77.900,00	1	1	1	1	103,77		30/04/2018	2750
500	Estudo da centralização de processamento do interior	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas se tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0										2750
501	Racks de CPD para o Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Transformar em Ação Estratégica. Contemplará apenas a aquisição de dois equipamentos, solicitados pela SETIC. SEMPRO não formalizou a demanda dos outros três racks solicitados, entendendo que podem ser adquiridos posteriormente. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0										2625
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	Projeto concluído. Produto final entregue em 19/jan/18. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	07/02/2014	11/01/2018	07/02/2014	21/05/2018	100	R\$ 1.479.559,40	R\$ 1.479.559,40	1	1	1	1	4,94		19/01/2018	2000
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição jun/18: Arroio Grande, nova sede prevista para final de 2018. Paulo Mendes vai realizar vistoria em Gramado (deve fazer parte desse projeto). GP fazer mudança e formalizar a retirada de Lagoa Vermelha do escopo do projeto.	Em Execução	09/01/2012	04/06/2018	19/04/2012		93,89	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	0,77	0,93	1	1	200,99	Localidades 2012/1-Concluída; Localidades 2012/2-Concluída; Localidades 2013/1-Concluída; Localidades 2013/2-Concluída; Localidades 2014/01-Concluída; Localidades 2014/02-Concluída; Compra de 5 racks-Concluída; Localidades 2015/01-Em andamento; gerencia do projeto-Em andamento	01/06/2018	1375

AÇÕES ESTRATÉGICAS APROVADAS PDTI 2018

Título	Solicitante	Unidade Organizacional	OBJETIVO / Solicitação	Observação	STATUS JUNHO/2018	ESTIMATIVA DE TÉRMINO
ATENDIMENTO A USUÁRIOS						
Boletins informativos da SETIC	DIEGO FRAGA CONTESSA	Seção de Atendimento a Usuários	Preparar e divulgar "boletins" informativos, com pontos de fácil solução, a serem divulgados para todo o TRT, a fim de orientar os usuários sobre procedimentos simples - uso do Google Drive, troca de toner em impressoras, desbloqueio de tokens, etc. A divulgação poderia ser via VOX ("Fica Dica TI") ou outro meio, a definir.	Periodicidade de divulgação dos boletins será mensal.	Concluído protótipo do primeiro boletim informativo.	Primeira publicação em Junho
SETIC de portas abertas	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS (COORDENADOR-CJ2)	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Estabelecer uma agenda de visitas guiadas à SETIC. Os servidores e magistrados de POA poderão se inscrever para participar das visitas. Nas visitas um servidor da SETIC ficará responsável por receber e guiar os visitantes pelas diversas áreas da SETIC, os responsáveis (ou pessoas indicadas) pelas áreas receptoras os visitantes nas suas áreas e falarão sobre as suas atribuições e projetos.	As visitas devem ser oferecidas para magistrados e servidores de Porto Alegre para não gerar custo com deslocamentos e diárias.	Não iniciado.	
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS						
SADM (Seção de Sistemas Administrativos)						
Implantação do sistema PROAD	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA (DIRETOR DE SECRETARIA - CJ3)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Implantar o sistema PROAD para realizar o controle de processos administrativos, em substituição ao sistema ADMEletrônico.	Considerando não haver migração de dados do sistema legado (ADME).	Iniciado em dez/2017 e implantado na Ouvidoria. A implantar na corregedoria e na área administrativa (aguardando liberação da DG). EAD disponibilizado pela EJ. Treinamento dos usuários está sendo feito pela CIS.	Depende de definição pela DG
Integração dos sistemas e/ou serviços com o SIGEP	RUBILAR DA SILVA JARDIM	Seção de Sistemas Administrativos	Adaptar todos os sistemas/serviços/relatórios que utilizam informações dos sistema de RH e Folha de Pagamento atuais para que passem a buscar essas mesmas informações no sistema SIGEP.	A estimativa inicial foi realizada antes do mapeamento de todas integrações envolvidas. Essa integração é uma tarefa do projeto estratégico (SIGEP), coordenado pela DG/AGE.	Iniciado o levantamento em fevereiro/2018 e as adaptações em abril/2018. Envolve todas as áreas do desenvolvimento, SM e sistemas de terceiros utilizados no TRT.	Até que o sistema de RH seja desligado. Data provável março/19 (ver projeto estratégico do SIGEP)
Remoção eletrônica - simultânea e sucessiva - de Juizes Titulares	CARINE MOEHLECKE KOHMANN	Seção de Atendimento ao Magistrado	Instalar sistema eletrônico para agilizar o procedimento de remoção simultânea e sucessiva de Juizes Titulares entre as Varas do Trabalho da 4ª Região, observado o critério da antiguidade na classe.	Considerando projeto SIGEP, gerenciado pela DG, comunicar a necessidade e o impacto na reunião do projeto.	Aguardando sistema de autoatendimento da 15ª região. Módulo será incorporado no SIGEP (projeto estratégico).	
SJUD (Seção de Sistemas Judiciais)						
Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo)	Carlos da Silveira (Assistente chefe do arquivo)			Ação Estratégica criada a partir do projeto 465 (o qual foi cancelado)	Reunião com solicitante dia 11/junho, para organização das definições. Serão validadas e iniciadas conforme a possibilidade da equipe, frente às demais atividades.	
INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA						
Remodelagem da solução de Quiosque Digital	ANA LUCIA MOREIRA	Seção de Microinformática	Atualizar o modelo de imagem utilizada na preparação dos computadores de quiosque, que atualmente requer um modelo específico de máquina (positivo D570, computador antigo e fora da garantia), e que apresenta muitos passos manuais após a baixa de imagem propriamente dita, tornando o processo muito demorado.		Registrado no backlog da SST.	Sem previsão
Estudo da centralização de processamento do interior			Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 500 (o qual foi cancelado)	Não iniciado.	
Estudo para adoção de HSM para armazenamento de certificados digitais			Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 496 (o qual foi cancelado)	Está na fase inicial dos estudos (Paulo Mendes).	
Estudo para melhoria da conexão do TRT4 com internet			Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 499 (o qual foi cancelado)	Gustavo iniciará estudos após as atividades do projeto 493 - Otimizadores WAN 2018.	
Racks de CPD para o Interior - 2018			Contemplará apenas a aquisição de dois equipamentos, solicitados pela SETIC. SEMPRO não formalizou a demanda dos outros três racks solicitados, entendendo que podem ser adquiridos posteriormente.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 501 (o qual foi cancelado)	Não iniciado.	
