


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PROJETOS DA SETIC PDTI 2018-2019

Data: Julho/2018 v1.0

1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria

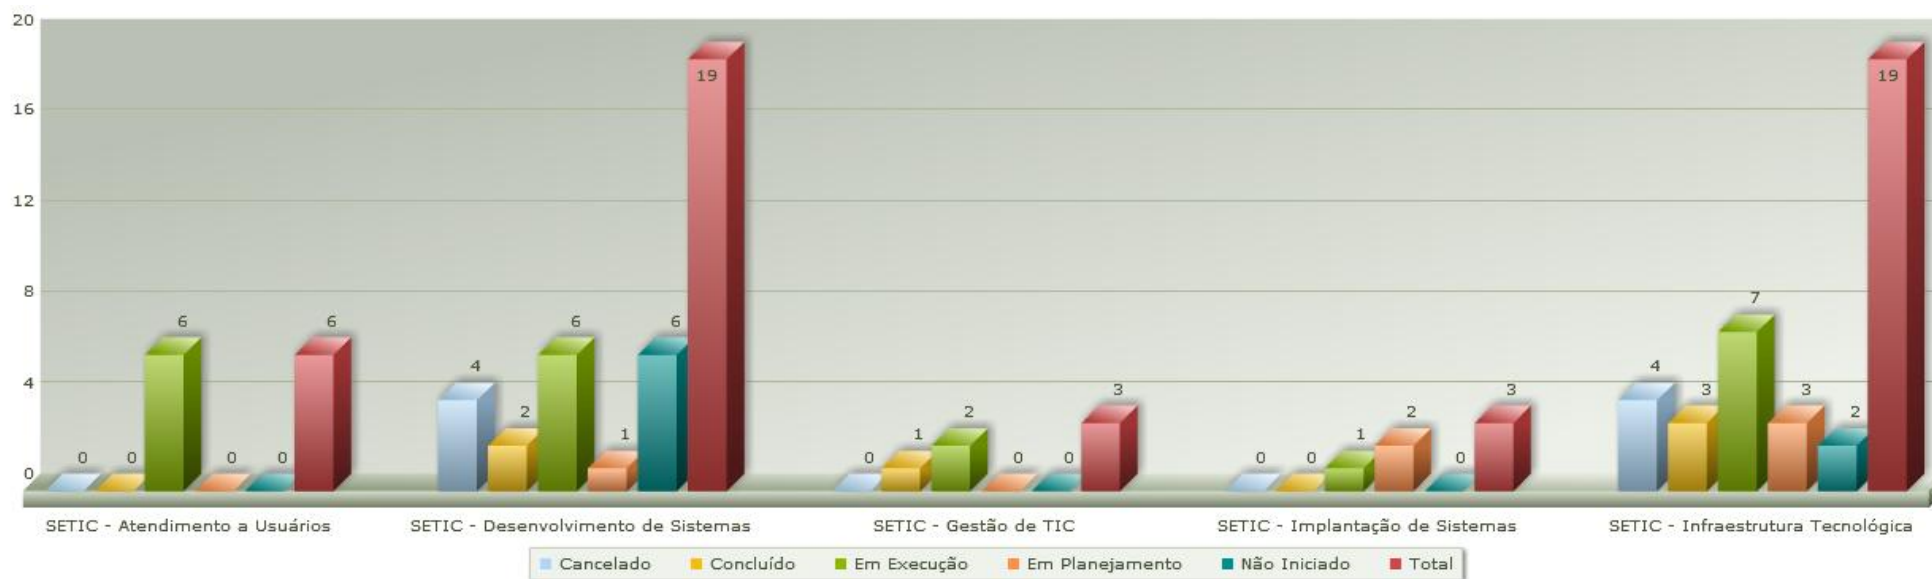


Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo</p> <p>Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}$</p>	<p>IEP - Indicador de Execução do Projeto</p> <p>Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}$</p>
<p>IDC - Indicador de Desempenho do Custo</p> <p>Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}$</p>	<p>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia</p> <p>Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p>Fórmula $IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}$</p>
<p>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento</p> <p>Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p>Fórmula $IPR = \left(\frac{\text{Duração Real do Projeto}}{\text{Duração da Primeira Linha de Base}} - 1 \right) * 100$</p>	


ATENDIMENTO A USUÁRIOS
Andamento dos projetos - últimos 3 meses

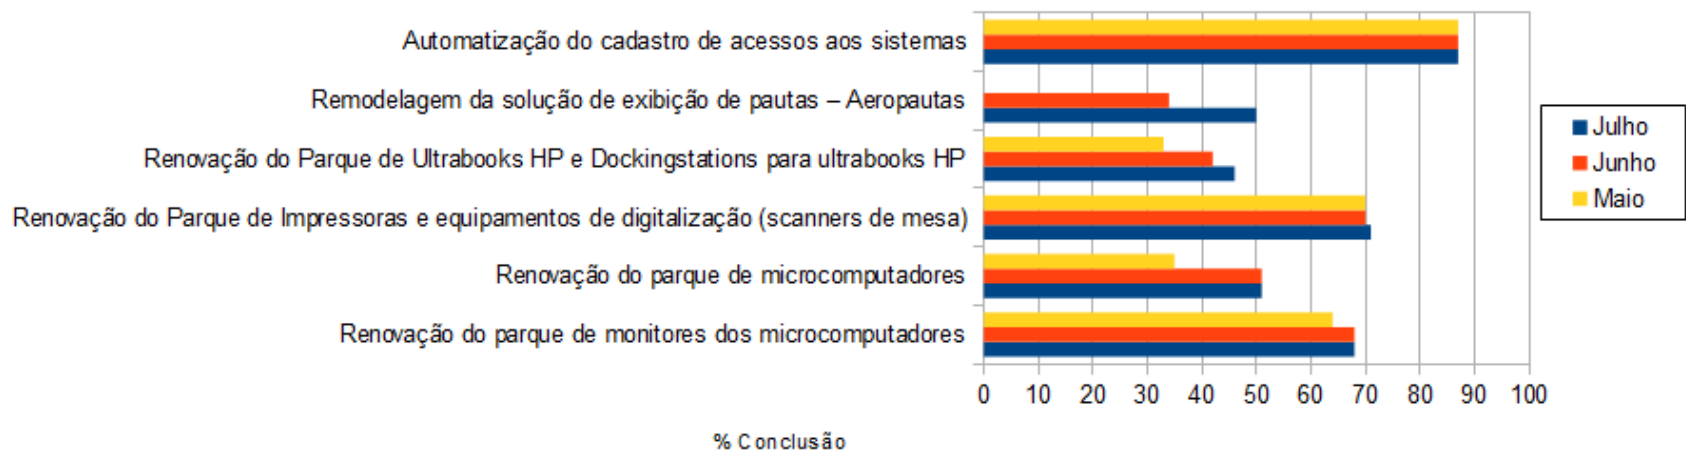

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Prioriza
476	Renovação do parque de monitores dos microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição jul/18: instalados os 2000 monitores comprados em 2017. Feita a aquisição da segunda parte da compra, de 1984 monitores (previsão de chegada: julho e agosto). A intenção é instalar essa segunda remessa com os microcomputadores (projeto 479).	Em Execução	03/07/2017	07/11/2018	03/07/2017		67,95			1	0,84	0	1	30,32	Plano de Projeto Aprovado (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Concluída; Equipamentos recebidos no TRT (MARCO)-Em andamento; Distribuição de software (MARCO)-Concluída; Instalação dos equipamentos para os usuários (MARCO)-Em andamento	19/10/2018	4750
479	Renovação do parque de microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição jul/18: A intenção é realizar a compra no 1o semestre (em ajustes do contrato para posterior assinatura) e a instalação no 2o semestre/2018.	Em Execução	16/03/2018	16/01/2019	10/04/2018		51,5	R\$ 5.679.100,00	R\$ 0,00	0,33	0,98	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Em andamento; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Em andamento; Computadores recebidos no TRT4 (MARCO)-Designada; Instalação dos computadores desktop (MARCO)-Em andamento	07/12/2018	4750
460	Renovação do parque de impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição jul/18: já instaladas as 518 impressoras. Realizada a compra dos 20 scanners aprovados (previsão aproximada de recebimento dia 22/julho, com possibilidade de atraso, pois a compra foi dividida em 2 fornecedores - 15 e 5 scanners). GP fazendo gestão de mudanças para constar os novos prazos e novo nro de scanners (passou de 30 para 20).	Em Execução	01/06/2017	19/12/2018	26/06/2017		70,84	R\$ 1.283.172,11	R\$ 0,00	1	0,97	0	0,8	56,59	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Em andamento; Documentação técnica das impressoras para licitação elaborada (MARCO)-Concluída; Documentação técnica dos escâneres para licitação elaborada (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de impressoras (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de escâneres (MARCO)-Em andamento; Impressoras recebidas no TRT4 (MARCO)-Concluída; Escâneres recebidos no TRT4 (MARCO)-Designada; Instalação das impressoras (MARCO)-Concluída; Instalação dos escâneres (MARCO)-Designada	14/05/2018	4500

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Prioriza
459	Renovação do Parque de Ultrabooks	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição jul/18: TRT4 participe da licitação nacional (TRT2). Realizada a compra de 333 + 8 notebooks. Todos recebidos (recebimento em etapa, finalizado dia 29/junho) e em processo de patrimonialização. Definido fluxo de entrega, aguardando data de início. GP fazer mudança escopo (retirar reaproveitamento notes dos assistentes) e do prazo.	Em Execução	01/06/2017	14/01/2019	26/06/2017		46,04	R\$ 1.577.125,00	R\$ 0,00	0,83	0,88	0	0,8	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Concluída; Elaborar documentação técnica dos notebooks e docking stations para licitação (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Concluída; Equipamentos recebidos no TRT4 (MARCO)-Concluída; Equipamentos patrimonializados (MARCO)-Em andamento; Entrega dos equipamentos adquiridos aos usuários (MARCO)-Em andamento; Preparação e entrega dos Ultrabooks HP 840 aos assistentes dos magistrados (MARCO)-Em andamento; Preparação e entrega do Notebooks HP Elitebook 8460 para as unidades judiciárias (MARCO)-Designada		4250
480	Remodelagem da solução de exibição de pautas - Aeropautas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição jul/18: Escopo inicial contempla o estudo da solução. Conforme o resultado, o projeto poderá ser replanejado para conter a execução da remodelagem (poderá definir compras para 2019). Em realização dos estudos, conforme plano de projeto aprovado.	Em Execução	15/05/2018	04/09/2018	28/05/2018		50			1,5	1,14	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Estudo de mercado e soluções para o Aeropauta (MARCO)-Concluída; Relatório com as descrições das soluções identificadas (MARCO)-Concluída; Parecer do comitê de governança de TIC (MARCO)-Designada	13/08/2018	3500
438	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição jul/18: Sistemas administrativos não fazem mais parte do escopo. Concluído o desenvolvimento das equipes CDS1 e CDS2. Em reunião com a Diretora da SETIC, definido retirar do escopo o PJe e aguardar conclusão da CIT (API de sincronização do AD com o RH), prevista para 25/07, para última homologação e conclusão do projeto. Somente o InFOR e NovaJus4 estarão automatizados. GP fazer mudança.	Em Execução	24/03/2017	10/09/2018	03/04/2017		87,52			0,66	0,9	0	0,8	309,3	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definição da listagem de métodos necessária para a integração com cada sistema (MARCO)-Em andamento; Plano de implementação dos serviços para gestão do cadastro (MARCO)-Concluída; Desenvolvimento de serviços de automatização dos registros nas bases de dados (MARCO)-Em andamento; Desenvolvimento de uma interface de usuário única para a gestão de credenciais (MARCO)-Em andamento	03/04/2018	2250


DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

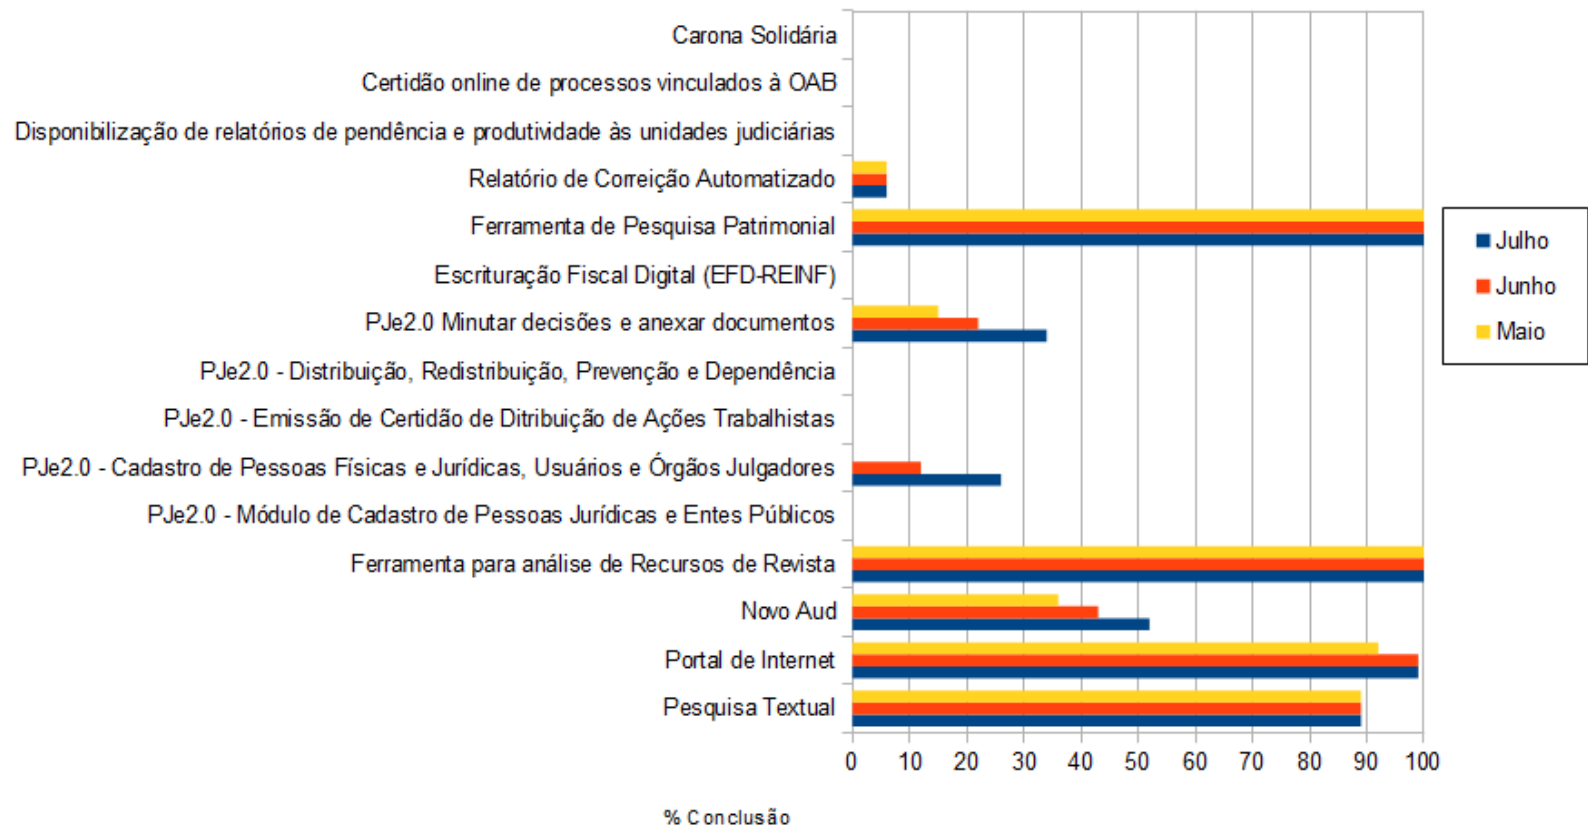

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Prioriza
457	Pesquisa Textual	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição jul/18: dia 29/maio a pesquisa de acórdãos ampla entrou em produção para o público externo. Será retirado do escopo: dissídios coletivos e biblioteca virtual. A princípio o projeto será encerrado com pendências (consulta de despachos da Corregedoria e pesquisa no portal de internet). EP vai validar com Natacha essa proposta de encerramento.	Em Execução	20/03/2017	13/07/2018	20/03/2017		88,93			0,44	0,88	0	0,83	74,57	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Estudo preliminar-Concluída; Entrega - Pesquisa em Atos normativos (internet)-Concluída; Entrega 1a. etapa HOMOLOGAÇÃO INTERNA - Pesq. de ac. ampla-Concluída; Publicação da Pesquisa ampla na internet-Em planejamento; Pesquisas complementares-Em planejamento; Entrega 2a. etapa - Pesquisas complementares-Em planejamento; Finalização-Em planejamento	16/04/2018	5500
458	Portal de Internet	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição jul/18: a princípio seria necessário prorrogar o prazo até final de outubro. EP validar o momento de encaminhar a mudança.	Em Execução	20/03/2017	02/07/2018	20/03/2017		99,09			0,57	0,99	0	0,83	175,22	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definir escopo do produto-Concluída; Programacao Portal - parte 1-Concluída; Lançamento do Portal ao público externo-Concluída; Programacao Portal - parte 2-Em andamento; Finalização-Em planejamento	30/04/2018	5000


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Prioriza
486	PJe2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, Usuários e Órgãos Julgadores	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição jul/2018: contempla escopo do 485 (pessoas jurídicas e entes públicos). Plano de projeto aprovado. Sprint 5 em andamento.	Em Execução	11/04/2018	02/04/2019	16/04/2018		26,23			1	0,95	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Designada; Definir escopo do produto-Concluída; Entrega 1: Cadastro de pessoa física e usuários internos-Em andamento; Entrega 2: Cadastro de usuários externos-Designada; Entrega 3: Cadastro de P.J, Órgão de Representação e Unificação-Designada; Entrega 4: Cadastro de Órgão Julgador e Órgão Julgador Colegiado-Designada	22/03/2019	4375
487	PJe2.0 - Emissão de Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA		Não Iniciado	16/03/2018	17/04/2018			0										4375
489	PJe2.0 - Distribuição, Redistribuição, Prevenção e Dependência	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA		Não Iniciado	16/03/2018	17/04/2018			0										4375
488	PJe2.0 Minutar decisões e anexar documentos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição jul/18: Alterado nome do projeto de "Pje 2.0 - Componente para edição de textos" para "Pje 2.0 Minutar decisões e anexar documentos". Realizada entrega 1 (componente para edição de textos). Entrega 2 (componente para edição de textos customizado) prevista para 24/08.	Em Execução	09/04/2018	21/02/2019	09/04/2018		34,21			0,33	0,91	0	1	2,45	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Designada; Definir escopo do produto-Em andamento; Entrega 1: Componente para edição de textos-Em andamento; Entrega 2: Componente para edição de textos customizado-Em andamento; Entrega 3: Minutar/revisar decisão-Designada	08/02/2019	4250
463	Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF)	MARCIO BYSTRONSKI	Posição jun/18: Conforme ata de reunião ocorrida no dia 27/abril/18, do Grupo de Trabalho do Sistema EFD-REINF, entende-se que o projeto 463, que contemplaria o desenvolvimento de uma solução local, pode ser cancelado. Motivo: grandes demandas atuais da SETIC e confirmação que o sistema SIGEO-JT providenciará o envio das informações da EFD-REINF. Confirmar esse cancelamento com o Comitê de Governança de TIC.	Em Planejamento	10/04/2017	28/04/2017			0										4000
474	Ferramenta de Pesquisa Patrimonial	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	***CONCLUÍDO*** Liberado para uso em produção, para as unidades piloto, em 13/dez. Entrega do produto final realizada dia 04/abril/18. Benefícios sendo medidos até dezembro/18.	Concluído	14/08/2017	04/04/2018	14/08/2017	21/05/2018	100			1	1	0	1	71,95		04/04/2018	3625

GESTÃO DE TIC
Andamento dos projetos - últimos 3 meses

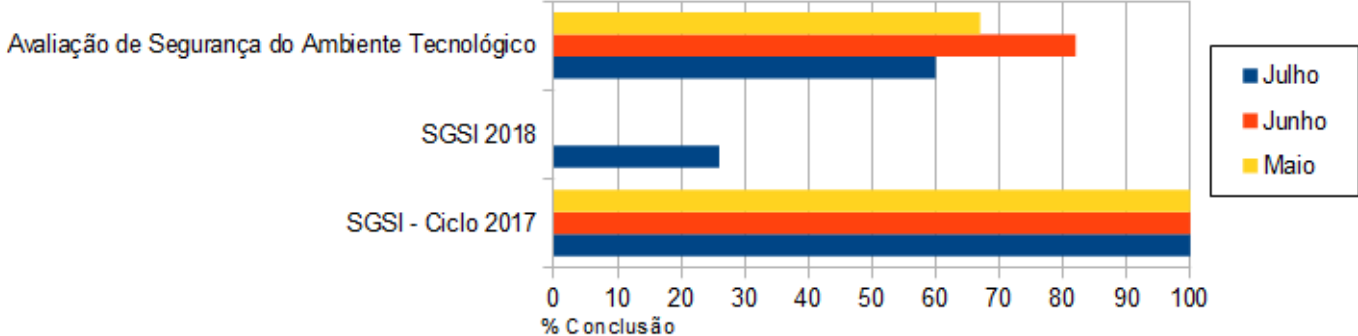


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Prioriza
452	SGSI - Ciclo 2017	LUCAS POZATTI	PROJETO CONCLUÍDO. Produto final entregue em 23/04/2018. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	01/03/2017	16/05/2018	01/03/2017	10/05/2018	100			1	1	0	1	7,66		23/04/2018	3250
503	SGSI 2018	LUCAS POZATTI	Posição jul/18: plano de projeto aprovado. Em realização da análise e avaliação de riscos.	Em Execução	18/06/2018	22/03/2019	18/06/2018		26,29			0,33	1,6	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Formalização do Escopo do SGSI-Em andamento; Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos -Em andamento; Análise e Avaliação de Riscos-Em andamento; Plano de Tratamento de Riscos-Em planejamento; Indicadores SGSI-Em planejamento; Análise Crítica do SGSI-Em planejamento	15/03/2019	2875
490	Avaliação de Segurança do Ambiente Tecnológico	LUCAS POZATTI	Posição jul/18: as soluções estudadas foram apresentadas. Não aprovada a contratação de empresa para realização de PenTest. Replanejar o escopo contemplando a análise de ferramentas para realizar a avaliação de segurança com a equipe interna.	Em Execução	19/01/2018	04/12/2018	19/01/2018		59,84			0,5	0,73	0	0,8	111,88	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Estudo das soluções disponíveis no mercado-Concluída; Decisão de adoção de solução-Concluída; Contratação-Em andamento; Teste de invasão-Em planejamento; Correção-Em planejamento; Reteste-Em planejamento	28/05/2018	2625

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

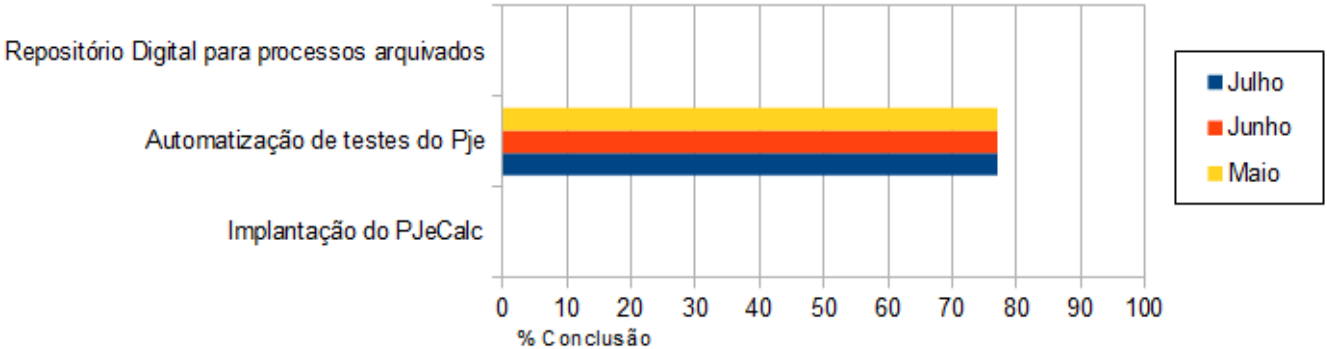

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Andamento dos projetos - últimos 3 meses

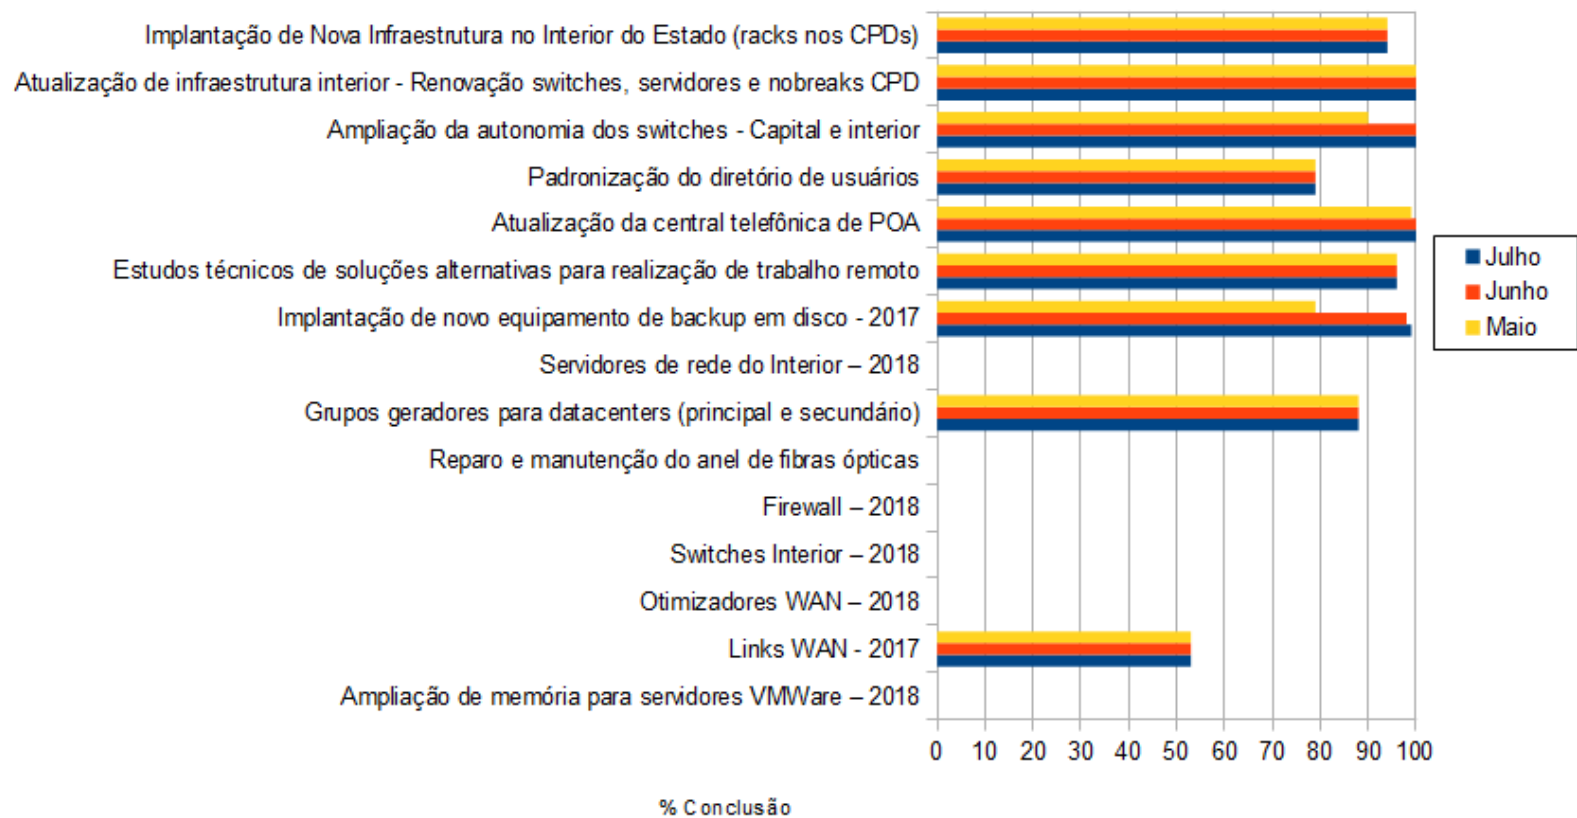

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Prioriza
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição jul/18: geradores instalados e funcionando, em 22/dez/2017. Fornecedor realizou todos os ajustes que faltavam. Gerador antigo permanece fornecendo carga para os sistemas de telefonia e de segurança (verificar como ficará essa questão, antes da conclusão do projeto). Encaminhar encerramento.	Em Execução	01/06/2015	19/12/2017	01/06/2015		88,16	R\$ 797.085,61	R\$ 0,00	0,5	0,88	0	1	240,34	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Contratação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	24/11/2017	4000
498	Servidores de rede do Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição jul/18: parte da garantia dos servidores vence em maio, outra, em novembro/2019. Previsão do envio da documentação para contratação em agosto. Planejamento e kick-off devem ser realizados.	Não Iniciado	19/03/2018	03/07/2018			0										3875
499	(CANCELADO) Estudo para melhoria da conexão do TRT4 com internet	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0										3750
453	Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição jul/18: Entrega do produto final realizada em 15/06/18. Aceite aprovado e mapa de benefícios enviado. Falta apenas reunião de encerramento, marcada para 25/jul.	Em Execução	13/03/2017	30/04/2018	19/05/2017		99,11	R\$ 1.071.124,10	R\$ 1.071.124,10	0,85	0,99	1	1	40,1	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em andamento; Contratação-Concluída; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Concluída; Homologação-Concluída; Transição para a Produção-Concluída	15/06/2018	3500
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição jul/18: criado novo ambiente (GV4). Em testes por usuários pontuais. Atualização das licenças atuais do MS já aprovada. Aquisição de novas licenças será avaliada pelo Comitê, após SETIC apresentar relatório de uso atual. GP replanejar projeto.	Em Execução	02/03/2015	12/12/2016	14/08/2015		96,27	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,5	0,96	0	0,8	72,35	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento	06/11/2017	3375
473	Atualização da central telefônica de POA	ADRIANO SIMIONI	***PROJETO CONCLUÍDO*** Atualização da central realizada dia 22/12/2017. Produto final entregue dia 04/04/2018. Medir Benefícios dia 30/agosto (Martene e Madison).	Concluído	01/06/2017	11/01/2018	29/06/2017	08/06/2018	100	R\$ 500.000,00	R\$ 593.000,00	1	1	1,18	1	0		04/04/2018	3125
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	Posição jul/18: solução da autenticação local já validada e em uso em 3 Varas de São Leopoldo. Aprovada estratégia para acelerar as migrações. Em programação da automação necessária para reiniciar as migrações. Previsão início 2019. GP replanejar projeto.	Em Execução	28/08/2014	19/12/2017	28/08/2014		78,72			0,5	0,78	0	0,5	125,94	Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Em andamento; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência do Projeto-Em planejamento		2750

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	Prioriza
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue 30/04/2018. Medir benefícios (ESI definir SLA para autonomia computadores, em setembro/18).	Concluído	25/08/2014	16/11/2017	10/11/2014	15/06/2018	100	R\$ 77.900,00	R\$ 77.900,00	1	1	1	1	103,77		30/04/2018	2750
500	(CANCELADO) Estudo da centralização de processamento do interior	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas se tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0										2750
501	(CANCELADO) Racks de CPD para o Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Transformar em Ação Estratégica. Contemplará apenas a aquisição de dois equipamentos, solicitados pela SETIC. SEMPRO não formalizou a demanda dos outros três racks solicitados, entendendo que podem ser adquiridos posteriormente. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0										2625
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	Projeto concluído. Produto final entregue em 19/jan/18. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	07/02/2014	11/01/2018	07/02/2014	21/05/2018	100	R\$ 1.479.559,40	R\$ 1.479.559,40	1	1	1	1	4,94		19/01/2018	2000
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição jul/18: Arroio Grande, nova sede prevista para final de 2018. Paulo Mendes vai realizar vistoria em Gramado na semana de 23/07 (deve fazer parte desse projeto). GP fazer mudança e formalizar a retirada de Lagoa Vermelha do escopo do projeto.	Em Execução	09/01/2012	04/06/2018	19/04/2012		93,89	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	0,77	0,93	1	0,8	200,99	Localidades 2012/1-Concluída; Localidades 2012/2-Concluída; Localidades 2013/1-Concluída; Localidades 2013/2-Concluída; Localidades 2014/01-Concluída; Localidades 2014/02-Concluída; Compra de 5 racks-Concluída; Localidades 2015/01-Em andamento; gerencia do projeto-Em andamento	01/06/2018	1375

AÇÕES ESTRATÉGICAS APROVADAS PDTI 2018

Título	Solicitante	Unidade Organizacional	OBJETIVO / Solicitação	Observação	STATUS JULHO/2018	ESTIMATIVA DE TÉRMINO
ATENDIMENTO A USUÁRIOS						
Boletins informativos da SETIC	DIEGO FRAGA CONTESSA	Seção de Atendimento a Usuários	Preparar e divulgar "boletins" informativos, com pontos de fácil solução, a serem divulgados para todo o TRT, a fim de orientar os usuários sobre procedimentos simples - uso do Google Drive, troca de toner em impressoras, desbloqueio de tokens, etc. A divulgação poderia ser via VOX ("Fica Dica TI") ou outro meio, a definir.	Periodicidade de divulgação dos boletins será mensal.	Primeiro boletim informativo publicado dia 10/julho/2018.	Julho/2018
SETIC de portas abertas	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS (COORDENADOR-CJ2)	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Estabelecer uma agenda de visitas guiadas à SETIC. Os servidores e magistrados de POA poderão se inscrever para participar das visitas. Nas visitas um servidor da SETIC ficará responsável por receber e guiar os visitantes pelas diversas áreas da SETIC, os responsáveis (ou pessoas indicadas) pelas áreas recepcionarão os visitantes nas suas áreas e falarão sobre as suas atribuições e projetos.	As visitas devem ser oferecidas para magistrados e servidores de Porto Alegre para não gerar custo com deslocamentos e diárias.	Não iniciado.	
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS						
SADM (Seção de Sistemas Administrativos)						
Implantação do sistema PROAD	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA (DIRETOR DE SECRETARIA - CJ3)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Implantar o sistema PROAD para realizar o controle de processos administrativos, em substituição ao sistema ADMEletrônico.	Considerando não haver migração de dados do sistema legado (ADME).	Iniciado em dez/2017 e implantado na Ouvidoria. A implantar na corregedoria e na área administrativa (aguardando liberação da DG). EAD disponibilizado pela EJ. Treinamento dos usuários está sendo feito pela CIS.	Depende de definição pela DG
Integração dos sistemas e/ou serviços com o SIGEP	RUBILAR DA SILVA JARDIM	Seção de Sistemas Administrativos	Adaptar todos os sistemas/serviços/relatórios que utilizam informações dos sistema de RH e Folha de Pagamento atuais para que passem a buscar essas mesmas informações no sistema SIGEP.	A estimativa inicial foi realizada antes do mapeamento de todas integrações envolvidas. Essa integração é uma tarefa do projeto estratégico (SIGEP), coordenado pela DG/AGE.	Iniciado o levantamento em fevereiro/2018 e as adaptações em abril/2018. Envolve todas as áreas do desenvolvimento, SM e sistemas de terceiros utilizados no TRT.	Até que o sistema de RH seja desligado. Data provável março/19. OBS.: Essa é uma das ações do projeto estratégico SIGEP e está sendo controlada pela DG. Validar com a Diretora da SETIC se essa ação será controlada na SETIC também
Remoção eletrônica - simultânea e sucessiva - de Juizes Titulares	CARINE MOEHLECKE KOHMANN	Seção de Atendimento ao Magistrado	Instalar sistema eletrônico para agilizar o procedimento de remoção simultânea e sucessiva de Juizes Titulares entre as Varas do Trabalho da 4ª Região, observado o critério da antiguidade na classe.	Considerando projeto SIGEP, gerenciado pela DG, comunicar a necessidade e o impacto na reunião do projeto.	Aguardando sistema de autoatendimento da 15ª região. Módulo será incorporado no SIGEP (projeto estratégico).	Essa é uma das ações do projeto estratégico SIGEP e está sendo controlada pela DG. Validar com a Diretora da SETIC se essa ação será controlada na SETIC também
SJUD (Seção de Sistemas Judiciais)						
Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo)	Carlos da Silveira (Assistente chefe do arquivo)			Ação Estratégica criada a partir do projeto 465 (o qual foi cancelado)	Reunião com solicitante dia 11/junho, para organização das definições. Serão validadas e iniciadas conforme a possibilidade da equipe, frente às demais atividades.	Em desenvolvimento de 3 itens definidos
INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA						
Remodelagem da solução de Quiosque Digital	ANA LUCIA MOREIRA	Seção de Microinformática	Atualizar o modelo de imagem utilizada na preparação dos computadores de quiosque, que atualmente requer um modelo específico de máquina (positivo D570, computador antigo e fora da garantia), e que apresenta muitos passos manuais após a baixa de imagem propriamente dita, tornando o processo muito demorado.		Registrado no backlog da SST.	Sem previsão
Estudo da centralização de processamento do interior			Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 500 (o qual foi cancelado)	Não iniciado.	
Estudo para adoção de HSM para armazenamento de certificados digitais			Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 496 (o qual foi cancelado)	Está na fase inicial dos estudos (Paulo Mendes).	
Estudo para melhoria da conexão do TRT4 com internet			Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 499 (o qual foi cancelado)	Gustavo iniciará estudos após as atividades do projeto 493 - Otimizadores WAN 2018.	
Racks de CPD para o Interior - 2018			Contemplará apenas a aquisição de dois equipamentos, solicitados pela SETIC. SEMPRO não formalizou a demanda dos outros três racks solicitados, entendendo que podem ser adquiridos posteriormente.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 501 (o qual foi cancelado)	DOD assinado e encaminhado para pregão no final de junho.	
