


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PROJETOS DA SETIC PDTI 2018-2019

Data: Agosto/2018 v1.0

1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria

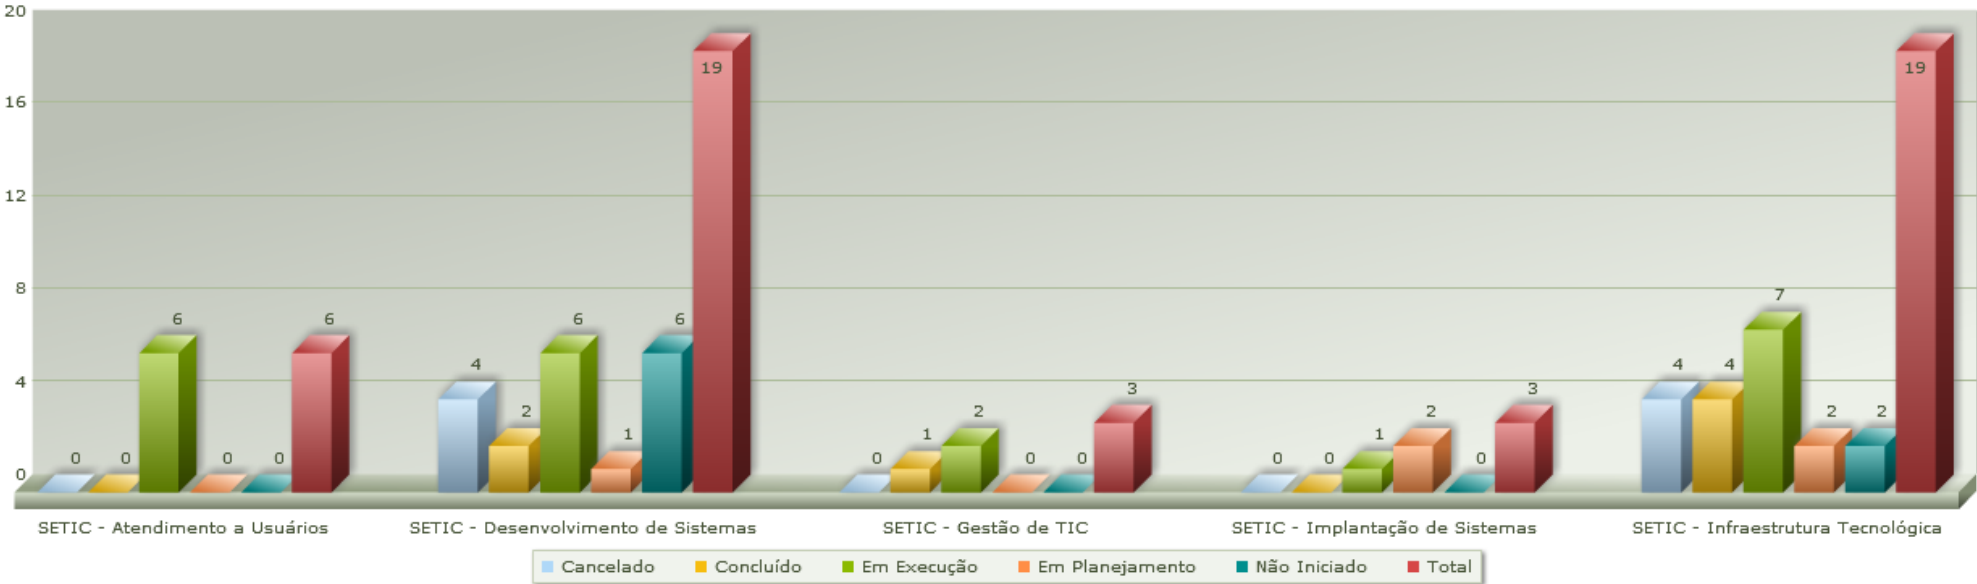


Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo</p> <p>Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}$</p>	<p>IEP - Indicador de Execução do Projeto</p> <p>Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}$</p>
<p>IDC - Indicador de Desempenho do Custo</p> <p>Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}$</p>	<p>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia</p> <p>Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p>Fórmula $IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}$</p>
<p>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento</p> <p>Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p>Fórmula $IPR = \left(\frac{\text{Duração Real do Projeto}}{\text{Duração da Primeira Linha de Base}} - 1 \right) * 100$</p>	

ATENDIMENTO A USUÁRIOS
Andamento dos projetos - últimos 3 meses

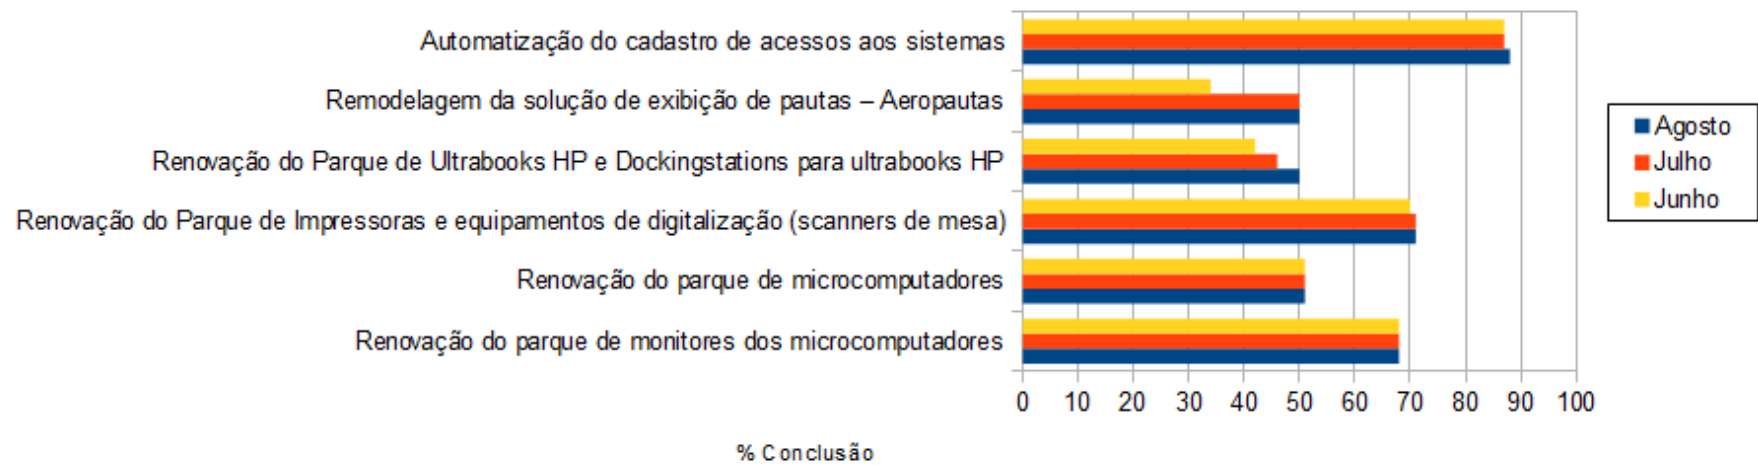


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
476	Renovação do parque de monitores dos microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição ago/18: instalados os 2000 monitores comprados em 2017. Feita a aquisição da segunda parte da compra, de 1984 monitores (primeiro lote chegou em julho, restante previsto em agosto). Serão instalados com os microcomputadores (projeto 479).	Em Execução	03/07/2017	07/11/2018	03/07/2017		67,95			0,75	0,78	0	1	30,32	Plano de Projeto Aprovado (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Concluída; Equipamentos recebidos no TRT (MARCO)-Em andamento; Distribuição de software (MARCO)-Concluída; Instalação dos equipamentos para os usuários (MARCO)-Em andamento	19/10/2018	19/10/2018	4750
479	Renovação do parque de microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição ago/18: compra dos 1750 micros realizada. Recebidos 450, dos 1750 totais. Restante tem o prazo de até 26/ago para chegar. Houve demora na assinatura do contrato. GP fazer mudança para adequação dos prazos.	Em Execução	16/03/2018	16/01/2019	10/04/2018		51,5	R\$ 5.679.100,00	R\$ 0,00	0,25	0,87	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Em andamento; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Em andamento; Computadores recebidos no TRT4 (MARCO)-Designada; Instalação dos computadores desktop (MARCO)-Em andamento	07/12/2018		4750
460	Renovação do parque de impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição ago/18: já instaladas as 518 impressoras. Realizada a compra dos 20 scanners aprovados. Compra dividida entre 2 fornecedores - 15 e 5 unidades. O fornecedor dos 5 ainda está em análise da Presidência. Previsão de recebimento era 22/julho, no entanto, nenhum scanner recebido. GP fazendo gestão de mudanças para constar os novos prazos e novo nro de scanners (passou de 30 para 20).	Em Execução	01/06/2017	19/12/2018	26/06/2017		70,84	R\$ 1.283.172,11	R\$ 0,00	0,75	0,93	0	0,8	56,59	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Em andamento; Documentação técnica das impressoras para licitação elaborada (MARCO)-Concluída; Documentação técnica dos escâneres para licitação elaborada (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de impressoras (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de escâneres (MARCO)-Em andamento; Impressoras recebidas no TRT4 (MARCO)-Concluída; Escâneres recebidos no TRT4 (MARCO)-Designada; Instalação das impressoras (MARCO)-Concluída; Instalação dos escâneres (MARCO)-Designada	14/05/2018		4500
459	Renovação do Parque de Ultrabooks	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição ago/18: TRT4 participe da licitação nacional (TRT2). Realizada a compra de 333 + 8 notebooks. Todos recebidos (recebimento em etapa, finalizado dia 29/junho) e patrimoniados. Entrega iniciada em julho (entregue aprox 10% do total). GP fazer gestão de mudança no prazo e retirar reaproveitamento notes dos assistentes.	Em Execução	01/06/2017	14/01/2019	26/06/2017		50,42	R\$ 1.577.125,00	R\$ 0,00	1	0,88	0	0,8	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Concluída; Elaborar documentação técnica dos notebooks e docking stations para licitação (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Concluída; Equipamentos recebidos no TRT4 (MARCO)-Concluída; Equipamentos patrimoniados (MARCO)-Concluída; Entrega dos equipamentos adquiridos aos usuários (MARCO)-Em andamento; Preparação e entrega dos Ultrabooks HP 840 aos assistentes dos magistrados (MARCO)-Em andamento; Preparação e entrega do Notebooks HP Elitebook 8460 para as unidades judiciárias (MARCO)-Designada	14/01/2018		4250


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Prioriz ação
480	Remodelagem da solução de exibição de pautas - Aeropautas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição ago/18: Escopo inicial contempla o estudo da solução. Conforme o resultado, o projeto poderá ser replanejado para conter a execução da remodelagem (poderá definir compras para 2019). Estudos finalizados, aguardando reunião com o Comitê de Governança de TIC, para obtenção do parecer (prevista para segunda quinzena de agosto).	Em Execução	15/05/2018	04/09/2018	28/05/2018		50			0,75	0,76	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Estudo de mercado e soluções para o Aeropauta (MARCO)-Concluída; Relatório com as descrições das soluções identificadas (MARCO)-Concluída; Parecer do comitê de governança de TIC (MARCO)-Designada	13/08/2018		3500
438	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição ago/18: Sistemas administrativos não fazem mais parte do escopo. Concluído o desenvolvimento das equipes CDS1 e CDS2. Em reunião com a Diretora da SETIC, definido retirar do escopo o PJe e aguardar conclusão da CIT (API de sincronização do AD com o RH), com nova previsão para 19/09. Após, será feita nova homologação e conclusão do projeto. Somente o InFOR e NovaJus4 estarão automatizados. GP fazer mudança, salientando nova data da CIT.	Em Execução	24/03/2017	10/09/2018	03/04/2017		87,52			0,5	0,88	0	0,8	309,3	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definição da listagem de métodos necessária para a integração com cada sistema (MARCO)-Em andamento; Plano de implementação dos serviços para gestão do cadastro (MARCO)-Concluída; Desenvolvimento de serviços de automatização dos registros nas bases de dados (MARCO)-Em andamento; Desenvolvimento de uma interface de usuário única para a gestão de credenciais (MARCO)-Em andamento	03/04/2018		2250

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Andamento dos projetos - últimos 3 meses

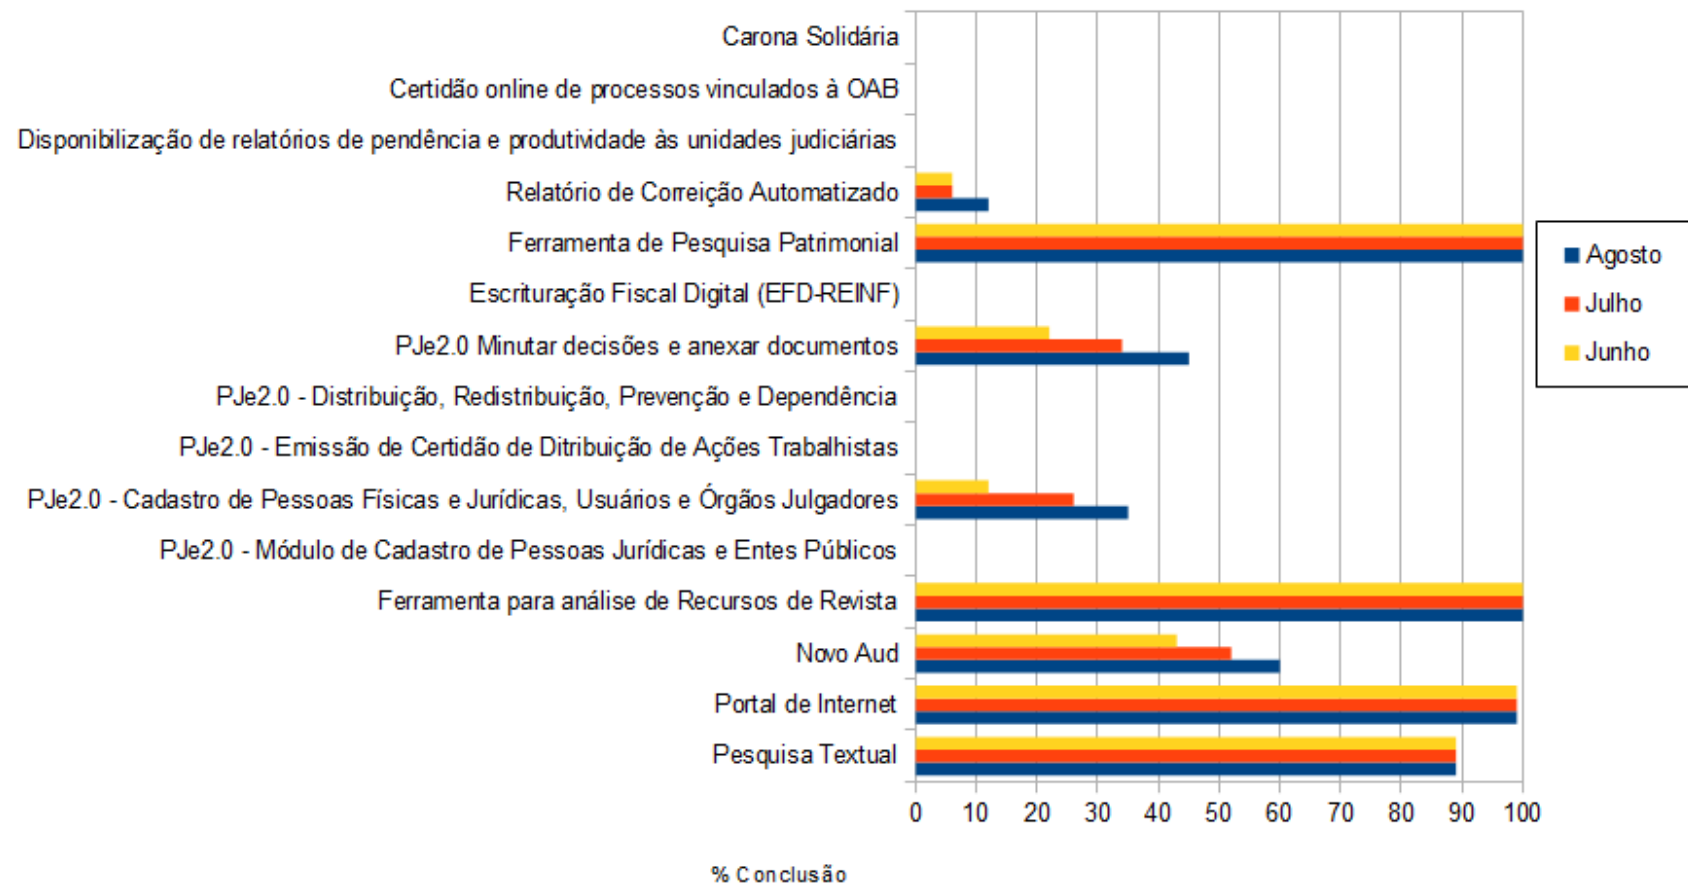


GESTÃO DE TIC Andamento dos projetos - últimos 3 meses

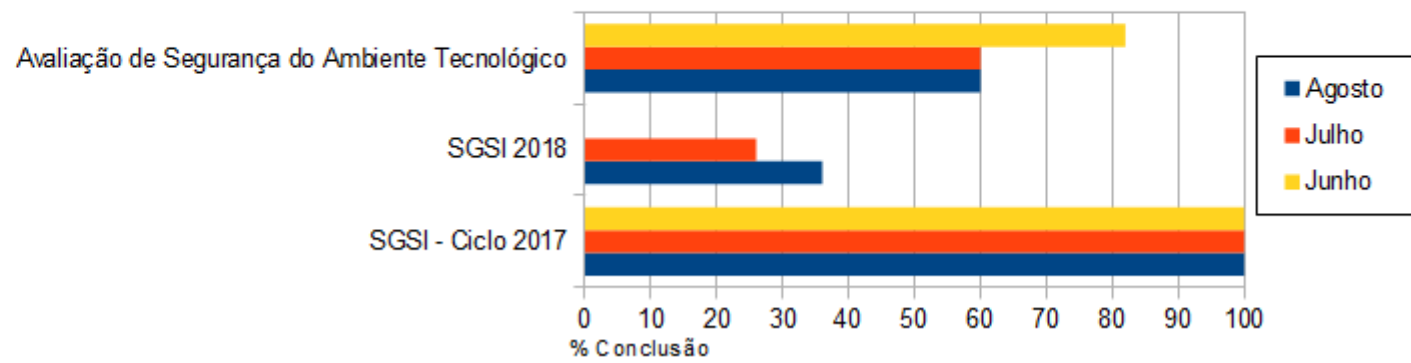

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
452	SGSI - Ciclo 2017	LUCAS POZATTI	PROJETO CONCLUÍDO. Produto final entregue em 23/04/2018. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	01/03/2017	16/05/2018	01/03/2017	10/05/2018	100			1	1	0	1	7,66		30/04/2018	23/04/2018	3250
503	SGSI 2018	LUCAS POZATTI	Posição ago/18: Em realização da análise e avaliação de riscos e da declaração de aplicabilidade (realizada mudança para a inclusão desse segundo item no escopo do projeto, sem alteração de prazo final).	Em Execução	18/06/2018	22/03/2019	18/06/2018		35,91			0,75	1,03	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Formalização do Escopo do SGSI-Concluída; Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos -Concluída; Declaração de Aplicabilidade-Em andamento; Análise e Avaliação de Riscos-Em andamento; Plano de Tratamento de Riscos-Em planejamento; Indicadores SGSI-Em planejamento; Análise Crítica do SGSI-Em planejamento	15/03/2019		2875
490	Avaliação de Segurança do Ambiente Tecnológico	LUCAS POZATTI	Posição ago/18: Não aprovada a contratação de fornecedor para realização de PenTest (cronograma atual do tracé diferente da versão aprovada do projeto). Replanejar o escopo contemplando a análise de ferramentas para que a avaliação de segurança seja feita pela equipe interna (em estudo de ferramentas free antes do replanejamento).	Em Execução	19/01/2018	04/12/2018	19/01/2018		59,84			0,5	0,7	0	0,8	111,88	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Estudo das soluções disponíveis no mercado-Concluída; Decisão de adoção de solução-Concluída; Contratação-Em andamento; Teste de invasão-Em planejamento; Correção-Em planejamento; Reteste-Em planejamento	28/05/2018		2625

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS


Andamento dos projetos - últimos 3 meses

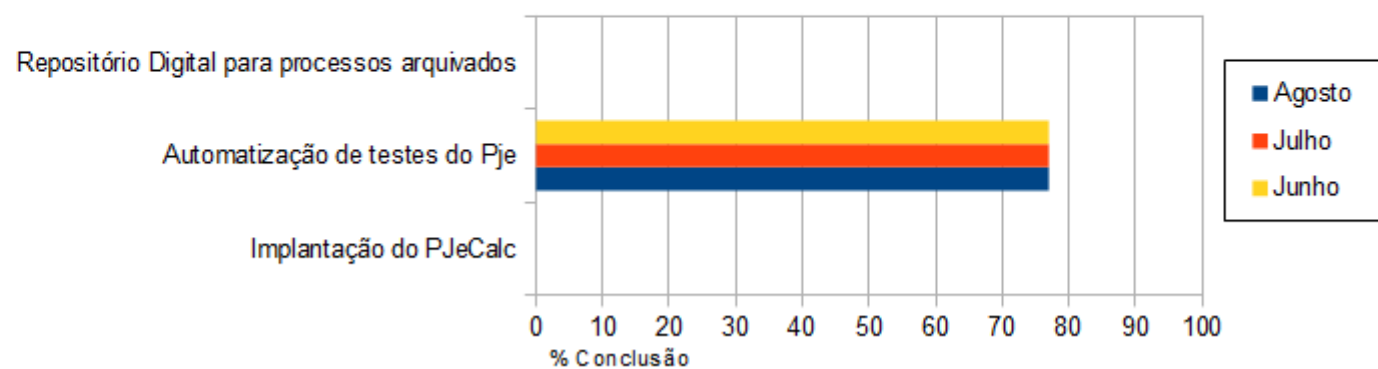

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
491	Implantação do PJeCalc	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJZ)	Posição ago/18: sistema instalado em produção. Projeto em planejamento, com previsão de início para o segundo semestre. Dr Evandro Urnau (representante do negócio) e Escola Judicial realizando as definições sobre as capacitações a serem feitas. GP irá consolidar as definições para elaborar plano de projeto e realizar kick-off.	Em Planejamento	19/03/2018	03/07/2018			0											4750
470	Automatização de testes do PJe	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJZ)	Posição ago/18: testes inicialmente automatizados com a versão atual do PJe (1x) e na tecnologia Selenium (não implantado em produção). Alguns testes refeitos na versão nova do PJe (2.0) e com nova tecnologia de automatização (RedWood). CSJT iniciando projeto de teste similar, o qual faremos parte. GP vai elaborar documento com o resultado do trabalho feito até o momento. Após definido projeto nacional, sugerido pelo GP que seja acompanhado como ação estratégica. Sugerido o cancelamento desse projeto (VALIDAR COM O COMITÊ DE GOVERNANÇA DE TIC).	Em Execução	12/06/2017	16/11/2017	16/06/2017		76,59			0,66	0,76	0	0,8	-0,93	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Treinamentos relativos à testes de softwares pelos servidores da CIS-Concluída; Automatização dos casos de testes de prioridade alta-Concluída; Atualização e regulamentação do processo de testes do PJe-Em andamento; Orientação das áreas de negócios sobre a operação das automatizações desenvolvidas-Concluída	30/11/2017		3625
484	Repositório Digital para processos arquivados	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJZ)	Posição ago/18: Treinamento da ferramenta ATOM realizado início de agosto. GP irá validar as definições e elaborar plano de projeto/realizar kick-off (definir processos que terão documentos arquivados, rotina de exportação/importação dos documentos, etc). GP priorizar esse planejamento.	Em Planejamento	16/03/2018	17/04/2018			0											3250

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Andamento dos projetos - últimos 3 meses

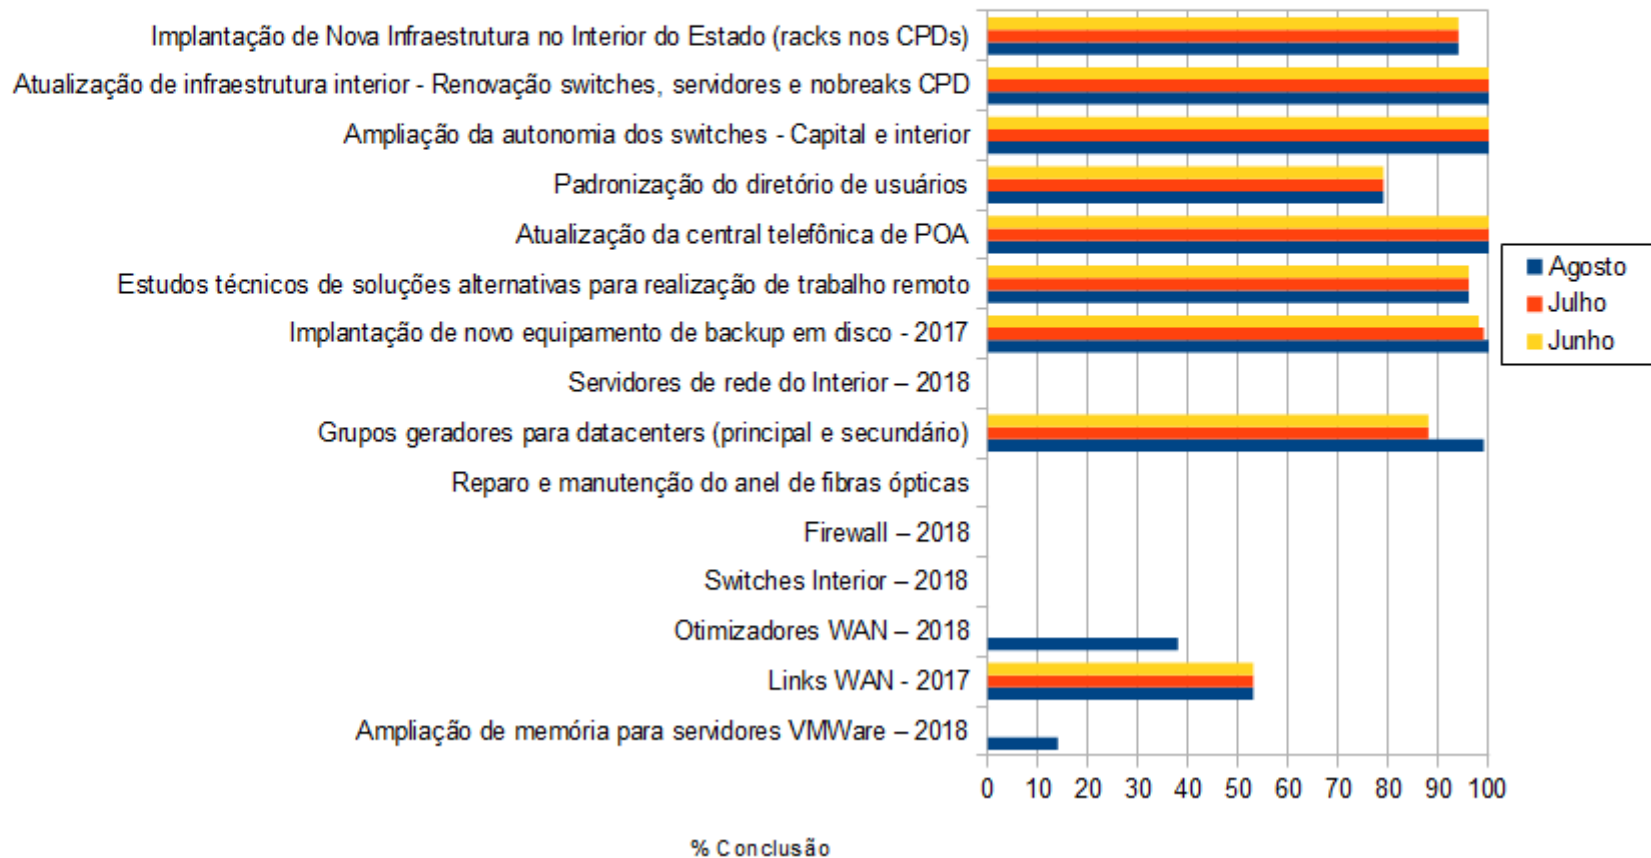

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização	
492	Ampliação de memória para servidores VMWare - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição ago/18: Em contato com o fornecedor (LTA/Dell) para a realização da transferência de memória, para não perdermos a garantia dos equipamentos. Em andamento o processo para a compra de novas memórias. GP anexar aprovação do plano de projeto e ata kick-off.	Em Execução	19/03/2018	19/12/2018	22/06/2018		14,29			0	0,28	0	0,5	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Em andamento; Encerramento do projeto-Em planejamento; Estudo técnico dos equipamentos R730-Em planejamento; Especificação técnica detalhada-Designada; Contratação-Em andamento; Execução-Em planejamento; Aplicação em produção-Em planejamento			5000	
454	Links WAN - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição ago/18: Fornecedor (Claro) ainda não concluiu (seu prazo de 90 dias terminava em 23/07) e tem mais 90 dias para concluir ou ser inexecutado. Desde 27/07 o interior está apenas com o link principal (data de término de vigência do link redundante da Oi). Data contida no último plano diferente do cronograma do trace (verificar necessidade de mudança).	Em Execução	10/01/2017	15/08/2018	09/03/2017		52,66	R\$ 2.033.643,48	R\$ 0,00	0,42	0,52	0	0,8	75	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Concluída; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em andamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	14/09/2018		4750	
493	Otimizadores WAN - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição ago/18: Projeto com alto risco. Garantia vence em 28/11. Projeto precisa ser pago com orçamento de 2018. Pregão agendado para 15/ago. SETIC vai instalar parte da solução para reduzir prazo de entrega do fornecedor (de 90 para 75 dias).	Em Execução	19/03/2018	18/12/2018	03/05/2018		38,2			1	0,96	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	14/12/2018		4750	
494	Switches Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição ago/18: Aquisição sendo feita pelo TRT8. Pregão homologado, em prazo de recurso. Após assinatura do contrato, kick-off será realizado.	Em Planejamento	19/03/2018	03/07/2018			0												4750
495	Firewall - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição ago/18: Aquisição sendo feita pelo TRT12. Edital homologado. Kick-off será realizado após assinatura do contrato, para ter acesso aos prazos.	Em Planejamento	19/03/2018	03/07/2018			0												4750
496	(CANCELADO) Estudo para adoção de HSM para armazenamento de certificados digitais	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0												4375
497	Reparo e manutenção do anel de fibras ópticas	ADRIANO SIMIONI	PA encaminhado para a DG/Presidência, com informações sobre o que foi danificado. Paulo solicitou que fosse transformado em Ação Estratégica, caso seja dado seguimento. Validar com o Comitê de Governança de TIC.	Não Iniciado	19/03/2018	03/07/2018			0												4375
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição ago/18: geradores instalados e funcionando, em 22/dez/2017. Encerramento realizado, em prazo para aprovação do aceite.	Em Execução	01/06/2015	19/12/2017	01/06/2015		99,06	R\$ 797.085,61	R\$ 680.000,00	0,75	0,99	0,85	1	240,34	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Contratação-Concluída; Execução-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento	24/11/2017	22/12/2017	4000	
498	Servidores de rede do Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição ago/18: parte da garantia dos servidores vence em maio, outra, em novembro/2019. Previsão do envio da documentação para contratação em agosto. Planejamento e kick-off devem ser realizados.	Não Iniciado	19/03/2018	03/07/2018			0												3875
499	(CANCELADO) Estudo para melhoria da conexão do TRT4 com internet	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0												3750
453	Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017	ADRIANO SIMIONI	***CONCLUÍDO*** Entrega do produto final realizada em 15/06/18. Mapa benefícios enviado.	Concluído	13/03/2017	30/04/2018	19/05/2017	30/07/2018	100	R\$ 1.071.124,10	R\$ 1.071.124,10	1	1	1	0,8	40,1		30/04/2018	15/06/2018	3500	

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização	
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição ago/18: criado novo ambiente (GV4). Em testes por usuários pontuais. Atualização das licenças atuais do MS já aprovada. Aquisição de novas licenças será avaliada pelo Comitê, após SETIC apresentar relatório de uso atual. Novo ultrabooks que estão sendo entregues para os magistrados (projeto 459), já estão com o GV4. GP replanejar projeto.	Em Execução	02/03/2015	12/12/2016	14/08/2015		96,27	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,5	0,96	0	0,8	72,35	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento	06/11/2017		3375	
473	Atualização da central telefônica de POA	ADRIANO SIMIONI	***PROJETO CONCLUÍDO***. Atualização da central realizada dia 22/12/2017. Produto final entregue dia 04/04/2018. Medir Benefícios dia 30/agosto (Marlene e Madison).	Concluído	01/06/2017	11/01/2018	29/06/2017	08/06/2018	100	R\$ 500.000,00	R\$ 593.000,00	1	1	1,18	1	0			19/12/2017	04/04/2018	3125
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	Posição ago/18: solução da autenticação local já validada e em uso em 3 Varas de São Leopoldo. Em programação da automação necessária para reiniciar as migrações. Previsão início 2019. GP replanejar projeto.	Em Execução	28/08/2014	08/07/2019	28/08/2014		78,72			0,75	0,83	0	0,5	233,81	Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Em andamento; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência do Projeto-Em planejamento			2750	
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue 30/04/2018. Medir benefícios (ESI definir SLA para autonomia computadores, em setembro/18).	Concluído	25/08/2014	16/11/2017	10/11/2014	15/06/2018	100	R\$ 77.900,00	R\$ 77.900,00	1	1	1	1	103,77			31/10/2017	30/04/2018	2750
500	(CANCELADO) Estudo da centralização de processamento do interior	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas se tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0												2750
501	(CANCELADO) Racks de CPD para o Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Transformar em Ação Estratégica. Contemplará apenas a aquisição de dois equipamentos, solicitados pela SETIC. SEMPRO não formalizou a demanda dos outros três racks solicitados, entendendo que podem ser adquiridos posteriormente. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0												2625
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 19/jan/18. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	07/02/2014	11/01/2018	07/02/2014	21/05/2018	100	R\$ 1.479.559,40	R\$ 1.479.559,40	1	1	1	1	4,94			19/12/2017	19/01/2018	2000
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição ago/18: Arroio Grande, nova sede prevista para final de 2018. Paulo Mendes vai realizar vistoria em Gramado (cidade deve fazer parte desse projeto). GP fazer mudança e formalizar a retirada de Lagoa Vermelha do escopo do projeto.	Em Execução	09/01/2012	31/07/2019	19/04/2012		93,53	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	1	0,95	1	0,8	257,37	Localidades 2012/1-Concluída; Localidades 2012/2-Concluída; Localidades 2013/1-Concluída; Localidades 2013/2-Concluída; Localidades 2014/01-Concluída; Localidades 2014/02-Concluída; Compra de 5 racks-Concluída; Localidades 2015/01-Em andamento; gerencia do projeto-Em andamento	01/06/2018		1375	

AÇÕES ESTRATÉGICAS APROVADAS PDTI 2018

Título	Solicitante	Unidade Organizacional	OBJETIVO / Solicitação	Observação	STATUS AGOSTO/2018	ESTIMATIVA DE TÉRMINO
ATENDIMENTO A USUÁRIOS						
Boletins informativos da SETIC	DIEGO FRAGA CONTESSA	Seção de Atendimento a Usuários	Preparar e divulgar "boletins" informativos, com pontos de fácil solução, a serem divulgados para todo o TRT, a fim de orientar os usuários sobre procedimentos simples - uso do Google Drive, troca de toner em impressoras, desbloqueio de tokens, etc. A divulgação poderia ser via VOX ("Fica Dica TI") ou outro meio, a definir.	Periodicidade de divulgação dos boletins será mensal.	Primeiro boletim informativo publicado dia 10/julho/2018. Segundo, publicado dia 03/agosto.	CONCLUÍDO em Julho/2018 Publicações sendo publicadas periodicamente
SETIC de portas abertas	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS (COORDENADOR-CJ2)	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Estabelecer uma agenda de visitas guiadas à SETIC. Os servidores e magistrados de POA poderão se inscrever para participar das visitas. Nas visitas um servidor da SETIC ficará responsável por receber e guiar os visitantes pelas diversas áreas da SETIC, os responsáveis (ou pessoas indicadas) pelas áreas recepcionarão os visitantes nas suas áreas e falarão sobre as suas atribuições e projetos.	As visitas devem ser oferecidas para magistrados e servidores de Porto Alegre para não gerar custo com deslocamentos e diárias.	Não iniciado.	
DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS						
SADM (Seção de Sistemas Administrativos)						
Implantação do sistema PROAD	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA (DIRETOR DE SECRETARIA - CJ3)	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Implantar o sistema PROAD para realizar o controle de processos administrativos, em substituição ao sistema ADMEletrônico.	Considerando não haver migração de dados do sistema legado (ADME).	Iniciado em dez/2017 e implantado na Ouvidoria. A implantar na corregedoria e na área administrativa (aguardando liberação da DG). EAD disponibilizado pela EJ. Treinamento dos usuários está sendo feito pela CIS.	Depende de definição pela DG
Integração dos sistemas e/ou serviços com o SIGEP	RUBILAR DA SILVA JARDIM	Seção de Sistemas Administrativos	Adaptar todos os sistemas/serviços/relatórios que utilizam informações dos sistema de RH e Folha de Pagamento atuais para que passem a buscar essas mesmas informações no sistema SIGEP.	A estimativa inicial foi realizada antes do mapeamento de todas integrações envolvidas. Essa integração é uma tarefa do projeto estratégico (SIGEP), coordenado pela DG/AGE.	Iniciado o levantamento em fevereiro/2018 e as adaptações em abril/2018. Envolve todas as áreas do desenvolvimento, SM e sistemas de terceiros utilizados no TRT.	Até que o sistema de RH seja desligado. Data provável março/19. OBS.: Essa é uma das ações do projeto estratégico SIGEP e está sendo controlada pela DG. Validar com a Diretora da SETIC se essa ação será controlada na SETIC também
Remoção eletrônica - simultânea e sucessiva - de Juizes Titulares	CARINE MOEHLECKE KOHMANN	Seção de Atendimento ao Magistrado	Instalar sistema eletrônico para agilizar o procedimento de remoção simultânea e sucessiva de Juizes Titulares entre as Varas do Trabalho da 4ª Região, observado o critério da antiguidade na classe.	Considerando projeto SIGEP, gerenciado pela DG, comunicar a necessidade e o impacto na reunião do projeto.	Aguardando sistema de autoatendimento da 15ª região. Módulo será incorporado no SIGEP (projeto estratégico).	Essa é uma das ações do projeto estratégico SIGEP e está sendo controlada pela DG. Validar com a Diretora da SETIC se essa ação será controlada na SETIC também
SJUD (Seção de Sistemas Judiciais)						
Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo)	Carlos da Silveira (Assistente chefe do arquivo)			Ação Estratégica criada a partir do projeto 465 (o qual foi cancelado)	Reunião com solicitante dia 11/junho, para organização das definições. Serão validadas e iniciadas conforme a possibilidade da equipe, frente às demais atividades.	Desenvolvidos 2 itens iniciais. No aguardo da conclusão de novos itens, para liberação da primeira entrega para o usuário
INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA						
Remodelagem da solução de Quiosque Digital	ANA LUCIA MOREIRA	Seção de Microinformática	Atualizar o modelo de imagem utilizada na preparação dos computadores de quiosque, que atualmente requer um modelo específico de máquina (positivo D570, computador antigo e fora da garantia), e que apresenta muitos passos manuais após a baixa de imagem propriamente dita, tornando o processo muito demorado.		SM e SST iniciaram debate para entender a necessidade e as possíveis alternativas.	Sem previsão
Estudo da centralização de processamento do interior			Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 500 (o qual foi cancelado)	Não iniciado.	
Estudo para adoção de HSM para armazenamento de certificados digitais			Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 496 (o qual foi cancelado)	Está na fase inicial dos estudos (Paulo Mendes).	
Estudo para melhoria da conexão do TRT4 com internet			Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 499 (o qual foi cancelado)	Gustavo iniciará estudos após as atividades do projeto 493 - Otimizadores WAN 2018.	
Racks de CPD para o Interior - 2018			Inicialmente contemplará apenas a aquisição de dois equipamentos, solicitados pela SETIC. Caso a SEMPRO formalize a necessidade de mais racks novos, será tratado posteriormente.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 501 (o qual foi cancelado)	Pregão previsto para 16/agosto (registro de preço de 5 racks, com compra imediata de 2)	
