


# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

## PROJETOS DA SETIC PDTI 2018-2019

Data: Dezembro/2018 v2.0

### 1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria

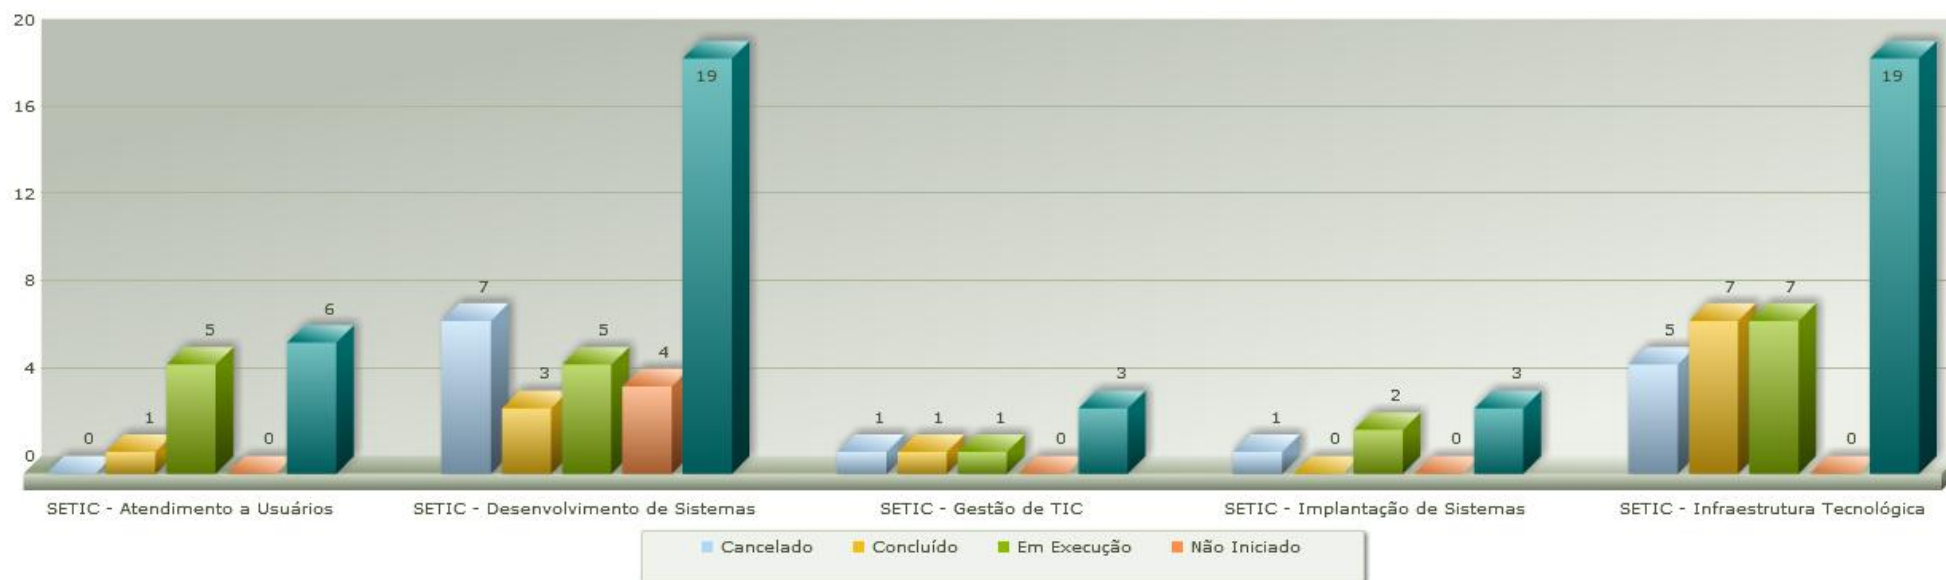


### Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p><b>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo</b></p> <p>Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}</math></p>	<p><b>IEP - Indicador de Execução do Projeto</b></p> <p>Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}</math></p>
<p><b>IDC - Indicador de Desempenho do Custo</b></p> <p>Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}</math></p>	<p><b>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia</b></p> <p>Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}</math></p>
<p><b>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento</b></p> <p>Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IPR = \left( \frac{\text{Duração Real do Projeto}}{\text{Duração da Primeira Linha de Base}} - 1 \right) * 100</math></p>	


ATENDIMENTO A USUÁRIOS  
Andamento dos projetos - últimos 3 meses

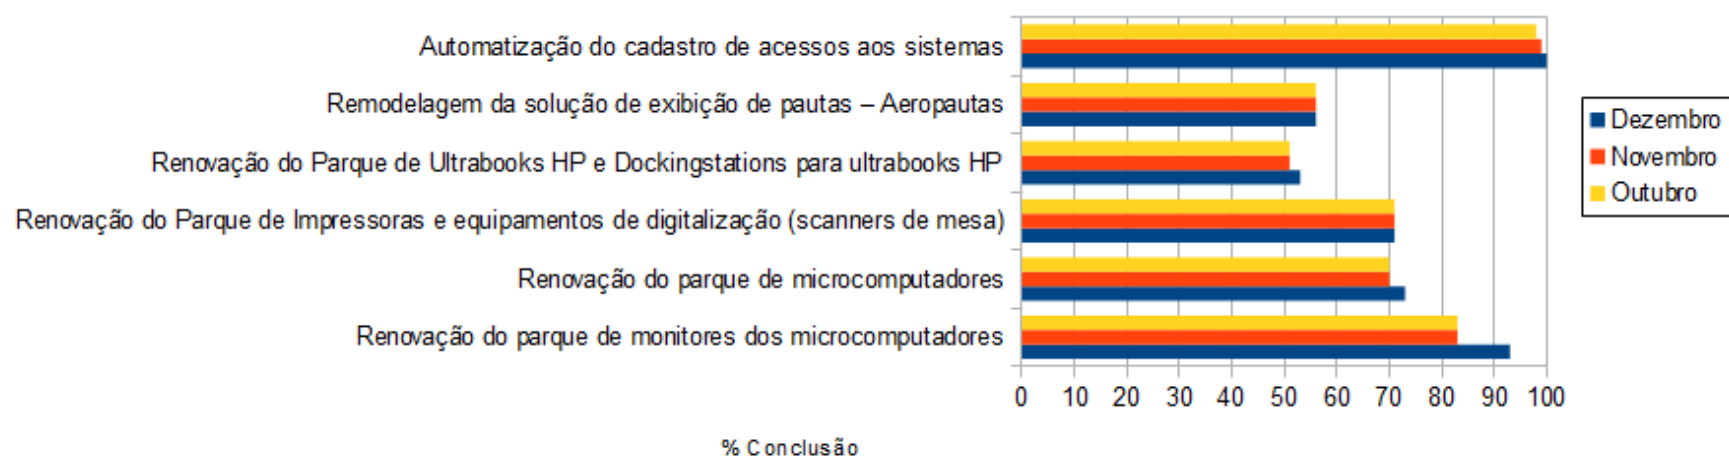

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
476	Renovação do parque de monitores dos microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/18: instalados os 2000 monitores comprados em 2017. Todos os 1984 monitores referente a segunda parte da compra foram recebidos. Instalações sendo executadas (em conjunto com os microcomputadores do projeto 479). Mudança enviada, com nova previsão de término em 28/fev/2019. GP encaminhará nova mudança apenas para registrar a nova qtd de monitores (no plano ainda consta a antiga).	Em Execução	03/07/2017	19/03/2019	03/07/2017		92,53	R\$ 5.040.160,00	R\$ 0,00	1	0,99	0	1	62,7	Plano de Projeto Aprovado (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Concluída; Equipamentos recebidos no TRT (MARCO)-Concluída; Distribuição de software (MARCO)-Concluída; Instalação dos equipamentos para os usuários (MARCO)-Em andamento	28/02/2019		4750
479	Renovação do parque de microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/18: todos os micros foram recebidos (1750 no total). Instalações iniciadas. Mudança enviada, com nova previsão de término em 28/fev/2019.	Em Execução	16/03/2018	26/03/2019	10/04/2018		73,05	R\$ 5.679.100,00	R\$ 0,00	1	0,99	0	1	23,97	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Concluída; Computadores recebidos no TRT4 (MARCO)-Concluída; Instalação dos computadores desktop (MARCO)-Em andamento	28/02/2019		4750
460	Renovação do parque de impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/18: já instaladas as 518 impressoras. Scanners foram adquiridos e entregues em final de dezembro/2018. GP fazer mudança com o planejamento das instalações e com o novo nro de scanners (passou de 30 para 20). PA 5369-46.	Em Execução	01/06/2017	19/12/2018	26/06/2017		70,84	R\$ 1.283.172,11	R\$ 0,00	0,54	0,7	0	0,8	56,59	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Em andamento; Documentação técnica das impressoras para licitação elaborada (MARCO)-Concluída; Documentação técnica dos escâneres para licitação elaborada (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de impressoras (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de escâneres (MARCO)-Em andamento; Impressoras recebidas no TRT4 (MARCO)-Concluída; Escâneres recebidos no TRT4 (MARCO)-Designada; Instalação das impressoras (MARCO)-Concluída; Instalação dos escâneres (MARCO)-Designada	14/05/2018		4500

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
459	Renovação do Parque de Ultrabooks	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/18: TRT4 participe da licitação nacional (TRT2). Realizada a compra de 333 + 8 notebooks, todos recebidos. Entrega iniciada em julho (entregue até o momento aprox 63% do total). GP fazer gestão de mudança justificando novo prazo (conforme email Dr Cassou sobre data limite da retirada) e excluindo do escopo o reaproveitamento dos notes dos assistentes.	Em Execução	01/06/2017	14/01/2019	26/06/2017		52,63	R\$ 1.577.125,00	R\$ 0,00	0,66	0,52	0	0,8	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Contratação-Concluída; Elaborar documentação técnica dos notebooks e docking stations para licitação (MARCO)-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Concluída; Equipamentos recebidos no TRT4 (MARCO)-Concluída; Equipamentos patrimoniados (MARCO)-Concluída; Entrega dos equipamentos adquiridos aos usuários (MARCO)-Em andamento; Preparação e entrega dos Ultrabooks HP 840 aos assistentes dos magistrados (MARCO)-Em andamento; Preparação e entrega do Notebooks HP Elitebook 8460 para as unidades judiciárias (MARCO)-Designada	14/01/2019		4250
480	Remodelagem da solução de exibição de pautas - Aeropautas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição dez/18: Escopo inicial contemplava o estudo da solução. Aprovado em 31/agosto/18 pelo Comitê de Governança a compra da solução (aprovada proposta 2, que contempla 112 Televisores de R\$1800,00 cada + 115 placas raspberry Pi, de R\$440,00 cada). DOD e análise de viabilidade aguardando encaminhamento na CGTIC (compra será em 2019). GP replanejar projeto.	Em Execução	15/05/2018	04/09/2018	28/05/2018		56,25			0,8	0,56	0	0,8	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Estudo de mercado e soluções para o Aeropauta (MARCO)-Concluída; Relatório com as descrições das soluções identificadas (MARCO)-Concluída; Parecer do comitê de governança de TIC (MARCO)-Concluída	13/08/2018		3500
438	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	EVERTON RAFAEL POLINA	*** PROJETO CONCLUÍDO *** Sistemas administrativos e o PJe foram retirados do escopo. Integração realizada com INFOR e NovaJus4. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	24/03/2017	05/11/2018	03/04/2017	19/11/2018	100			1	1	0	1	351,16		17/10/2018	03/10/2018	2250

## DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

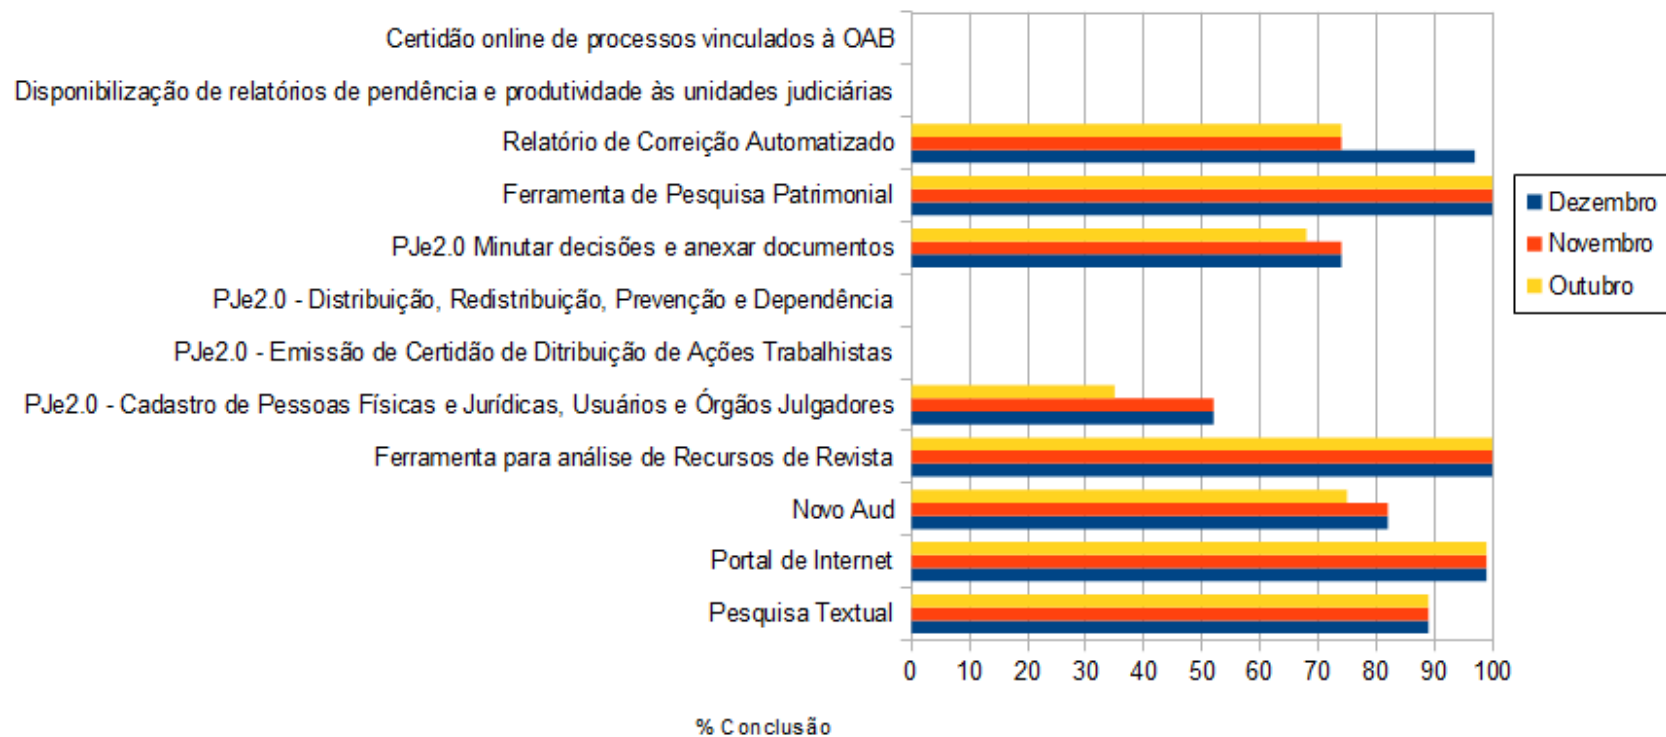


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
457	Pesquisa Textual	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição dez/18: dia 29/maio/18 a pesquisa de acórdãos ampla entrou em produção para o público externo. Itens pendentes: dissídios coletivos; biblioteca virtual; consulta de despachos da Corregedoria e pesquisa no portal de internet. O projeto está parado, sem data para retomada. No momento, recurso trabalhando no projeto Novo Aud (475).	Em Execução	20/03/2017	13/07/2018	20/03/2017		89,1			0,55	0,89	0	1	74,57	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Estudo preliminar-Concluída; Entrega - Pesquisa em Atos normativos (internet)-Concluída; Entrega 1a. etapa HOMOLOGAÇÃO INTERNA - Pesq. de ac. ampla-Concluída; Publicação da Pesquisa ampla na internet-Concluída; Pesquisas complementares-Em planejamento; Entrega 2a. etapa - Pesquisas complementares-Em planejamento; Finalização-Em planejamento	16/04/2018		5500
458	Portal de Internet	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição dez/18: pendente a liberação das súmulas. Projeto parado. No momento, recurso trabalhando no desenvolvimento do novo VOX.	Em Execução	20/03/2017	02/07/2018	20/03/2017		99,09			0,57	0,99	0	1	175,22	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definir escopo do produto-Concluída; Programação Portal - parte 1-Concluída; Lançamento do Portal ao público externo-Concluída; Programação Portal - parte 2-Em andamento; Finalização-Em planejamento	30/04/2018		5000
475	Novo Aud	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Posição dez/18: Entrega1 (MVP) e 2 (disponibilização de textos padronizados) realizadas. Última entrega (manutenção de autotextos, salvamento remoto e correção ortográfica) estava prevista para 10/jan e será reprogramada. Disponibilização para o CSJT prevista para 18/03/19, a ser replanejada. Houve afastamento de integrante da equipe (líder técnico/desenvolvedor), devido a licença saúde. Consequências minimizadas por meio de acréscimo de novo integrante no projeto.	Em Execução	02/10/2017	09/04/2019	02/10/2017		82,11			0,57	0,84	0	1	3,55	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Levantamento de requisitos-Concluída; Entrega 1 - Mínimo Produto Viável (MVP)-Concluída; Homologação parcial pelo grupo de negócios nacional-Em andamento; Entrega 2 - Disponibilização de textos padronizados (autotextos) e envio dos dados ao PJe-Concluída; Homologação parcial pelo grupo de negócios nacional-Em planejamento; Entrega 3 - Manutenção de autotextos, salvamento remoto e correção ortográfica-Em andamento; IMPLANTAR-Designada; Manual de Implantação-Em planejamento; Treinamento SAU-Em planejamento; Homologação pelo grupo de negócios nacional-Em planejamento; Homologação em Unidades Piloto da 4ª Região-Em planejamento; Disponibilização do sistema para o CSJT-Em planejamento; Documentação do projeto-Designada	18/03/2019		4750
477	Ferramenta para análise de Recursos de Revista	TIAGO GOMES SANTOS	*** CONCLUÍDO *** (produto final entregue em 13/04/2018). Mapa de benefícios enviado.	Concluído	22/09/2017	17/04/2018	22/09/2017	27/04/2018	100			1	1	0	1	0,81		13/04/2018	13/04/2018	4750

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização	
485	(CANCELADO) PJe2.0 - Módulo de Cadastro de Pessoas Jurídicas e Entes Públicos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	MOTIVO CANCELAMENTO: O escopo desse projeto foi incorporado ao 486 - PJe Cadastro de pessoas físicas e jurídicas, usuários e órgãos julgadores. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.	Cancelado	16/03/2018	17/04/2018			0					0							4625
502	(CANCELADO) PJe2.0 - Módulo de Cadastro de Órgão Julgador (OJ)	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	MOTIVO DO CANCELAMENTO: O escopo deste projeto será atendido junto com o escopo do 486 (PJe2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas, Usuários e Órgão Julgador). Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (reunião 04/maio/2018).	Cancelado	23/03/2018	24/04/2018			0					0							4625
486	PJe2.0 - Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas, Usuários e Órgãos Julgadores	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição dez/2018: contempla escopo do 485 (pessoas jurídicas e entes públicos). Em finalização da entrega 1 (cadastro de pessoa física e usuários internos) e em andamento entrega 2 (cadastro de usuários externos) e entrega 3 (cadastro de PJ, órgão de representação e unificação). Atraso na primeira entrega devido a criação de codificação padrão para o módulo, o que por outro lado, vai facilitar as próximas entregas, sem impacto na data final do projeto.	Em Execução	11/04/2018	02/04/2019	16/04/2018		51,6			0,5	0,65	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Designada; Definir escopo do produto-Concluída; Entrega 1: Cadastro de pessoa física e usuários internos-Em andamento; Entrega 2: Cadastro de usuários externos-Em andamento; Entrega 3: Cadastro de PJ, Órgão de Representação e Unificação-Em andamento; Entrega 4: Cadastro de Órgão Julgador e Órgão Julgador Colegiado-Designada	22/03/2019			4375
487	PJe2.0 - Emissão de Certidão de Distribuição de Ações Trabalhistas	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Não iniciado. CSJT espera receber os fontes com esse desenvolvimento por parte do TRT4, até dia 13/set/19 (para a versão 2.5 do PJe).	Não Iniciado					0					0							4375
489	PJe2.0 - Distribuição, Redistribuição, Prevenção e Dependência	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Não iniciado. CSJT espera receber os fontes com esse desenvolvimento por parte do TRT4, até dia 13/set/19 (para a versão 2.5 do PJe).	Não Iniciado					0					0							4375
488	PJe2.0 Minutar decisões e anexar documentos	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição dez/18: Alterado nome do projeto de "Pje 2.0 - Componente para edição de textos" para "Pje 2.0 Minutar decisões e anexar documentos". Realizada entrega 1 (componente para edição de textos) e entrega 2 (componente para edição de textos customizado). Em andamento entrega 3 (minutar/revisar decisão), prevista para 01/fev/19.	Em Execução	09/04/2018	21/02/2019	09/04/2018		73,9			0,75	0,81	0	1	2,45	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Designada; Definir escopo do produto-Em andamento; Entrega 1: Componente para edição de textos-Concluída; Entrega 2: Componente para edição de textos customizado-Concluída; Entrega 3: Minutar/revisar decisão-Em andamento	08/02/2019			4250
463	(CANCELADO) Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF)	MARCIO BYSTRONSKI	MOTIVO CANCELAMENTO: Grandes demandas atuais da SETIC e confirmação que o sistema SIGEO-JT providenciará o envio das informações da EFD-REINF. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.	Cancelado	10/04/2017	28/04/2017			0					0							4000
474	Ferramenta de Pesquisa Patrimonial	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	***CONCLUÍDO*** Liberado para uso em produção, para as unidades piloto, em 13/dez/18. Entrega do produto final realizada dia 04/abril/18. Benefícios sendo medidos (contato Romy AGE).	Concluído	14/08/2017	04/04/2018	14/08/2017	21/05/2018	100			1	1	0	1	71,95		04/04/2018	04/04/2018		3625
482	Relatório de Correição Automatizado	TIAGO GOMES SANTOS	***CONCLUÍDO***. Última entrega realizada dia 19/dez/2018. Necessário realizar reunião de Aceite.	Concluído	07/02/2017	19/12/2018	06/12/2016		97,1			0,66	0,97	0	0,75	1,6		19/12/2018	19/12/2018		3500






GESTÃO DE TIC  
Andamento dos projetos - últimos 3 meses

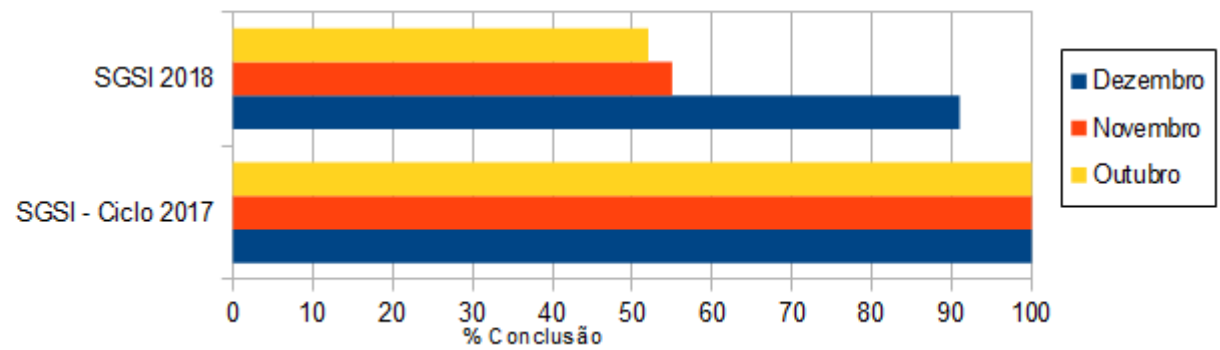


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
452	SGSI - Ciclo 2017	LUCAS POZATTI	PROJETO CONCLUÍDO. Produto final entregue em 23/04/2018. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	01/03/2017	16/05/2018	01/03/2017	10/05/2018	100			1	1	0	1	7,66		30/04/2018	23/04/2018	3250
503	SGSI 2018	LUCAS POZATTI	Posição dez/18: concluída a análise e avaliação de riscos, a declaração de aplicabilidade e a fase de Plano de Tratamento de Riscos. Em definição dos indicadores e metas para 2019.	Em Execução	18/06/2018	22/03/2019	18/06/2018		91,03			1	1,01	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Formalização do Escopo do SGSI-Concluída; Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos -Concluída; Declaração de Aplicabilidade-Concluída; Análise e Avaliação de Riscos-Concluída; Plano de Tratamento de Riscos-Concluída; Indicadores SGSI-Em andamento; Análise Crítica do SGSI-Em planejamento	15/03/2019		2875
490	(CANCELADO) Estudo de ferramentas gratuitas para Avaliação de Segurança do Ambiente Tecnológico	LUCAS POZATTI	MOTIVO CANCELAMENTO: Devido à característica do resultado do novo escopo do projeto, o estudo será feito como atividade da equipe, sem necessidade de projeto específico. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.	Cancelado	19/01/2018	11/12/2018	19/01/2018		100					0				11/12/2018		2625

### IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

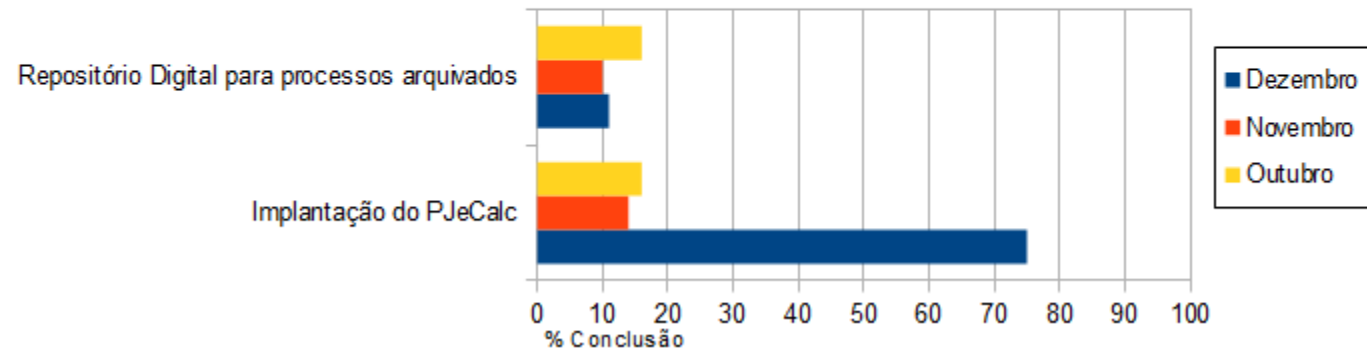

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
491	Implantação do PJeCalc	PABLO PAULO LOPES BARROS	Posição dez/18: sistema instalado em produção. Kickoff realizado em 04/out. Plano de projeto em ajustes, para envio. GP validar e registrar no Plano se realmente a utilização do PJeCalc será obrigatória a partir de março/2019, com a versão 2.4 do Pje (implantação em todas as VTs deve acontecer antes da obrigatoriedade). Em realização a capacitação para magistrados, servidores, peritos e advogados.	Em Execução	14/02/2018	14/12/2018	19/02/2018		74,92			0	0,74	0		0	Planejamento-Em andamento; Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Em andamento; Encerramento do projeto-Em andamento; Eventos de capacitação para magistrados e servidores-Em andamento; Evento de capacitação para peritos-Em andamento; Disponibilização do PJe-CALC corporativo-Em andamento; Disponibilização do PJe-CALC CIDADÃO-Em andamento; Divulgação de notícias sobre o PJe-CALC-Em andamento			4750
470	(CANCELADO) Automação de testes do PJe	PABLO PAULO LOPES BARROS	MOTIVO CANCELAMENTO: CSJT iniciou projeto nacional similar (projeto de testes). Acompanhar as atividades do projeto nacional como ação estratégica.CANCELAMENTO aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.	Cancelado	12/06/2017	16/11/2017	16/06/2017		100					0				30/11/2017		3625
484	Repositório Digital para processos arquivados	PABLO PAULO LOPES BARROS	Posição dez/18: Treinamento da ferramenta ATOM realizado início de agosto. Kick-off realizado dia 24/set, GP enviar Plano de Projeto (em ajustes quanto ao responsável técnico pelo sistema e a possibilidade do uso de consultoria para a importação dos processos).	Em Execução	24/01/2017	08/07/2019	21/09/2018		11,48			0,5	0,19	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Em andamento; Encerramento do projeto-Em planejamento; Treinamento sobre o sistema AtOM-Concluída; Instalação da infraestrutura do sistema AtOM-Concluída; Cadastramento manual de processos no AtOM-Em andamento; Importação de processos eletrônicos do PJe para o AtOM-Em andamento			3250

## INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA Andamento dos projetos - últimos 3 meses

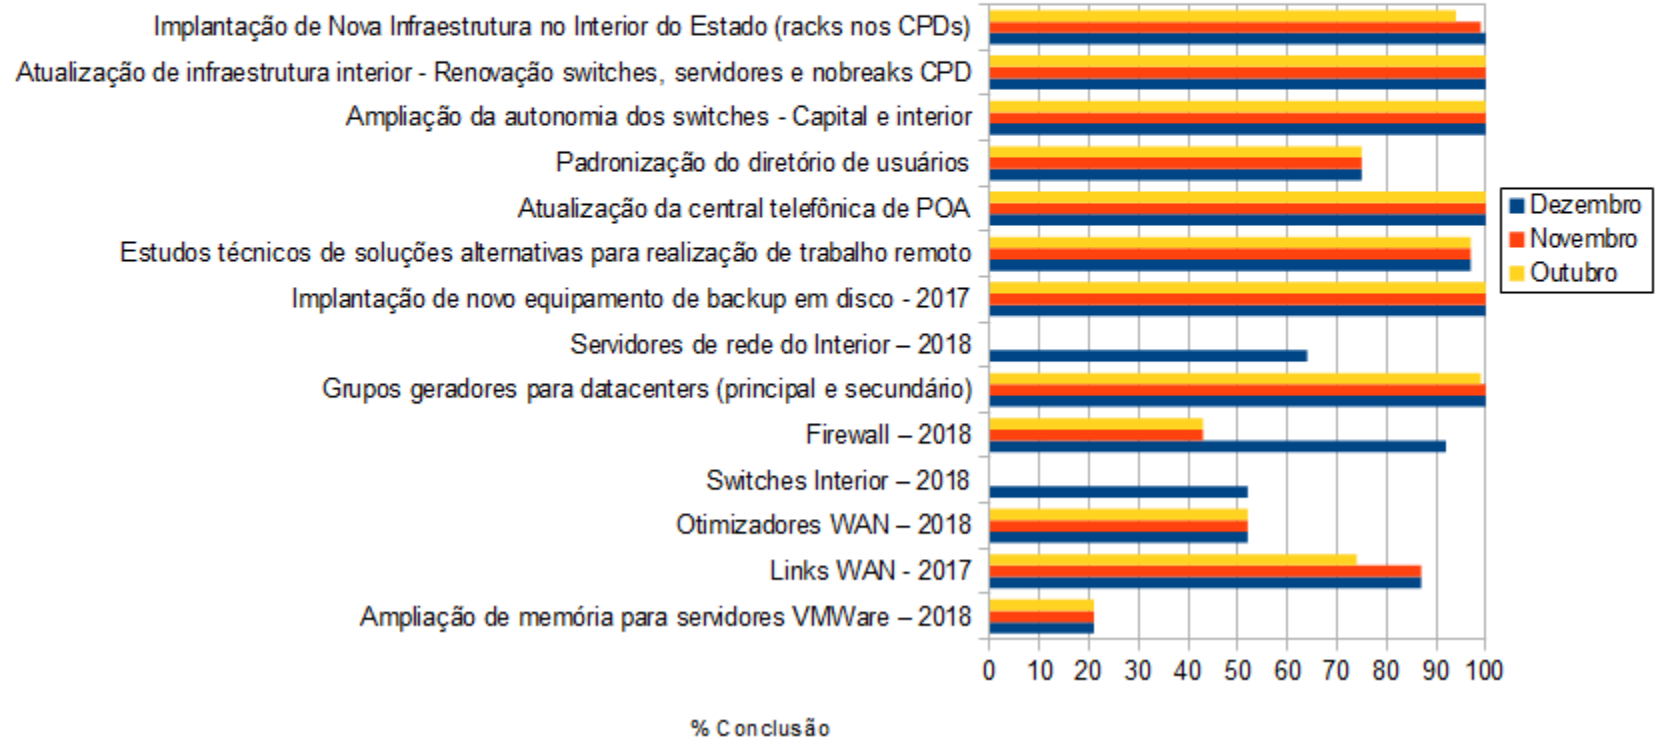

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização
492	Ampliação de memória para servidores VMWare - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/18: realizada a realocação das memórias atual, pela equipe da SETIC. Quanto à aquisição, pregão planejado para ser realizado dia 22/jan.	Em Execução	19/03/2018	19/12/2018	22/06/2018		21,43	R\$ 392.000,00	R\$ 0,00	0,14	0,21	0	0,5	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Estudo técnico dos equipamentos RT30-Em planejamento; Especificação técnica detalhada-Designada; Contratação-Em andamento; Execução-Em planejamento; Aplicação em produção-Em planejamento	12/12/2018		5000
454	Links WAN - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/18: Fornecedor (Claro) tinha prazo de 23/07 para conclusão, com mais 90 dias até inexecução. Todos links instalados (dia 05/dez/18, dado recebimento provisório). Em avaliação do serviço para aceite definitivo.	Em Execução	10/01/2017	21/09/2018	09/03/2017		86,62	R\$ 2.033.643,48	R\$ 0,00	0,57	0,86	0	0,8	86,57	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Concluída; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em andamento; Homologação-Concluída; Transição para a Produção-Em planejamento	14/09/2018		4750
493	Otimizadores WAN - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/18: Projeto com alto risco. Garantia venceu em 28/11. 80% da maior parte dos otimizadores foi entregue e pago em 2018. Prazo contratual para finalização das instalações é 05/fev, com possibilidade de atraso devido a problemas na importação.	Em Execução	19/03/2018	11/02/2019	03/05/2018		52,16	R\$ 2.857.295,48	R\$ 1.686.296,65	1	0,73	0	1	14,51	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Concluída; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em andamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	05/02/2019		4750
494	Switches Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/18: Adesão à ata do TRT8. Em instalação dos equipamentos. Previsão de conclusão até 12/04.	Em Execução	19/03/2018	09/05/2019	18/09/2018		52,49	R\$ 1.777.160,00	R\$ 0,00	0,75	1,03	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Em andamento; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Concluída; Documentação TRT08-Concluída; Recebimento Provisório-Concluída; Recebimento Definitivo-Em andamento; Transição para a Produção-Em andamento	12/04/2019		4750
495	Firewall - 2018	ADRIANO SIMIONI	***CONCLUÍDO*** Realizada adesão à Ata de Registro de Preços do TRT12. Projeto concluído em 18/dez/2018. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	19/03/2018	18/12/2018	11/05/2018		92,03	R\$ 1.000.000,00	R\$ 767.000,00	0,66	0,92	0,76	1	0		18/12/2018	18/12/2018	4750
496	(CANCELADO) Estudo para adoção de HSM para armazenamento de certificados digitais	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0					0						4375
497	(CANCELADO) Reparo e manutenção do anel de fibras ópticas	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Devido às características do projeto, passar para Ação Estratégica. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0					0						4375
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	***CONCLUÍDO*** Geradores instalados e funcionando, em 22/dez/2017. Conclusão da instalação dos itens de segurança em 04/07/2018. Mapa benefícios enviado.	Concluído	01/06/2015	19/12/2017	01/06/2015	24/08/2018	100	R\$ 797.085,61	R\$ 680.000,00	1	1	0,85	1	240,34		24/11/2017	04/07/2018	4000

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega produto final Prevista	Entrega produto final Realizada	Priorização	
498	Servidores de rede do Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/18: parte da garantia dos servidores vence em maio, outra, em novembro/2019. PA 7740-48/2018. Previsão para recebimento dos equipamentos até 09/abril. Avaliar replanejamento do projeto caso ocorra o recebimento em separado para os servidores que vencem em nov/19.	Em Execução	19/03/2018	04/07/2019	26/06/2018		64,14	R\$ 2.162.000,00	R\$ 0,00	1	0,97	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Especificação-Concluída; Pesquisa-Concluída; Implantação-Em planejamento	11/06/2019		3875	
499	(CANCELADO) Estudo para melhoria da conexão do TRT4 com internet	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas se o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0					0							3750
453	Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017	ADRIANO SIMIONI	***CONCLUÍDO*** Entrega do produto final realizada em 15/06/18. Mapa benefícios enviado.	Concluído	13/03/2017	30/04/2018	19/05/2017	30/07/2018	100	R\$ 1.071.124,10	R\$ 1.071.124,10	1	1	1	0,8	40,1		30/04/2018	15/06/2018	3500	
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição dez/18: criado novo ambiente (GV4). Novos ultrabooks que estão sendo entregues para os magistrados (projeto 459), já estão com o GV4. Projeto foi replanejado em relação ao prazo e custo (houve a necessidade de compra de 678 licenças de Microsoft RDS-registro de preço). Determinado pelo Comitê Gestor de TIC que até fev/19 todos os usuários devem estar no GV4.	Em Execução	02/03/2015	30/04/2019	14/08/2015		97,15	R\$ 231.549,06	R\$ 0,00	1	1,01	0	1	298,78	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento	22/04/2019		3375	
473	Atualização da central telefônica de POA	ADRIANO SIMIONI	***PROJETO CONCLUÍDO***. Atualização da central realizada dia 22/12/2017. Produto final entregue dia 04/04/2018. Medir Benefícios dia 30/agosto (Marlene e Madison).	Concluído	01/06/2017	11/01/2018	29/06/2017	08/06/2018	100	R\$ 500.000,00	R\$ 593.000,00	1	1	1,18	1	0		19/12/2017	04/04/2018	3125	
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	Posição dez/18: cada Vara ou CCDF é considerada 1 unidade. Realizada a migração de 28 unidades (em 15 cidades) de um total de 136 unidades.	Em Execução	28/08/2014	18/12/2018	28/08/2014		75,35			0,66	0,75	0	1	195,62	Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Concluída; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência do Projeto-Em andamento	10/12/2018		2750	
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue 30/04/2018. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	25/08/2014	16/11/2017	10/11/2014	15/06/2018	100	R\$ 77.900,00	R\$ 77.900,00	1	1	1	1	103,77		31/10/2017	30/04/2018	2750	
500	(CANCELADO) Estudo da centralização de processamento do interior	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas se tiver prosseguimento. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0					0							2750
501	(CANCELADO) Racks de CPD para o Interior - 2018	ADRIANO SIMIONI	MOTIVO DO CANCELAMENTO: Transformar em Ação Estratégica. Contemplará apenas a aquisição de dois equipamentos, solicitados pela SETIC. SEMPRO não formalizou a demanda dos outros três racks solicitados, entendendo que podem ser adquiridos posteriormente. Aprovado pelo Comitê de Governança de TIC (04/maio/2018).	Cancelado	19/03/2018	03/07/2018			0					0							2625
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	***PROJETO CONCLUÍDO*** Produto final entregue em 19/jan/18. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	07/02/2014	11/01/2018	07/02/2014	21/05/2018	100	R\$ 1.479.559,40	R\$ 1.479.559,40	1	1	1	1	4,94		19/12/2017	19/01/2018	2000	
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	***PROJETO CONCLUÍDO*** Racks instalados em 68 localidades. Ficaram fora do escopo: Arroio Grande, Gramado e Lagoa Vermelha, que serão tratados posteriormente. Mapa de benefícios enviado.	Concluído	09/01/2012	31/07/2019	19/04/2012	19/11/2018	100	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	1,28	1	1	1	257,37		31/07/2019	06/11/2018	1375	



**AÇÕES ESTRATÉGICAS APROVADAS PDTI 2018**

ID	Título	Solicitante	Unidade Organizacional	OBJETIVO / Solicitação	Observação	STATUS DEZEMBRO/2018	ESTIMATIVA DE TÉRMINO
<b>ATENDIMENTO A USUÁRIOS</b>							
01/ 2018	Boletins informativos da SETIC	DIEGO FRAGA CONTESSA	Seção de Atendimento a Usuários	Preparar e divulgar "boletins" informativos, com pontos de fácil solução, a serem divulgados para todo o TRT, a fim de orientar os usuários sobre procedimentos simples - uso do Google Drive, troca de toner em impressoras, desbloqueio de tokens, etc. A divulgação poderia ser via VOX ("Fica Dica TI") ou outro meio, a definir.	Periodicidade de divulgação dos boletins será mensal.	Primeiro boletim informativo publicado dia 10/julho/2018. Segundo, publicado dia 03/agosto.	CONCLUÍDA em Julho/2018  Publicações sendo publicadas periodicamente.  Benefícios: -Maior agilidade e autonomia para solução de questões simples e rotineiras, que possam ser resolvidas pelo próprio usuário, a partir das orientações divulgadas nos Boletins Informativos. -Provável diminuição de abertura de chamados para a SETIC, referente a essas questões divulgadas.
02/ 2018	SETIC de portas abertas	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS	Coordenadoria de Atendimento a Usuários	Estabelecer uma agenda de visitas guiadas à SETIC. Os servidores e magistrados de POA poderão se inscrever para participar das visitas. Nas visitas um servidor da SETIC ficará responsável por receber e guiar os visitantes pelas diversas áreas da SETIC, os responsáveis (ou pessoas indicadas) pelas áreas recepcionarão os visitantes nas suas áreas e falarão sobre as suas atribuições e projetos.	As visitas devem ser oferecidas para magistrados e servidores de Porto Alegre para não gerar custo com deslocamentos e diárias.	Previsão de início no primeiro semestre/2019.	
<b>DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS</b>							
<b>SADM (Seção de Sistemas Administrativos)</b>							
03/ 2018	Integração dos sistemas e/ou serviços com o SIGEP	RUBILAR DA SILVA JARDIM	Seção de Sistemas Administrativos	Adaptar todos os sistemas/serviços/relatórios que utilizam informações dos sistema de RH e Folha de Pagamento atuais para que passem a buscar essas mesmas informações no sistema SIGEP.	Iniciado o levantamento em fevereiro/2018 e as adaptações em abril/2018. Envolve todas as áreas do desenvolvimento, SM e sistemas de terceiros utilizados no TRT. Integrações devem estar concluídas até que o sistema de RH seja desligado (data provável março/19).	Essa ação está sendo acompanhada pelo projeto estratégico SIGEP, o qual está sendo gerenciado pela Direção Geral. Não será mais acompanhada de forma individual pela SETIC.	CANCELADA. Motivo: Essa é uma das ações do projeto estratégico SIGEP e está sendo controlada pela DG. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.
04/ 2018	Remoção eletrônica - simultânea e sucessiva - de Juizes Titulares	CARINE MOEHLECKE KOHMANN	Seção de Atendimento ao Magistrado	Instalar sistema eletrônico para agilizar o procedimento de remoção simultânea e sucessiva de Juizes Titulares entre as Varas do Trabalho da 4ª Região, observado o critério da antiguidade na classe.	Consta em atas do projeto SIGEP (05/fev/2018 e 19/fev/2018) que a instalação do sistema eletrônico de remoção deve ser suspensa, a fim de aguardar o sistema de autoatendimento da 15ª região, o qual conterá essa funcionalidade.	Essa ação está sendo acompanhada pelo projeto estratégico SIGEP, o qual está sendo gerenciado pela Direção Geral. Não será mais acompanhada de forma individual pela SETIC.	CANCELADA. Motivo: Aguardando sistema de autoatendimento da 15ª região, que será incorporado no SIGEP (projeto estratégico). Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.
<b>SJUD (Seção de Sistemas Judiciais)</b>							
05/ 2018	Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo)	CARLOS DA SILVEIRA	Seção de Conservação e Consulta de Documentos Judiciais	Alterações no sistema infor utilizado pelo arquivo	Ação Estratégica criada a partir do projeto 465 (o qual foi cancelado)	Reunião com solicitante dia 11/junho, para organização das definições. Assyst R90655 (InforArquivo Cargas Múltiplas): 1)Incluir um checkbox chamado "Manter dados", no final da tela de Carga/Consulta de Processo Arquivado e 2)Incluir a opção "terceiro interessado" no campo parte, nas cargas de advogado. Assyst R93660 (InforArquivo Devolução de várias cargas ao mesmo tempo): 3) Alterar a tela de Carga/Consulta atual, de forma que seja possível devolver processos múltiplos.	CONCLUÍDA em dez/2018.  Em produção a implementação dos três itens acordados.  Benefícios: -Agilidade em rotinas repetitivas; -Diminuição do trabalho; -Diminuição de erros de digitação, por reutilização dos dados; -Fidelidade nos registros.
<b>IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS</b>							
06/ 2018	Implantação do sistema PROAD	NATACHA MORAES DE OLIVEIRA	Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações	Implantar o sistema PROAD para realizar o controle de processos administrativos, em substituição ao sistema ADMEletrônico.	Considerando não haver migração de dados do sistema legado (ADME).	Iniciado em dez/2017 e implantado na Ouvidoria (processos encaminhados a partir dessa área já tramitam via PROAD para áreas específicas do TRT4). Demais processos administrativos serão implantados em 2019, conforme liberação da DG. EAD disponibilizado pela EJ. Treinamento dos usuários está sendo feito pela CIS. Integração com o SIGEP liberada e homologada pela CIS.	Depende de definição pela DG
<b>INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA</b>							
07/ 2018	Remodelagem da solução de Quiosque Digital	ANA LUCIA MOREIRA	Seção de Microinformática	Atualizar o modelo de imagem utilizada na preparação dos computadores de quiosque, que atualmente requer um modelo específico de máquina (positivo D570, computador antigo e fora da garantia), e que apresenta muitos passos manuais após a baixa de imagem propriamente dita, tornando o processo muito demorado.		SM e SST iniciaram debate para entender a necessidade e as possíveis alternativas. Natacha sugeriu consultar empresas terceirizadas para proporem solução. Máquinas atuais possuem apenas versão 1.6.1 do Portable.	Sem previsão
08/ 2018	Estudo da centralização de processamento do interior			Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 500 (o qual foi cancelado)	Não iniciado. Natacha informou que não há problemas com licenças oracle.	
09/ 2018	Estudo para adoção de HSM para armazenamento de certificados digitais			Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 496 (o qual foi cancelado)	Suspender, pois há estudos para que o PJe não utilize mais certificado.	CANCELADA. Motivo: Estão sendo realizados estudos para que o PJe não utilize mais certificado. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.

**AÇÕES ESTRATÉGICAS APROVADAS PDTI 2018**

ID	Título	Solicitante	Unidade Organizacional	OBJETIVO / Solicitação	Observação	STATUS DEZEMBRO/2018	ESTIMATIVA DE TÉRMINO
<b>INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA</b>							
<b>10/2018</b>	Estudo para melhoria da conexão do TRT4 com internet			Tratar a fase de estudos dessa iniciativa como ação estratégica. Criar novamente projeto apenas ser o estudo for aprovado e sua implementação tiver prosseguimento.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 499 (o qual foi cancelado)	Gustavo começaria estudos após as atividades do projeto 493 - Otimizadores WAN 2018.	CANCELADA. Motivo: Estudos sendo realizados como tarefa rotineira da equipe e após resultados será proposta projeto. Cancelamento aprovado pelo Comitê de Governança de TIC, conforme ata de reunião do dia 30/novembro/2018.
<b>11/2018</b>	Racks de CPD para o Interior - 2018			Inicialmente contemplará apenas a aquisição de dois equipamentos, solicitados pela SETIC. Caso a SEMPRO formalize a necessidade de mais racks novos, será tratado posteriormente.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 501 (o qual foi cancelado)	Registro de preço de 5 racks, com compra imediata de 2. Pregão realizado, mas sem vencedor, deve ser refeito.	
<b>12/2018</b>	Reparo e manutenção do anel de fibras ópticas			Durante a construção do prédio garagem ao lado do TRT4, houve rompimento de um cabo com diversas fibras ópticas, as quais permitem a redundância da comunicação entre os dois CPD's. O objetivo dessa ação é realizar/encaminhar o reparo e manutenção desse anel de fibras ópticas, garantindo a redundância na comunicação entre os data centers.	Ação Estratégica criada a partir do projeto 497 (o qual foi cancelado)	Trâmite do PA entre SETIC/Presidência determinou que a SETIC avalie a possibilidade de contratar laudo pericial que aponte o local exato e a extensão dos danos, bem como levantar o custo para solução. PA 1973-61/2017.	
