




RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PROJETOS DA SETIC PDTI 2015

Data: 15/Fevereiro/2016
v 1.0


1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria

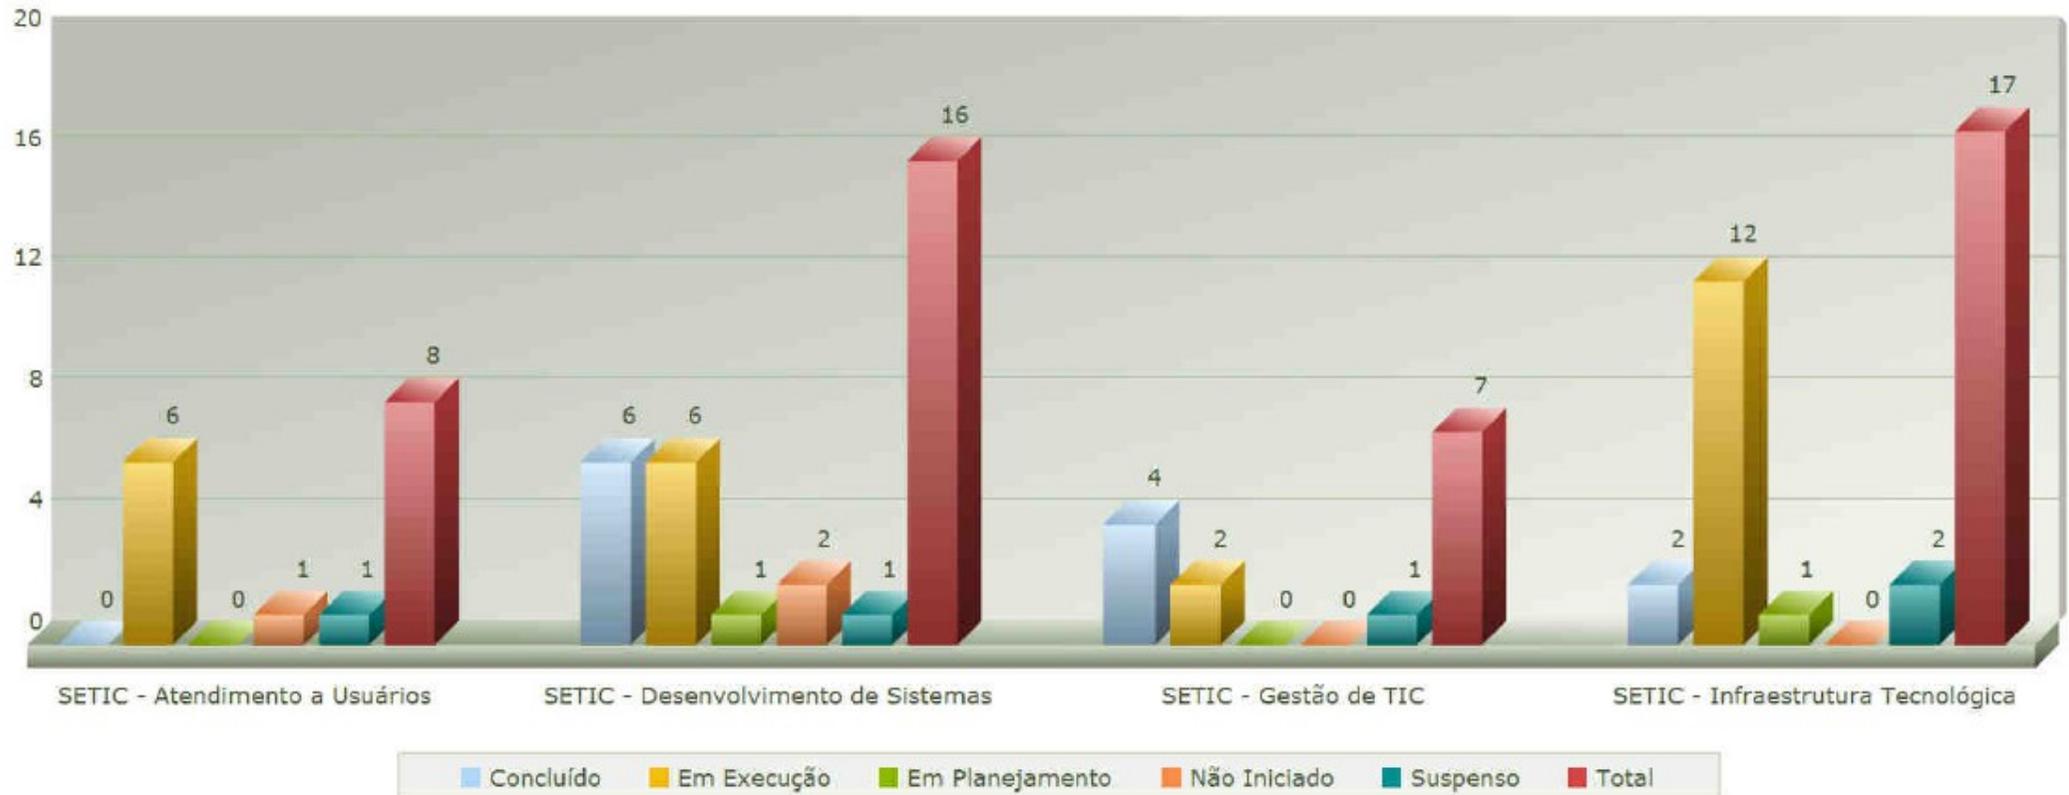


2) Percentual de conclusão dos projetos – por Coordenadoria

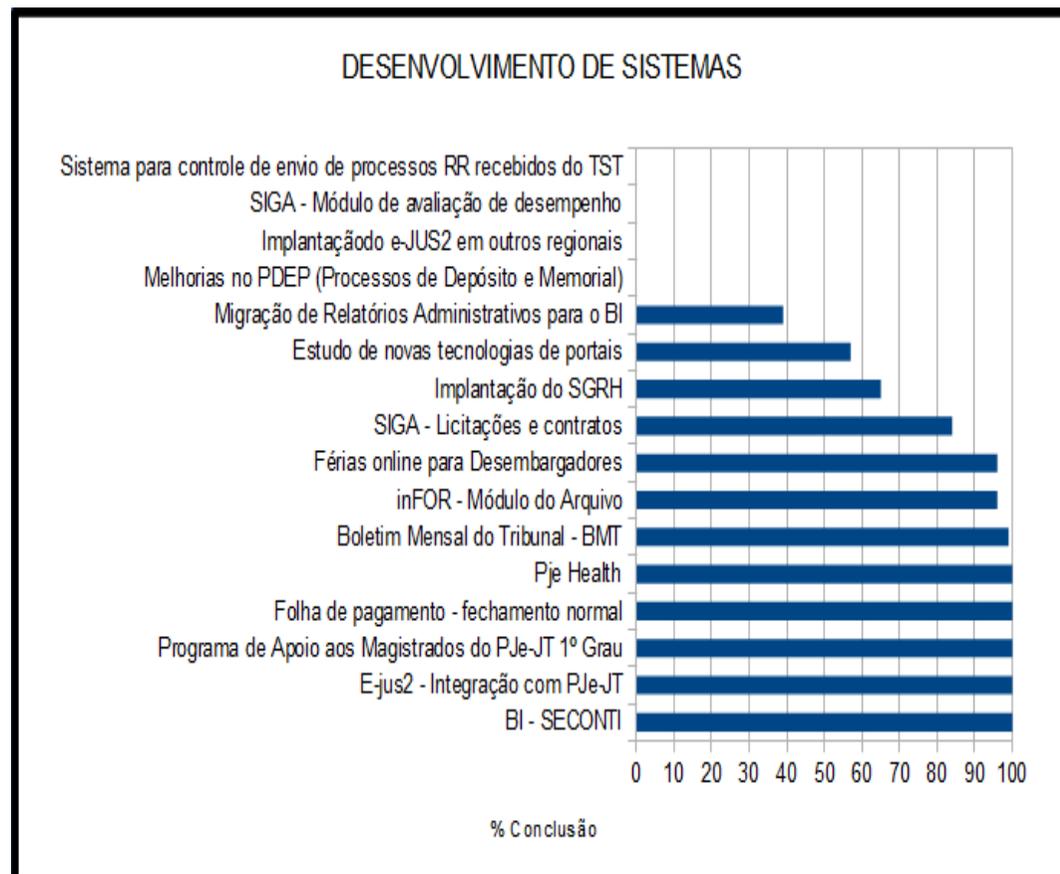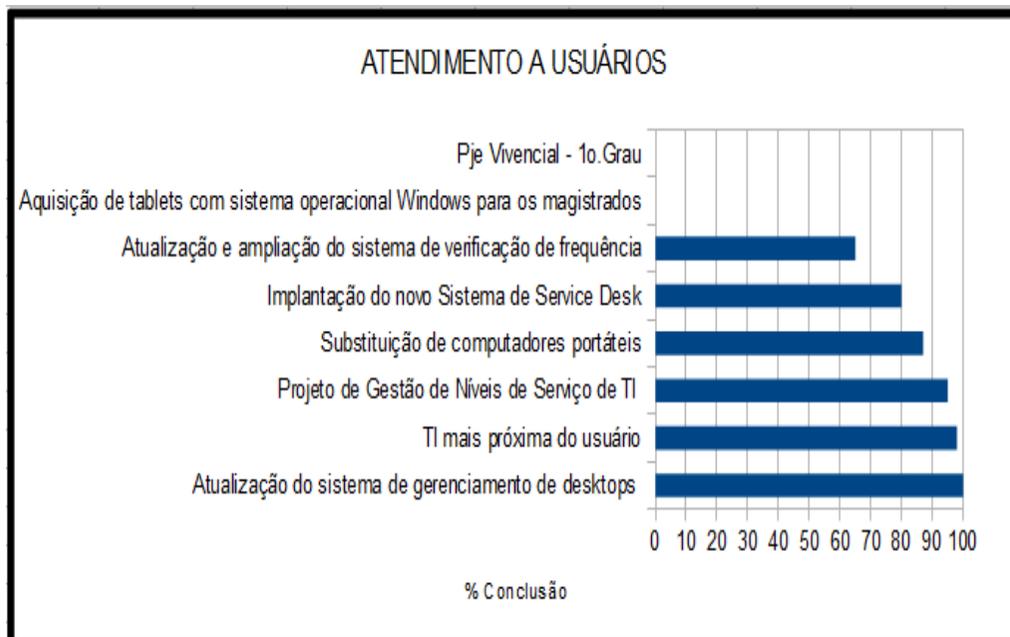

GESTÃO DE TIC

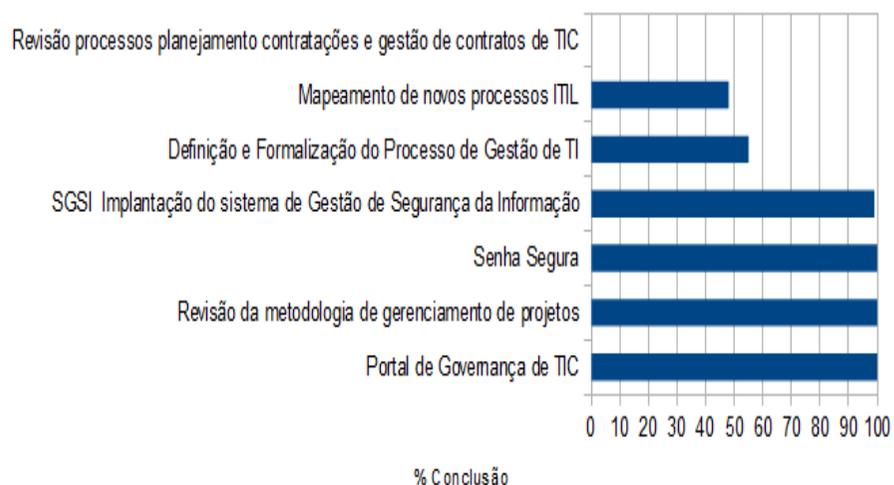

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

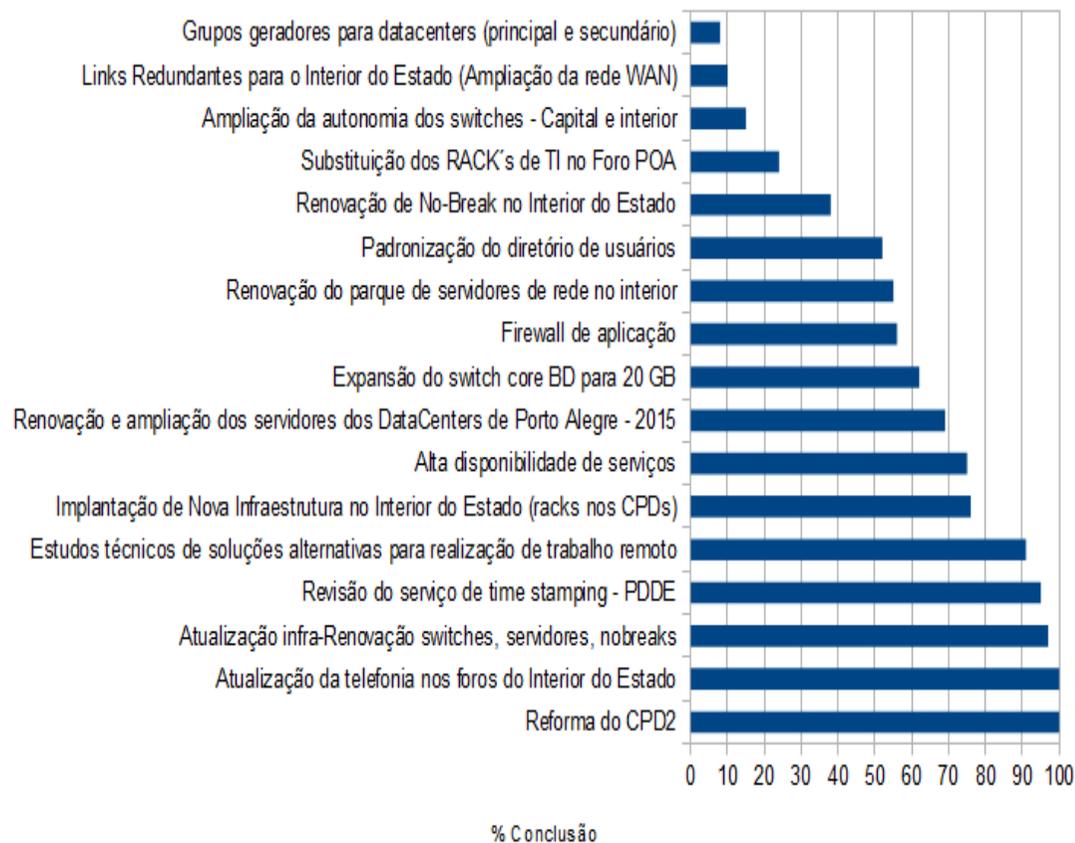

3) Situação dos projetos – por Coordenadoria

ATENDIMENTO A USUÁRIOS

ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLU SÃO	STATUS
195	Projeto de Gestão de Níveis de Serviço de TI	GP: Denilson Quadros LP: Charles Falcão	Escopo aprovado	Sem Custo		Posição 15/02: Assyst implantado em 18/maio, contendo o novo catálogo. PA com novo catálogo aprovado na reunião da Comissão de Informática de 03/julho, com vigência até dez/2015. PA aprovado pela Presidência. Realizando a última validação dos indicadores e métricas entre Natacha, Denilson e Ricardo K (**EP remarcar reunião para definição final).	-Elaboração do catálogo de serviços: concluído -Aprovação da proposta de catálogo: concluído -Implantação do Assyst: concluído -Elaboração de indicadores e métricas: em andamento -Implantação: concluído -Encerramento: não iniciado	95%	Em Execução
199	Atualização do sistema de gerenciamento de desktops	GP: Ana Moreira LP: Charles Falcão	Escopo aprovado	Obs.: O custo está contido no projeto 201.	20/01/2016	Posição 15/02: Dado aceite do produto (Assyst) para o fornecedor, em 20/01/2016. Por decisões técnicas, algumas funcionalidades previstas no escopo inicial não serão utilizadas no Assyst. Encaminhar o aceite do produto e encerramento do projeto.	-KickOff: concluído -Workshop 1: concluído -Workshop 2: concluído -Workshop 3: concluído -Implantação e homologação: concluído -Encerramento: não iniciado	96%	Em Execução
201	Implantação do novo Sistema de Service Desk	GP: Ricardo K.	Escopo aprovado	R\$960.334,55 Obs.: Esse custo é referente aos projetos	20/01/2016	Posição 15/02: Assyst implantado em 18/maio. Dado aceite do produto (Assyst) para o	-Instalação do software: concluído -Implantação processos grupo 1: concluído	80%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
				201 e 199 Será necessário custo adicional com licenças (R\$263.925,00)		fornecedor, em 20/01/2016. Operação assistida será sob demanda. Encaminhar o encerramento do projeto.	-Implantação processos grupo 2: concluído -Implantação processos grupo 3: concluído -Retomada da implantação: concluído -Implantação do software: concluído -Capacitação: concluído -Apontamento de atraso e inexecução: suspenso -Encerramento: não iniciado		
242	Atualização e do sistema de verificação de frequência	GP: Ana Moreira LP: Charles Falcão	Elaborar plano de projeto	R\$ 300.000,00 (custo a confirmar)		Posição 15/02: Contrato assinado em 13/out/15. Cronograma definido até a verificação dos resultados do piloto (previsto para 11/abril). Treinamentos serão realizados dias 15, 16 e 17/fev. Após, será iniciada a implantação do Piloto e em paralelo, a adaptação e definição de processos para a utilização da nova solução. Necessário elaborar plano de projeto.	-Estudo da solução: concluído -Licitação: em andamento -Entrega de equipamentos e software: em andamento -Treinamento: em andamento -Adaptação e definição de processos: não iniciado -Implantação: em andamento -Modificações no sistema de frequência: não iniciado -Encerramento: não iniciado	65%	Em Execução
243	Aquisição de tablets com sistema operacional	GP: Charles Falcão	Escopo definir	R\$ 900.000,00		Suspenso para avaliação após o recebimento dos ultrabooks do CSJT.			Suspenso

ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
	Windows para os magistrados								
316	Substituição de computadores portáteis	GP: Paula Medaglia LP: Charles Falcão	Escopo aprovado	R\$1.327.005,00 (adicionar o curso das 30 dock stations: R\$28.048,50)		Posição 15/02: 100% dos equipamentos entregues para magistrados (281 entregues e 3 magistrados sinalizaram não ter interesse em receber). Distribuídos 12 equipamentos para a área Administrativa, restando apenas 5 a entregar. Projeto será acompanhado somente até o recebimento das 30 dock stations (prevista para até 28/fev) para tentativa de conclusão da redistribuição dos equipamentos antigos aos assessores e diretores de Varas. Dos 284 assessores, já foram entregues 186 e das 142 das VTs e Postos já foram entregues 124.	-Criação de imagem: concluído -Preparação e distribuição dos equipamentos: em andamento -Compra / Distribuição de dock station para magistrados: em andamento -Redistribuição dos equipamentos antigos: em andamento -Encerramento: não iniciado	87%	Em Execução
395	TI mais próxima do usuário	GP: Charles Falcão	Plano de projeto aprovado			Posição 15/02: Último treinamento realizado em 24/nov. Termo de aceite assinado em 10/dez. Em elaboração do termo de encerramento.	-Planejamento dos treinamentos: concluído -Conteúdo dos treinamentos e material didático: concluído -Divulgação institucional do projeto: concluído -Treinamentos: concluídos -Encerramento: em andamento	98%	Em Execução
396	Pje Vivencial	GP: Charles Falcão	Escopo a definir						Não Iniciado

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLU SÃO	STATUS
254	BI - SECONTI	GP: Paulo do Carmo LP: Tiago Gomes	Escopo aprovado	R\$60mil (já contido no pacote de horas com a First Decision). ***custo não utilizado***	07/07/2015	Projeto concluído conforme a data planejada (07/07/2015). CONCLUÍDO NO TRACE.	-Sprint 1,2, 3 e 4- Mapeamento tabelas Folha: concluído -Sprint 5 e 6-Criação do Universo RHFolha V1.0: concluído -Sprint 7-Relatório Aposentadoria v1.0: concluído -Sprint 8-Dashboard Aposentadoria: concluído -Sprint 9-Entrega Relatório Aposentadoria: concluído -Sprint 10-Homologação pelo cliente: concluído -Sprint 11 e 12-Relatório Aposentadoria - v2.0: concluído -Sprint 13 e 14- Impedimento: concluído -Sprint 15-Entrega Relatório Aposentadoria - v3.0: concluído -Sprint 16,17,18,19 e 20- Relatório FC's e CJ's: concluído -Sprint 21-Ajustes bugs: concluído -Sprint 22-Ajustes finais: concluído -Entrega do projeto: concluído -Encerramento do projeto: concluído	100%	Concluído
256	SIGA Licitações e contratos	- GP: Marcio Bystronski LP: Marcio Bystronski	Novo plano de projeto gerado	Sem custo (custo inicial previsto com a fábrica não será utilizado –	31/03/2016	Posição 15/02: Definido em reunião com a PO (Daniela Vaz) e Diretora da SETIC, que o projeto	-Análise de requisitos: concluído -Sprint 1 e 2-Implementação da arquitetura básica do sistema: concluído	84%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLU SÃO	STATUS
				desenvolvimento interno)		só será concluído com a liberação dos itens que faltam (retroalimentação; migração dos dados; alertas; e integração com o sistema ADM). Novo plano de projeto já elaborado, contemplando esse escopo e novo cronograma, tendo como objetivo sua finalização até 31/março/2016 (registro de mudança realizado).	<p>-Sprint 3: Implementação de webcomponentes (view): concluído</p> <p>-Sprint 4: Implementação de permissões: concluído</p> <p>-Sprint 5,6,7 ,8 e 9: Implementação de cadastro de fornecedores: concluído</p> <p>-Sprint 10 e 11: Implementação de cadastro de requisições e aquisições: concluída</p> <p>-Sprint 12, 13, 14, 15 e16: Implementação de Cadastro de Aquisições (Adesão a Registro de Preços): concluído</p> <p>-Sprint 17: Implementação de Cadastro de Aquisições (Licitações -Demais modalidades): concluído</p> <p>-Sprint 18: Implementação de Cadastro de Aquisições (Pregões e Compra Direta): concluído</p> <p>-Sprint 19: Implementação de Cadastro de Aquisições (Partic em Registro de Preços): concluído</p> <p>-Sprint 20: Implementação de Cadastro Contratos e Aditivos Parte I): concluído</p> <p>-Sprint 21: Implementação de Cadastro Contratos e Aditivos Parte II): concluído</p> <p>-Sprint 22 e 23: Correção de defeitos identificados pela área de negócio: concluído</p> <p>-Sprint 24: Alterações de estruturas de dados: em</p>		

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
							andamento -Demais SPRINTS: não iniciado -Implantação: não iniciado -Encerramento: não iniciado		
257	Estudo de novas tecnologias de portais	GP: Joice Figueiro LP: Stefano	Plano de projeto em revisão	Sem custo	30/03/2016	Posição 15/02: Foram estudadas 4 ferramentas. Decidido aceitar proposta de consultoria HedHat e Gartner. Devido aos cortes no orçamento, entende-se que o projeto perde prioridade e a princípio as POCs não seriam realizadas nesse momento, sendo necessário replanejar o cronograma (validar com a Diretora da SETIC).	-Gerencia do projeto: em andamento -Planejamento preliminar: concluído -Estudo das ferramentas de portal: em andamento -Prova de conceito: não iniciado -Avaliação da POC: não iniciado -Finalização: não iniciado	57%	Em Execução
259	Melhorias no PDEP (Processos de Depósito e Memorial)	GP: Rubilar Jardim LP: Marcio Bystronski	Escopo a definir	Possibilidade de uso da fábrica de software dependendo da forma de implementação.					Suspensão
324	inFOR - Módulo do Arquivo	GP: Lucia Speranza LP: Luiz Estivalet	Escopo aprovado	Sem custo.	13/08/2015	Posição 15/02: Liberado para uso em POA dia 15/05 e para uso no Interior dia 13/08/2015. Lições aprendidas já atualizadas no Portal. Aguardando o aceite do projeto pela Natacha.	-SPRINT 1-ARQUIVAMENTO SEM LOTE (VT): concluído -SPRINT 2-PREPARAÇÃO DOS LOTES (VT): concluído -SPRINT 3-PREPARAÇÃO DOS LOTES (VT) E RECEBIMENTO DE LOTES (ARQUIVO): concluído -SPRINT 4-RECEBIMENTO	96%	Concluído

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
							<p>LOTES E REGISTRO DE ANDAMENTOS (ARQUIVO): concluído</p> <p>-SPRINT 5-REGISTRO DE ANDAMENTOS E MANUTENÇÃO DE LOTES (ARQUIVO): concluído</p> <p>-SPRINT 6-MANUTENÇÃO DE LOTES E CONSULTA PEDIDOS DA VT (ARQUIVO): concluído</p> <p>-SPRINT 7-REGISTRAR ANDAMENTOS DE PROCESSOS: concluído</p> <p>-SPRINT 8-CONSULTA PEDIDOS DA VT E CORREÇÃO DE BUGS: concluído</p> <p>-Implantação: concluído</p> <p>-Encerramento: não iniciado</p>		
343	E-jus2 – Integração com PJe-JT	GP: Fábio Garcia	Escopo aprovado	Sem custo	16/07/2015	Projeto concluído em 16/07/2015. CONCLUÍDO NO TRACE.	<p>-Gerenciamento do projeto: concluído</p> <p>-Desenvolvimento: concluído</p> <p>-Homologação: concluído</p> <p>-Encerramento do produto: concluído</p> <p>-Encerramento do projeto: concluído</p>	100%	Concluído
366	Programa de apoio aos magistrados do PJe-JT	GP: Joice Figueiro LP: Stefano	Escopo a definir	Sem custo (desenvolvimento interno)	09/02/2015	Funcionalidade disponibilizada em produção, dia 09/fev. PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE.	<p>-Análise e desenvolvimento: concluído</p> <p>-Implantação: concluído</p> <p>-Encerramento do projeto: concluído</p>	100%	Concluído
385	Folha de	GP: Márcio	Escopo	Sem custo	11/02/2015	Disponível em produção	-Desenvolvimento sprints:	100%	Concluído

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
	pagamento fechamento normal	- Bystronski	aprovado			dia 11/fev/15. CONCLUÍDO NO TRACE.	concluído -Encerramento do projeto: concluído		
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	GP: Tiago Gomes	Plano de projeto aprovado em nov/2015	A definir	12/09/2016	Posição 15/02: Plano de projeto aprovado. Dashboard para a CSAUDE entregue e homologado. Primeira entrega da SEGESP realizada, aguardando a homologação pela área usuária para posteriormente prosseguir com os desenvolvimentos para esse setor. Finalizado relatórios para a SGE. Em elaboração de novos relatórios para a CSAUDE.	-Gerência do projeto: em andamento -Sprint 1 a 4 (Relatório Licenças-CSAUDE): concluído -Sprint 5 a 7 (Relatório Pessoas-SEGESP): concluído -Sprint 8 e 9 (Relatório Equipamentos-SGE): concluído -Sprint 10 e 11(Relatório Equipamentos-SGE): concluído -Sprint 12 (Relatório-CSAUDE): concluído -Sprint 13 (Relatório-CSAUDE): em andamento -Demais Sprints: não iniciado	39%	Em Execução
399	Pje Health	GP: André Farias	Plano de projeto aprovado		02/10/2015	Solução implantada em 02/out/2015. PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE. Pós-projeto: em medição dos benefícios.	-Plano do Projeto Aprovado: concluído -Encerramento do projeto: concluído -Aplicativo Pje-JT Health Agent: concluído -Implementação de envio de resultados: concluído -Aplicativo Pje-JT Health Monitor: concluído -Homologação da	100%	Concluído

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
							solução: concluído -Implantação: concluído		
400	Implantação do e-JUS2 em outros regionais	GP: André Farias	Escopo a definir			Posição 15/02: em elaboração do plano de projeto.			Em planejamento
401	SIGA – Módulo de avaliação de desempenho	GP: Márcio Bystronski	Escopo a definir			Rascunho da proposta de projeto número 193796. Em reunião do grupo de trabalho do sistema SGRH, o módulo de avaliação de desempenho, antes vinculado ao TRT4, passou a ser de responsabilidade de outro Regional. Sendo assim, solicitar o cancelamento desse projeto no PDTI2016.			Não Iniciado
402	Férias online para Desembargadores	GP: Márcio Bystronski	Escopo aprovado			Posição 15/02: Desenvolvimento e homologação concluídos em final de outubro. Aguardando retorno dos testes da área usuária e autorização da Natacha para a liberação em produção. Retirado do escopo as férias da Alta Administração. Projeto estava previsto para ser concluído ainda em 2015.	-Gerência do projeto: em andamento -Sprint 1, 2 e 3 (Estórias de usuários): concluído -Sprint 4 (Preparação do ambiente de desenvolvimento): concluído -Sprint 5 a 9 (Estórias de usuários): concluído -Sprint 10 e 11 (Homologação): concluído -Sprint 12, 13 e 14 (Correções e melhorias): concluído	96%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
							-Sprint 15 (Caixas postais de avisos e modelos de emails): concluído -Sprint 16 (Homologação final e elaboração de manual): concluído -Implantação: não iniciado		
403	Sistema para controle de envio de processos recebidos do TST	GP: Stefano	Escopo a definir			Encaminhar e anexar proposta de projeto (193830).			Não Iniciado
404	Implantação do SGRH	GP: Márcio Bystronski	Escopo a definir			Posição 15/02: Projeto organizado em 3 fases. Primeira já liberada- aguardando homologação pela SEGESP. Fase 2 entregue p/ homologação em 18/12. Fase 3 dependerá de priorização com a nova coordenação da SEGESP.	-Gerência do projeto: em andamento. -Análise inicial de requisitos: concluído -Desenvolvimento – FASE 1: em andamento -Desenvolvimento – FASE 2: em andamento -Desenvolvimento – FASE 3: não iniciado	65%	Em Execução
407	Boletim Mensal do Tribunal - BMT	GP: Tiago	Plano de projeto aprovado		07/12/2015	Posição 15/02: Realizada reunião de repasse para operação. Produto entregue em 07/dez. Aguardando aprovação do termo de encerramento do projeto pela Diretora da SETIC, para finalização do mesmo.	-Gerência do projeto: em andamento -Sprints 1 a 9: concluído	99%	Em Execução

GESTÃO DE TIC

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
213	SGSI Implantação do sistema de Gestão de Segurança da Informação	GP: Cleonice Condotta	Escopo aprovado	R\$215.000,00	18/02/2016	Posição 15/02: Todas etapas concluídas (Plan, Do, Check e Act). Última entrega do fornecedor validada dia 10/fevereiro. Em encerramento da implantação.	<p>-Contratação: concluído</p> <p>-Planejamento do projeto: concluído</p> <p>- Etapa Plan (Workshop1, Política de segurança da informação, Metodologia de gestão de riscos, Análise e avaliação de riscos, Declaração de aplicabilidade e Planos de continuidade de negócio): concluído</p> <p>-<u>Etapa implementação Do</u> (Workshop 2, Plano de tratamento de riscos, Teste do Plano de Continuidade Operacional, Testes do Plano de Recuperação de Desastres e Treinamento/ conscientização): concluído</p> <p>-<u>Etapa verificação Check</u> (Workshop 3, Indicadores eficácia SGSI, Análise crítica do SGSI): concluído</p> <p>-<u>Etapa melhorias Act</u> (Workshop 4, Metodologia de melhoria contínua do SGSI e Entrega metodologia de melhoria contínua): concluído</p> <p>-<u>Encerramento da implantação do SGSI</u>: em andamento</p> <p>-Encerramento do projeto: não iniciado</p>	99%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
214	Portal de Governança de TIC	GP: Ricardo K.	Escopo aprovado	R\$50.000,00 (não será utilizado- desenvolvimento interno)	15/06/2015	PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE. Pós-projeto: em medição dos benefícios.	-Levantamento de informações: concluído -Análise dos requisitos: concluído -Coleta de dados: concluído -Implementação: concluído -Liberação: concluído -Encerramento: concluído	100%	Concluído
215	Revisão da metodologia de gerenciamento de projetos	GP: Deise Albino	Escopo aprovado	R\$73.950,00	16/11/2015	PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE. Pós-projeto: em medição dos benefícios.	-Plano de implantação: concluído -Revisão da metodologia de GP: concluído -Modelo de gestão de portfólio de projetos: concluído -Disseminação da metodologia: concluído -Disseminação para a Organização: concluído -Acompanhamento projeto piloto: concluído - Encerramento: concluído	100%	Concluído
216	Revisão dos processos de planejamento de contratações e gestão de contratos de TIC	GP: Simone Goulart	Escopo a definir	Sem custo.		Em outubro/2014, realizada revisão do processo de contratação para adequação pontual à resolução do CNJ. Em outubro/2015, processo de gestão revisado e encaminhado PA para aprovação da	-Processos de planejamento de contratações e gestão de contratos de TIC revisados: em andamento		Concluído

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
						Presidência. Necessário documentar o projeto no Trace.			
224	Definição e Formalização do Processo de Gestão de TI	GP: Ricardo K.	Escopo aprovado	Sem custo.		Posição 15/02: Processo em etapa de regulamentação (PA encaminhado para Diretora da TI em 11/01/2016).	-Análise de requisitos: concluído -Modelagem: concluído -Regulamentação: em andamento -Encerramento: não iniciado	55%	Em Execução
350	Senha Segura	GP: Cleonice Condotta	Escopo aprovado	Sem custo.	03/julho/2015	Projeto concluído em 03/julho/2015. CONCLUÍDO NO TRACE.	-Planejamento do projeto: concluído -Planejamento das atividades técnicas: concluído -Conscientização de usuários e configuração: concluído - Implantação de medidas para utilização obrigatória de senhas seguras: concluído -Monitoramento do ambiente: concluído -Encerramento: concluído	100%	Concluído
397	Mapeamento de novos processos ITIL - projeto nacional	GP: Ricardo K.	Plano projeto aprovado	Projeto com custo		Projeto suspenso conforme registro de mudança em 27/11/2015. Suspenso até a atualização e utilização da nova versão do Assyst (expectativa de retomada na 2ª.quinzena de março/2016).	-Plano do Projeto Aprovado: concluído -Diagnóstico de Processos: concluído -Modelagem de Processos: suspenso	48%	Suspenso

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUÇÃO	STATUS
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	GP: Ernani LP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	Sem custo em 2014 (equipamentos já adquiridos em anos anteriores)		Projeto com dependência da SEMPRO. A aquisição de mais 9 racks está suspensa, até que o estoque seja esvaziado. Posição 15/02: Faltam implantar em 12 localidades das 67 totais. Erechim estava prevista para dezembro. Uruguaiana implantada em novembro. Elaborada lista com as cidades e as pendências, para a Diretora da Setic decidir sobre o encerramento ou não do projeto.	-2012 (Carazinho, Vacaria, Rio Grande, Palmeira Missões): concluído -2013 (Frederico Westphalen, Torres, Panambi, Gravataí, Marau, Osório, Nova Prata): Concluído -2014/1 (Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Canoas, Capão da Canoa, Dom Pedrito, Encantado, Estancia Velha, Esteio, Estrela, Farroupilha, Itaqui, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, POA–Almox, POA–Big/Transporte/João Telles/Provenzano, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Rosa II, Santana do Livramento, São Gabriel, São Jerônimo, São Leopoldo II, São Lourenço do Sul, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Soledade, Taquara, Taquari, Tramandaí, Triunfo): concluído -2014/2 – Caxias e Guaíba: concluído -2015/1 – Sapucaia, Alegrete, Lajeado e São Borja: concluído -2015/1 – demais localidades: em andamento -Encerramento: não iniciado	76%	Em Execução
105	Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)	GP: Gustavo K. LP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	R\$609.076,44	10/05/2016	Posição 15/02: Contrato assinado dia 10/nov. Previsão de 180 dias para instalação total, a contar após o recesso. Sendo reavaliado devido ao corte no orçamento do TRT4.	-Redefinição do projeto: concluído -Análise de soluções: concluído -Contratação: em andamento -Implantação: não iniciado	10%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
							-Aceite do projeto: não iniciado		
163	Reforma do CPD2	GP: Volnei Susin LP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	R\$1.067.114,97 (realizado)	23/10/2015	PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE. Pós-projeto: medição dos benefícios concluída.	-Projeto executivo: concluído -Projeto básico: concluído -Contratação: concluído -Execução: concluído - Moving: concluído -Entrega das chaves: concluído -Encerramento: concluído	100%	Concluído
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	GP: Ernani LP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	R\$ 1.107.984,00 + 367.555,40 (20 servidores) Todo valor contido no orçamento 2013	2015	Dependência da SEMPRO. Posição 15/02: Atendidos 59 foros, restando 2 para atender (Canoas e São Leopoldo). São Leopoldo: aguardando SEMPRO para movimentação dos racks. Canoas: pendência SETIC e SEMPRO. Aguardando definições da nova diretoria da SEMPRO. Elaborado e-mail com os locais faltantes e as pendências, para definição do encerramento do projeto ou não.	- 52 Foros atendidos até 08/2014: concluído -Foros atendidos a partir de 08/2014 – Caxias, São Jerônimo, Esteio, Santa Rosa, Santa Rosa II, Sapucaia e Erechim: concluído -Demais foros atendidos a partir de 08/2014: em andamento -Encerramento: não iniciado	97%	Em Execução
204	Atualização da telefonia nos	GP: Ernani LP: Adriano	Escopo aprovado	Realizado: R\$808.876,00	11/dez/2015	PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE.	-Análise de mercado: concluído	100%	Concluído

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
	foros do Interior do Estado	Simioni				Pós-projeto: medição dos benefícios concluída.	-Licitação: concluído -Execução: concluído -Encerramento: concluído		
208	Revisão do serviço de time stamping - PDDE	GP: André Livi LP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	A definir.	18/01/2016	Posição 15/02: instalação dos equipamentos concluída em 18/jan/2016. Encaminhar encerramento do projeto.	-Análise de viabilidade: concluído -Licitação: concluído -Execução: concluído -Encerramento: não iniciado	95%	Em Execução
209	Padronização do diretório de usuários	GP: Volnei Susin LP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	A definir		Cenário D aprovado. Dia 10/abril realizado piloto nas secretarias de Alvorada e dia 12/junho em Guaíba. Em agosto, suspenso até que seja realizada a regulamentação do licenciamento Microsoft (para equipamentos servidores e usuários). Pregão com a compra para regularização do licenciamento do interior do Estado, realizado em 7/dez – em fase de homologação. Projeto precisa ser revisto, pois depende da instalação dos links redundantes (o qual está sendo reavaliado devido ao corte no orçamento do TRT4).	-Criação do grupo de trabalho: concluído -Estudo técnico do cenário atual: concluído -Estudo de possíveis cenários e montagem de laboratório: concluído -Estratégia de migração a ser adotada: suspensa -Licitação: suspensa -Execução: suspensa	52%	Suspensa
210	Ampliação da	GP: Ernani	Escopo	Custo de aquisição		Posição 15/02: Pregão	-Análise de viabilidade:	15%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
	autonomia dos switches - Capital e interior	LP: Adriano Simioni	aprovado	dos nobreaks: R\$70 mil (a confirmar)		ocorreu e está em homologação – mas a princípio será reprovado, devido ao corte no orçamento do TRT4.	concluído -Licitação: em andamento -Execução–prédios interior: não iniciado -Execução–prédios capital: não iniciado		
211	Firewall de aplicação	GP: Adriano Simioni	Escopo a definir	R\$1.300.000,00		Posição 15/02: Projeto reaberto. Trabalho em conjunto dos TRTs (4, 1, 14 e 15), com gestão do TRT4. Previsão de recebimento do equipamento para 29/fev. GP replanejar o cronograma com base na minuta de contrato.	-Análise técnica: concluído. -Licitação: concluída -Execução: em andamento -Encerramento: não iniciado	56%	Em Execução
212	Alta disponibilidade de serviços	GP: Eric LP: Adriano Simioni	Escopo a redefinir	Sem custo.	19/12/2015	Posição 15/02: Escopo reprovado, a redefinir. AGUARDANDO REDEFINIÇÃO DE ESCOPO PELA DIRETORIA DA SETIC. GP fazendo mapeamento da disponibilidade existente por serviço.	- HA Banco Oracle: concluído - Análise do ambiente (Foco HA): em andamento - Entrega CPD2 (dependência externa): concluído - Adequação para alta disponibilidade: não iniciado (relatório de necessidades)	75%	Em Execução
321	Renovação e ampliação dos servidores dos DataCenters de Porto Alegre - 2015	GP: Germano LP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	R\$3.310.795,00 (orçamento aprovado)		Posição 15/02: equipamentos adquiridos na fase 3 já recebidos. Previsão de instalação na parada programada de 05/março.	-Análise da demanda: concluído -Licitação: concluído -Execução do projeto Fase 1: concluído -Execução do projeto	69%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
							Fase 2: concluído -Execução do projeto Fase 3: em andamento		
389	Substituição dos RACK's de TI no Foro POA	GP: Adriano Simioni	Escopo a definir	A definir		PROJETO PARADO EM SET/2015 DEVIDO AO CORTE DE VERBA DA SEMPRO. Recomendar suspensão no mínimo até 2016. Paulo Mendes vai verificar com a Natacha se realmente é projeto ou poderia ser uma recomendação da TI para a SEMPRO, via processo administrativo.	-Análise de viabilidade de projeto: em andamento -Licitação: não iniciado -Execução do projeto: não iniciado -Encerramento: não iniciado	24%	Suspensão
390	Renovação de No-Break Interior do Estado	GP: Adriano Simionil	Escopo a definir	A definir		Posição 15/02: contrato assinado em 30/dez/2015, tendo prazo contratual para conclusão até final de abril. GP replanejar cronograma com base no contrato.	-Análise de viabilidade do projeto: concluído -Licitação: em andamento -Execução do projeto: não iniciado -Encerramento: não iniciado	38%	Em Execução
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	GP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	R\$500.000,00		Posição 15/02: Alta prioridade. Devido ao corte no orçamento do TRT4, o objetivo é deixar o termo de referência pronto para a realização da contratação, quando a verba for liberada. Em avaliação se será possível ou não contratar o projeto executivo.	-Análise de Viabilidade da Solução: em andamento -Licitações: não iniciado -Execução: não iniciado -Encerramento: não iniciado	8%	Em Planejamento

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder de Projeto)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
392	Expansão do switch core BD para 20 GB	GP: Adriano Simioni	A solicitar aprovação do plano de projeto			Posição 15/02: Escopo alterado (necessário aprovação do plano de projeto-Diretora da SETIC). Suporte renovado a partir de 28/fev/2016. Entrega dos equipamentos prevista para 29/março.	-Análise de viabilidade da solução: concluído -Licitações: concluído -Execução: em andamento -Encerramento: não iniciado	62%	Em Execução
393	Renovação do parque de servidores de rede no interior	GP: Adriano Simioni	Escopo aprovado			Posição 15/02: contrato assinado em 30/dez/2015, tendo prazo contratual para conclusão até final de abril. Necessário estabelecer cronograma.	-Análise de mercado: concluído -Licitações: concluído -Execução: não iniciado -Encerramento: não iniciado	55%	Em Execução
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	GP: Adriano Simioni	Escopo aguardando aprovação	R\$600.000,00		Posição 15/02: Não aprovada aquisição de nova solução, apenas atualização da solução atual. Registro de mudança realizado em 10/dez. Em testes da atualização (estimativa de esforço de 2 a 3 semanas).	-Análise de viabilidade da solução: concluído -Instalação do novo ambiente definido: em andamento -Testes: em andamento -Encerramento: não iniciado	91%	Em Execução
