


# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PROJETOS DA SETIC PDTI 2016-2017

Data: 15/Abril/2016  
v 1.0


## 1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria



## 2) Percentual de conclusão dos projetos – por Coordenadoria

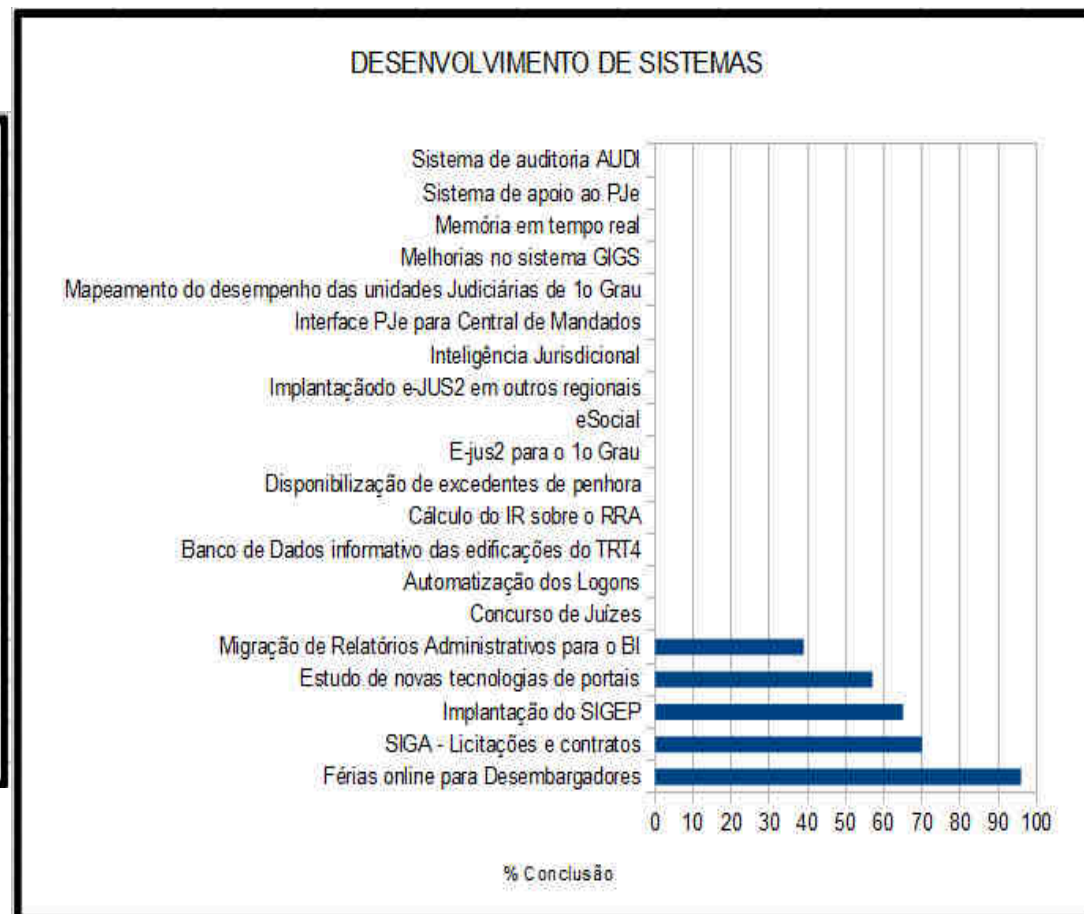

## GESTÃO DE TIC

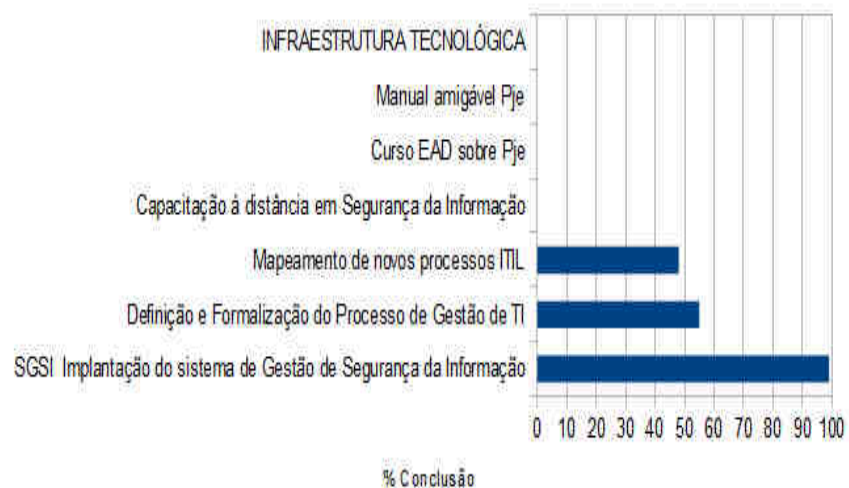

## INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA



### 3) Situação dos projetos – por Coordenadoria

#### ATENDIMENTO A USUÁRIOS

ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLU SÃO	STATUS
195	<b>Projeto de Gestão de Níveis de Serviço de TI</b>	GP: Charles Falcão LT: Denilson Quadros	Escopo aprovado	Sem Custo	11/04/2016	Posição 15/04: Assyst implantado em 18/maio/16. PA encaminhado para aprovação da Presidência em abril/16 com a definição dos indicadores e métricas (a parte referente ao catálogo já tinha sido aprovada). Encaminhar o encerramento do projeto.	Elaboração do catálogo de serviços: <b>concluído</b> -Aprovação da proposta de catálogo: <b>concluído</b> -Implantação do Assyst: <b>concluído</b> -Elaboração de indicadores e métricas: <b>concluído</b> -Implantação: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	98%	Em Execução
199	<b>Atualização do sistema de gerenciamento de desktops</b>	GP: Charles Falcão LT: Ana Moreira	Escopo aprovado	Obs.: O custo está contido no projeto 201.	20/01/2016	Posição 15/04: Dado aceite do produto (Assyst) para o fornecedor, em 20/01/2016. Por decisões técnicas, algumas funcionalidades previstas no escopo inicial não serão utilizadas no Assyst. Encaminhar o aceite do produto e encerramento do projeto.	-KickOff: <b>concluído</b> -Workshop 1: <b>concluído</b> -Workshop 2: <b>concluído</b> -Workshop 3: <b>concluído</b> -Implantação e homologação: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	99%	Em Execução
201	<b>Implantação do novo Sistema de Service Desk</b>	GP: Ricardo K.	Escopo aprovado	R\$960.334,55  Obs.: Esse custo é referente aos projetos 201 e 199  Será necessário custo adicional com	20/01/2016	Posição 15/04: Assyst implantado em 18/maio. Dado aceite do produto (Assyst) para o fornecedor, em 20/01/2016. Operação assistida será sob demanda. Encaminhar o	-Instalação do software: <b>concluído</b> -Implantação processos grupo 1: <b>concluído</b> -Implantação processos grupo 2: <b>concluído</b> -Implantação processos grupo 3: <b>concluído</b>	89%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
				licenças (R\$263.925,00)		encerramento do projeto.	-Retomada da implantação: <b>concluído</b> -Implantação do software: <b>concluído</b> -Capacitação: <b>concluído</b> -Apontamento de atraso e inexecução: <b>suspenso</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>		
242	Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	GP: Charles Falcão LT: Ana Moreira	A Elaborar plano de projeto	R\$ 300.000,00 (custo a confirmar)		Posição 15/04: Contrato assinado em 13/out/15. Projeto piloto até 29/04. Substituição dos equipamentos de POA até 01/06. A partir de 02/06 inicia a implantação dos prédios que não possuem relógio ponto atualmente. Elaborar plano de projeto (quando restante do cronograma for definido).	-Estudo da solução: <b>concluído</b> -Licitação: <b>concluído</b> -Entrega de equipamentos e software: <b>concluído</b> -Treinamento: <b>concluído</b> -Adaptação e definição de processos: <b>em andamento</b> -Implantação: <b>em andamento</b> -Modificações no sistema de frequência: <b>não iniciado</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	81%	Em Execução
316	Substituição de computadores portáteis	GP: Charles Falcão LT: Paula Medaglia	Escopo aprovado	R\$1.327.005,00  (adicionar o curso das 30 ou 24 dock stations: R\$28.048,50)		Posição 15/04: 100% dos equipamentos entregues, sendo 281 para Magistrados (3 sinalizaram não ter interesse em receber) e 17 para a área Administrativa. Distribuídas 20 das 24 dock stations. Após essa distribuição, projeto pode ser encerrado.	-Criação de imagem: <b>concluído</b> -Preparação e distribuição dos equipamentos: <b>concluído</b> -Compra / Distribuição de dock station para magistrados: <b>em andamento</b>	89%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
							-Redistribuição dos equipamentos antigos: <b>em andamento</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>		
425	Aprendendo sobre o TRT	GP: Charles Falcão	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado

## DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUÇÃO	STATUS
256	<b>SIGA Licitações e contratos</b>	- GP: Marcio Bystronski	Plano de projeto em revisão	Sem custo (custo inicial previsto com a fábrica não será utilizado – desenvolvimento interno)	30/06/2016	Posição 15/04: Definido em reunião com a PO (Daniela Vaz) e Diretora da SETIC, que o projeto só será concluído com a liberação dos itens que faltam (retroalimentação; migração dos dados; alertas; e integração com o sistema ADM). Necessária nova gestão de mudança, com previsão de conclusão para 30/junho/2016.	-Análise de requisitos: <b>concluído</b> -Sprint 1 e 2-Implementação da arquitetura básica do sistema: <b>concluído</b> -Sprint 3: Implementação de webcomponentes (view): <b>concluído</b> -Sprint 4: Implementação de permissões: <b>concluído</b> -Sprint 5,6,7 ,8 e 9: Implementação de cadastro de fornecedores: <b>concluído</b> -Sprint 10 e 11: Implementação de cadastro de requisições e aquisições: <b>concluída</b> -Sprint 12, 13, 14, 15 e16: Implementação de Cadastro de Aquisições (Adesão a Registro de Preços): <b>concluído</b> -Sprint 17: Implementação de Cadastro de Aquisições (Licitações -Demais modalidades): <b>concluído</b> -Sprint 18: Implementação de Cadastro de Aquisições (Pregões e Compra Direta): <b>concluído</b> -Sprint 19: Implementação de Cadastro de Aquisições (Partic em Registro de Preços): <b>concluído</b> -Sprint 20: Implementação de Cadastro Contratos e Aditivos Parte I): <b>concluído</b> -Sprint 21: Implementação de Cadastro Contratos e	70%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
							Aditivos Parte II): <b>concluído</b> -Sprint 22 e 23: Correção de defeitos identificados pela área de negócio: <b>concluído</b> - -Sprint 24: Alterações de estruturas de dados: <b>concluído</b> -Demais SPRINTS: <b>não iniciado</b> -Implantação: <b>não iniciado</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>		
257	Estudo de novas tecnologias de portais	GP: Stefano LT: Joice Figueiro	Plano de projeto em revisão	Sem custo		Posição 15/04: Foram estudadas 4 ferramentas. Decido aceitar proposta de consultoria HedHat e Gartner. Replanejar o projeto com o objetivo de licitar em agosto (para inserir no orçamento de 2017). Necessário realizar as POCs.	-Gerencia do projeto: <b>em andamento</b> -Planejamento preliminar: <b>concluído</b> -Estudo das ferramentas de portal: <b>em andamento</b> -Prova de conceito: <b>não iniciado</b> -Avaliação da POC: <b>não iniciado</b> -Finalização: <b>não iniciado</b>	57%	Em Execução
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	GP: Tiago Gomes	Plano de projeto aprovado em nov/2015	A definir	12/09/2016	Posição 15/04: Dashboard e relatório para a CSAUDE entregues e homologados. Primeira entrega da SEGESP realizada, aguardando a homologação pela área usuária para posteriormente prosseguir com os desenvolvimentos para esse setor (solicitar que	-Gerência do projeto: <b>em andamento</b> -Sprint 1 a 4 (Relatório Licenças-CSAUDE): <b>concluído</b> -Sprint 5 a 7 (Relatório Pessoas-SEGESP): <b>concluído</b> -Sprint 8 e 9 (Relatório Equipamentos-SGE): <b>concluído</b> -Sprint 10 e 11(Relatório Equipamentos-SGE):	39%	Em Execução



ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
						Férias negocie a homologação com o gestor da SEGESP) . Relatórios para a SGE em homologação.	<b>concluído</b> -Sprint 12 (Relatório-CSAUDE): <b>concluído</b> -Sprint 13 (Relatório-CSAUDE): <b>em andamento</b> -Demais Sprints: <b>não iniciado</b>		
400	Implantação do e-JUS2 em outros regionais	GP: André Farias	A Elaborar plano de projeto			Posição 15/04: em elaboração do plano de projeto.			Em planejamento
402	Férias online para Desembargadores	GP: Márcio Bystronski	Escopo aprovado			Posição 15/04: Retirado do escopo as férias da Alta Administração. Desenvolvimento concluído em final de outubro. Em análise dos itens que foram retornados pelo usuário sobre sua homologação. Projeto estava previsto para ser concluído ainda em 2015.	-Gerência do projeto: <b>em andamento</b> -Sprint 1, 2 e 3 (Estórias de usuários): <b>concluído</b> -Sprint 4 (Preparação do ambiente de desenvolvimento): <b>concluído</b> -Sprint 5 a 9 (Estórias de usuários): <b>concluído</b> -Sprint 10 e 11 (Homologação): <b>concluído</b> -Sprint 12, 13 e 14 (Correções e melhorias): <b>concluído</b> -Sprint 15 (Caixas postais de avisos e modelos de emails): <b>concluído</b> -Sprint 16 (Homologação final e elaboração de manual): <b>concluído</b> -Implantação: <b>não iniciado</b>	96%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
404	Implantação do SIGEP (antigo SGRH)	GP: Márcio Bystronski	A Elaborar plano de projeto		12/07/2016	Posição 15/04: Projeto organizado em 3 fases. Fases 1 e 2 em homologação pela SEGESP, até 30/maio. Fase 3 será entregue em 30/maio. Previsão do retorno sobre a homologação pela SEGESP em 10/08 e 30/09.	-Gerência do projeto: <b>em andamento</b> . -Análise inicial de requisitos: <b>concluído</b> -Desenvolvimento – FASE 1: <b>em andamento</b> -Desenvolvimento – FASE 2: <b>em andamento</b> -Desenvolvimento – FASE 3: <b>não iniciado</b>	65%	Em Execução
426	Concurso de Juízes	GP: Joice	Em elaboração do plano de projeto			Posição 15/04: projeto em andamento. Em elaboração do plano de projeto.			Em execução
428	Disponibilização de excedentes de penhora	GP: Joice	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
429	E-jus2 para o 1o Grau	GP: Tiago	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
430	Inteligência Jurisdicional	GP: Tiago	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
431	Melhorias no sistema GIGS	GP: Fábio Garcia	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
432	Sistema de apoio ao PJe	GP: Joice	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
433	Sistema de auditoria AUDI	GP: Márcio B.	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado

<b>ID</b>	<b>PROJETO</b>	<b>GP / LD (Gerente e Líder Técnico)</b>	<b>ACOMPANHAMENTO</b>	<b>CUSTO</b>	<b>PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>STATUS DAS ENTREGAS</b>	<b>% CONCLUSÃO</b>	<b>STATUS</b>
434	Mapeamento do desempenho das unidades Judiciárias de 1o Grau	GP: Tiago	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
435	eSocial	GP: Márcio B.	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
436	Cálculo do IR sobre o RRA	GP: Márcio B.	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
437	Interface PJe para Central de Mandados	GP: Joice	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
438	Automatização dos Logons	GP: Farias	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
439	Memória em tempo real	GP: Joice	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
440	Banco de Dados informativo das edificações do TRT4	GP: Márcio B.	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado

## GESTÃO DE TIC

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
213	<b>SGSI Implantação do sistema de Gestão de Segurança da Informação</b>	GP: Cleonice Condotta	Escopo aprovado	R\$215.000,00	05/02/2016	Posição 15/04: Todas etapas concluídas (Plan, Do, Check e Act). Última entrega do fornecedor realizada dia 05/fevereiro. Implantação concluída. Em encerramento do projeto.	<p>-Contratação: <b>concluído</b></p> <p>-Planejamento do projeto: <b>concluído</b></p> <p>- <u>Etapa Plan</u> (Workshop1, Política de segurança da informação, Metodologia de gestão de riscos, Análise e avaliação de riscos, Declaração de aplicabilidade e Planos de continuidade de negócio): <b>concluído</b></p> <p>-<u>Etapa implementação Do</u> (Workshop 2, Plano de tratamento de riscos, Teste do Plano de Continuidade Operacional, Testes do Plano de Recuperação de Desastres e Treinamento/ conscientização): <b>concluído</b></p> <p>-<u>Etapa verificação Check</u> (Workshop 3, Indicadores eficácia SGSI, Análise crítica do SGSI): <b>concluído</b></p> <p>-<u>Etapa melhorias Act</u> (Workshop 4, Metodologia de melhoria contínua do SGSI e Entrega metodologia de melhoria contínua): <b>concluído</b></p> <p>-<u>Encerramento da implantação do SGSI</u>: <b>concluído</b></p> <p>-Encerramento do projeto: <b>em andamento</b></p>	99%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
224	Definição e Formalização do Processo de Gestão de TI	GP: Ricardo K.	Escopo aprovado	Sem custo		Posição 15/04: Processo em etapa de regulamentação (PA em reavaliação pela Diretora da SETIC).	-Análise de requisitos: <b>concluído</b> -Modelagem: <b>concluído</b> -Regulamentação: <b>em andamento</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	55%	Em Execução
397	Mapeamento de novos processos ITIL - projeto nacional	GP: Ricardo K.	Plano de projeto aprovado	Projeto com custo		Projeto suspenso conforme registro de mudança em 27/11/2015. Suspenso até a atualização e utilização da nova versão do Assyst (expectativa de retomada na 2ª.quinzena de maio/2016).	-Plano do Projeto Aprovado: <b>concluído</b> -Diagnóstico de Processos: <b>concluído</b> -Modelagem de Processos: <b>suspenso</b>	48%	Suspenso
443	Curso EAD sobre PJe	GP: Pablo Barros	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
444	Manual amigável PJe	GP: Pablo Barros	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
445	Capacitação à distância em Segurança da Informação	GP: Cleonice Condotta	Em elaboração do plano de projeto			Posição 15/04: Em planejamento.			Em Planejamento

## INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
52	<b>Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)</b>	GP: Adriano Simioni LT: Ernani	Escopo aprovado	Sem custo em 2014 (equipamentos já adquiridos em anos anteriores)	02/10/2017	Projeto com dependência da SEMPRO. A aquisição de mais 9 racks está suspensa, até que o estoque seja esvaziado. Posição 15/04: Falta implantar em 12 localidades das 67 totais. Erechim estava prevista para dezembro. Uruguaiana implantada em novembro. Atualizar lista com as cidades e as pendências, para a Diretora da Setic decidir sobre o projeto.	-2012 (Carazinho, Vacaria, Rio Grande, Palmeira Missões): <b>concluído</b> -2013 (Frederico Westphalen, Torres, Panambi, Gravataí, Marau, Osório, Nova Prata): <b>Concluído</b> -2014/1 (Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Canoas, Capão da Canoa, Dom Pedrito, Encantado, Estancia Velha, Estelo, Estrela, Farroupilha, Itaqui, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, POA–Almox, POA–Big/Transporte/João Telles/Provenzano, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Rosa II, Santana do Livramento, São Gabriel, São Jerônimo, São Leopoldo II, São Lourenço do Sul, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Soledade, Taquara, Taquari, Tramandaí, Triunfo): <b>concluído</b> -2014/2 – Caxias e Guaíba: <b>concluído</b> -2015/1 – Sapucaia, Alegrete, Lajeado e São Borja: <b>concluído</b> -2015/1 – demais localidades: <b>em andamento</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	76%	Em Execução
105	<b>Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)</b>	GP: Adriano Simioni LT: Gustavo K.	Escopo aprovado	R\$609.076,44	19/12/2016	Posição 15/04: Contrato assinado dia 10/nov. Em negociação com o fornecedor para a instalação iniciar na metade do ano e ser concluída em novembro (a fim de pagarmos	-Redefinição do projeto: <b>concluído</b> -Análise de soluções: <b>concluído</b> -Contratação: <b>concluído</b> -Implantação: <b>em andamento</b> -Aceite do projeto: <b>não</b>	12%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
						somente 2 meses nesse ano).	<b>iniciado</b>		
202	<b>Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD</b>	GP: Adriano Simioni LT: Ernani	Escopo aprovado	R\$ 1.107.984,00 + 367.555,40 (20 servidores) Todo valor contido no orçamento 2013	09/10/2017	Dependência da SEMPRO. Posição 15/04: Atendidos 59 foros, restando 2 para atender (Canoas e São Leopoldo). São Leopoldo: aguardando SEMPRO para movimentação dos racks. Canoas: pendência SETIC e SEMPRO. Aguardando definições da nova diretoria da SEMPRO. Atualizar lista com as localidades e as pendências, para a Diretora da Setic decidir sobre o projeto.	- 52 Foros atendidos até 08/2014: <b>concluído</b> -Foros atendidos a partir de 08/2014 – Caxias, São Jerônimo, Esteio, Santa Rosa, Santa Rosa II, Sapucaia e Erechim: <b>concluído</b> -Demais foros atendidos a partir de 08/2014: <b>em andamento</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	97%	Em Execução
208	<b>Revisão do serviço de time stamping - PDDE</b>	GP: Adriano Simioni LT: André Livi	Escopo aprovado	R\$414.974,40	18/01/2016	Posição 15/04: instalação dos equipamentos concluída em 18/jan/2016. Termo de aceite aprovado. Encaminhar o termo de encerramento.	-Análise de viabilidade: <b>concluído</b> -Licitação: <b>concluído</b> -Execução: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>em andamento</b>	97%	Em Execução
209	<b>Padronização do diretório de usuários</b>	GP: Adriano Simioni LT: Volnei Susin	Escopo aprovado	A definir		Havia sido suspenso em agosto, até a regulamentação do licenciamento Microsoft para equipamentos servidores e usuários (licenças já recebidas). No entanto, deve	-Criação do grupo de trabalho: <b>concluído</b> -Estudo técnico do cenário atual: <b>concluído</b> -Estudo de possíveis cenários e montagem de laboratório: <b>concluído</b> -Estratégia de migração a	52%	Suspenso

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
						permanecer suspenso pois depende da instalação dos links redundantes, o qual tem previsão para instalação/reavaliação em novembro/16.	ser adotada: <b>suspensa</b> -Licitação: <b>suspensa</b> -Execução: <b>suspensa</b>		
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	GP: Adriano Simioni LT: Ernani	Escopo aprovado	Custo de aquisição dos nobreaks: R\$82 mil (a confirmar)		Posição 15/04: Projeto deve ser continuado sem aquisição, com reaproveitamento dos nobreaks existentes.	-Análise de viabilidade: <b>concluído</b> -Licitação: <b>em andamento</b> -Execução—prédios interior: <b>não iniciado</b> -Execução—prédios capital: <b>não iniciado</b>	17%	Em Execução
211	Firewall aplicação de	GP: Adriano Simioni	Escopo a definir	R\$1.300.000,00		Posição 15/04: Projeto reaberto. Trabalho em conjunto dos TRTs (4, 1, 14 e 15), com gestão do TRT4. Equipamentos recebidos dia 03/março. Em homologação para posteriormente, entrar em produção.	-Análise técnica: <b>concluído.</b> -Licitação: <b>concluída</b> -Execução: <b>em andamento</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	63%	Em Execução
212	Alta disponibilidade de serviços	GP: Adriano Simioni LT: Eric	Escopo a redefinir	Sem custo.	31/03/2016	Posição 15/04: Escopo reprovado, a redefinir. GP fazendo mapeamento da disponibilidade existente por serviço, para apresentar à Diretora da SETIC e definir sobre o andamento do projeto (em atraso—previsão era para 31/03/16).	- HA Banco Oracle: <b>concluído</b> - Análise do ambiente (Foco HA): <b>em andamento</b> - Entrega CPD2 (dependência externa): <b>concluído</b> - Adequação para alta disponibilidade: <b>não iniciado (relatório de</b>	75%	Em Execução



ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
							necessidades)		
321	Renovação e ampliação dos servidores dos DataCenters de Porto Alegre - 2015	GP: Adriano Simioni LT: Germano	Escopo aprovado	R\$3.310.795,00 (orçamento aprovado)		Posição 15/04: equipamentos adquiridos na fase 3 já recebidos. Instalados em 25/fev. Necessário a configuração dos servidores, para sua efetiva utilização (ainda sem data definida).	-Análise da demanda: <b>concluído</b> -Licitação: <b>concluído</b> -Execução do projeto Fase 1: <b>concluído</b> -Execução do projeto Fase 2: <b>concluído</b> -Execução do projeto Fase 3: <b>em andamento</b>	99%	Em Execução
389	Substituição dos RACK's de TI no Foro POA	GP: Adriano Simioni	A elaborar plano de projeto	A definir		PROJETO PARADO EM SET/2015 DEVIDO AO CORTE DE VERBA DA SEMPRO. Paulo Mendes vai verificar com a Natacha se realmente é projeto ou poderia ser uma recomendação da TI para a SEMPRO, via processo administrativo.	-Análise de viabilidade de projeto: <b>em andamento</b> -Licitação: <b>não iniciado</b> -Execução do projeto: <b>não iniciado</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	24%	Suspenso
390	Renovação de No-Break Interior do Estado	GP: Adriano Simionil	Escopo a definir	A definir	08/04/2016	Posição 15/04: implantado em todas as localidades (finalizado em 08/04/16). Encaminhar encerramento do projeto.	-Análise de viabilidade do projeto: <b>concluído</b> -Licitação: <b>concluído</b> -Execução do projeto: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>em andamento</b>	95%	Em Execução
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	GP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	R\$500.000,00		Posição 15/04: Alta prioridade. Termo de referência será elaborado pela SEMPRO. Encaminhar informações para CGTIC até 30/junho, para que a licitação seja	-Análise de Viabilidade da Solução: <b>em andamento</b> -Licitações: <b>não iniciado</b> -Execução: <b>não iniciado</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	8%	Em Planejamento

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
						encaminhada até agosto.			
392	Expansão do switch core BD para 20 GB	GP: Adriano Simioni	A solicitar aprovação do plano de projeto	R\$200.000,00	17/05/2016	Posição 15/04: Escopo alterado (necessário aprovação do plano de projeto-Diretora da SETIC). Suporte renovado a partir de 28/fev/2016. Equipamentos entregues dia 29/março, em instalação.	-Análise de viabilidade da solução: <b>concluído</b> -Licitações: <b>concluído</b> -Execução: <b>em andamento</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	67%	Em Execução
393	Renovação do parque de servidores de rede no interior	GP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	R\$599.600,00 (pago e lançado no Trace)	14/03/2016	Posição 15/04: instalações concluídas em 14/03/16. Aguardando aprovação no termo de aceite. Encaminhar termo de encerramento do projeto.	-Análise de mercado: <b>concluído</b> -Licitações: <b>concluído</b> -Execução: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>em andamento</b>	94%	Em Execução
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	GP: Adriano Simioni	Escopo aguardando aprovação	R\$600.000,00 (registrar custo para renovação do citrix)		Posição 15/04: Não aprovada aquisição de nova solução, apenas atualização da solução atual. Registro de mudança realizado em 10/dez. Permanece em testes da atualização (necessário novo registro de mudança).	-Análise de viabilidade da solução: <b>concluído</b> -Instalação do novo ambiente definido: <b>em andamento</b> -Testes: <b>em andamento</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	91%	Em Execução
441	Aumento dos links de internet	GP: Adriano Simioni LT: Gustavo K.	A Elaborar plano de projeto	Terá custo – a estimar		Posição 15/04: ampliar links com novos contratos e melhores valores. Encaminhar licitação o quanto antes, visto que terá possível economia.			Em planejamento

<b>ID</b>	<b>PROJETO</b>	<b>GP / LD (Gerente e Líder Técnico)</b>	<b>ACOMPANHA MENTO</b>	<b>CUSTO</b>	<b>PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>	<b>STATUS DAS ENTREGAS</b>	<b>% CONCLU SÃO</b>	<b>STATUS</b>
442	Renovação de storages	GP: Adriano Simioni LT: Germano	Em elaboração do plano de projeto	R\$2 milhões		Posição 15/04: reunião de kickoff planejada para 20/abril. Remeter para licitação até final de agosto.			Em planejamento

**PROJETOS CANCELADOS na elaboração do PDTI 2016-2017**

<b>Área</b>	<b>ID</b>	<b>PROJETO</b>	<b>GP / LP (Gerente e Líder Técnico)</b>	<b>CUSTO</b>	<b>OBSERVAÇÃO</b>
CAU	243	Aquisição de tablets com sistema operacional Windows para os magistrados	GP: Charles Falcão	R\$ 900.000,00	Cancelado na elaboração do PDTI2016.
CAU	396	Pje Vivencial	GP: Charles Falcão		Cancelado na elaboração do PDTI2016. Novo projeto aprovado: Aprendendo sobre o TRT.
CDS	259	Melhorias no PDEP (Processos de Depósito e Memorial)	GP: Rubilar Jardim LP: Marcio Bystronski	Possibilidade de uso da fábrica de software dependendo da forma de implementação.	Cancelado na elaboração do PDTI2016.
CDS	401	SIGA – Módulo de avaliação de desempenho	GP: Márcio Bystronski		Cancelado na elaboração do PDTI2016. Projeto passou para responsabilidade do TRT6, desde 01/09/2015.
CDS	403	Sistema para controle de envio de processos RR recebidos do TST	GP: Stefano		Cancelado na elaboração do PDTI2016. Confirmado em 13/04 com o usuário que o projeto não é mais necessário.

## PROJETOS CONCLUÍDOS EM 2015

Área	ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS
CAU	395	TI mais próxima do usuário	GP: Charles Falcão	Plano de projeto aprovado		24/11/2015	Último treinamento realizado em 24/nov. Termo de aceite assinado em 10/dez. Aguardando aprovação do termo de encerramento.	-Planejamento dos treinamentos: <b>concluído</b> -Conteúdo dos treinamentos e material didático: <b>concluído</b> -Divulgação institucional do projeto: <b>concluído</b> -Treinamentos: <b>concluídos</b> -Encerramento: <b>em andamento</b>
CDS	254	BI - SECONTI	GP: Paulo do Carmo LP: Tiago Gomes	Escopo aprovado	R\$60mil (já contido no pacote de horas com a First Decision).  ***custo não utilizado***	07/07/2015	Projeto concluído conforme a data planejada (07/07/2015). CONCLUÍDO NO TRACE.	-Sprint 1,2, 3 e 4- Mapeamento tabelas Folha: <b>concluído</b> -Sprint 5 e 6-Criação do Universo RHFolha V1.0: <b>concluído</b> -Sprint 7-Relatório Aposentadoria v1.0: <b>concluído</b> -Sprint 8-Dashboard Aposentadoria: <b>concluído</b> -Sprint 9-Entrega Relatório Aposentadoria: <b>concluído</b> -Sprint 10-Homologação pelo cliente: <b>concluído</b> -Sprint 11 e 12-Relatório Aposentadoria - v2.0: <b>concluído</b> -Sprint 13 e 14- Impedimento: <b>concluído</b> -Sprint 15-Entrega Relatório Aposentadoria - v3.0: <b>concluído</b> -Sprint 16,17,18,19 e 20- Relatório FC's e CJ's: <b>concluído</b> -Sprint 21-Ajustes bugs: <b>concluído</b> -Sprint 22-Ajustes finais: <b>concluído</b> -Entrega do projeto: <b>concluído</b> -Encerramento do projeto: <b>concluído</b>
CDS	324	inFOR - Módulo do Arquivo	GP: Lucia Speranza LP: Luiz Estivalet	Escopo aprovado	Sem custo.	13/08/2015	Liberado para uso em POA dia 15/05 e para uso no Interior dia 13/08/2015. Lições aprendidas já	-SPRINT 1-ARQUIVAMENTO SEM LOTE (VT): <b>concluído</b> -SPRINT 2-PREPARAÇÃO DOS LOTES (VT): <b>concluído</b>

Área	ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS
							atualizadas no Portal. Aguardando o aceite do projeto pela Natacha.	-SPRINT 3-PREPARAÇÃO DOS LOTES (VT) E RECEBIMENTO DE LOTES (ARQUIVO): <b>concluído</b> -SPRINT 4-RECEBIMENTO LOTES E REGISTRO DE ANDAMENTOS (ARQUIVO): <b>concluído</b> -SPRINT 5-REGISTRO DE ANDAMENTOS E MANUTENÇÃO DE LOTES (ARQUIVO): <b>concluído</b> -SPRINT 6-MANUTENÇÃO DE LOTES E CONSULTA PEDIDOS DA VT (ARQUIVO): <b>concluído</b> -SPRINT 7-REGISTRAR ANDAMENTOS DE PROCESSOS: <b>concluído</b> -SPRINT 8-CONSULTA PEDIDOS DA VT E CORREÇÃO DE BUGS: <b>concluído</b> -Implantação: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>
CDS	343	E-jus2 – Integração com Pje-JT	GP: Fábio Garcia	Escopo aprovado	Sem custo	16/07/2015	Projeto concluído em 16/07/2015. CONCLUÍDO NO TRACE.	-Gerenciamento do projeto: <b>concluído</b> -Desenvolvimento: <b>concluído</b> -Homologação: <b>concluído</b> -Encerramento do produto: <b>concluído</b> -Encerramento do projeto: <b>concluído</b>
CDS	366	Programa de apoio aos magistrados do PJe-JT	GP: Joice Figueiro LP: Stefano	Escopo a definir	Sem custo (desenvolvimento interno)	09/02/2015	Funcionalidade disponibilizada em produção, dia 09/fev. PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE.	-Análise e desenvolvimento: <b>concluído</b> -Implantação: <b>concluído</b> -Encerramento do projeto: <b>concluído</b>
CDS	385	Folha de pagamento fechamento normal	GP: Márcio Bystronski	Escopo aprovado	Sem custo	11/02/2015	Disponível em produção dia 11/fev/15. CONCLUÍDO NO TRACE.	-Desenvolvimento sprints: <b>concluído</b> -Encerramento do projeto: <b>concluído</b>
CDS	399	Pje Health	GP: André Farias	Plano de projeto aprovado		02/10/2015	Solução implantada em 02/out/2015. PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE.	-Plano do Projeto Aprovado: <b>concluído</b> -Encerramento do projeto: <b>concluído</b> -Aplicativo Pje-JT Health Agent: <b>concluído</b> -Implementação de envio de resultados:

Área	ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS
							Pós-projeto: medição dos benefícios concluída.	<b>concluído</b> -Aplicativo Pje-JT Health Monitor: <b>concluído</b> -Homologação da solução: <b>concluído</b> -Implantação: <b>concluído</b>
CDS	407	Boletim Mensal do Tribunal - BMT	GP: Tiago	Plano de projeto aprovado		07/12/2015	Produto entregue em 07/dez/2015. PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE.  Pós-projeto: medição dos benefícios concluída.	-Gerência do projeto: <b>concluído</b> -Sprints 1 a 9: <b>concluído</b>
CGTIC	214	Portal de Governança de TIC	GP: Ricardo K.	Escopo aprovado	R\$50.000,00 (não será utilizado-desenvolvimento interno)	15/06/2015	PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE.  Pós-projeto: em medição dos benefícios.	-Levantamento de informações: <b>concluído</b> -Análise dos requisitos: <b>concluído</b> -Coleta de dados: <b>concluído</b> -Implementação: <b>concluído</b> -Liberação: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>concluído</b>
CGTIC	215	Revisão da metodologia de gerenciamento de projetos	GP: Deise Albino	Escopo aprovado	R\$73.950,00	16/11/2015	PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE.  Pós-projeto: em medição dos benefícios.	-Plano de implantação: <b>concluído</b> -Revisão da metodologia de GP: <b>concluído</b> -Modelo de gestão de portfólio de projetos: <b>concluído</b> -Disseminação da metodologia: <b>concluído</b> -Disseminação para a Organização: <b>concluído</b> -Acompanhamento projeto piloto: <b>concluído</b> - Encerramento: <b>concluído</b>
CGTIC	216	Revisão dos processos de planejamento de contratações e	GP: Simone Goulart	Escopo a definir	Sem custo.	Outubro/2015	Em outubro/2014, realizada revisão do processo de contratação para adequação pontual à resolução do CNJ. Em outubro/2015, processo de	-Processos de planejamento de contratações e gestão de contratos de TIC revisados: <b>concluído</b>

Área	ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS
		gestão de contratos de TIC					gestão revisado e encaminhado PA para aprovação da Presidência. Necessário documentar o projeto no Trace.	
CGTIC	350	Senha Segura	GP: Cleonice Condotta	Escopo aprovado	Sem custo.	03/julho/2015	Projeto concluído em 03/julho/2015. CONCLUÍDO NO TRACE.	-Planejamento do projeto: <b>concluído</b> -Planejamento das atividades técnicas: <b>concluído</b> -Conscientização de usuários e configuração: <b>concluído</b> - Implantação de medidas para utilização obrigatória de senhas seguras: <b>concluído</b> -Monitoramento do ambiente: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>concluído</b>
CIT	163	Reforma do CPD2	GP: Volnei Susin LP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	R\$1.067.114,97 (realizado)	23/10/2015	PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE.  Pós-projeto: medição dos benefícios concluída.	-Projeto executivo: <b>concluído</b> -Projeto básico: <b>concluído</b> -Contratação: <b>concluído</b> -Execução: <b>concluído</b> - Moving: <b>concluído</b> -Entrega das chaves: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>concluído</b>
CIT	204	Atualização da telefonia nos foros Interior do Estado	GP: Ernani LP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	Realizado: R\$808.876,00	11/dez/2015	PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE.  Pós-projeto: medição dos benefícios concluída.	-Análise de mercado: <b>concluído</b> -Licitação: <b>concluído</b> -Execução: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>concluído</b>
