



# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO PROJETOS DA SETIC PDTI 2016-2017



Data: 15/Maio/2016  
v 1.0

## 1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria



## 2) Percentual de conclusão dos projetos – por Coordenadoria

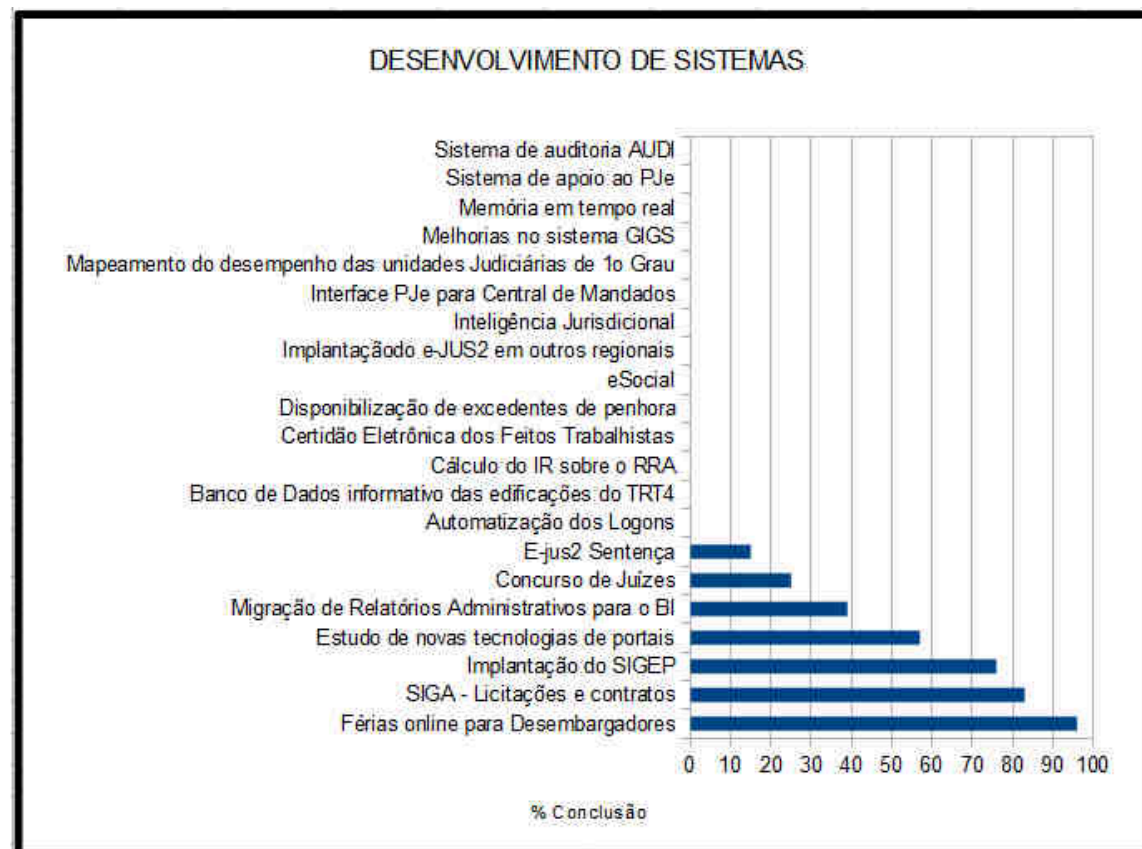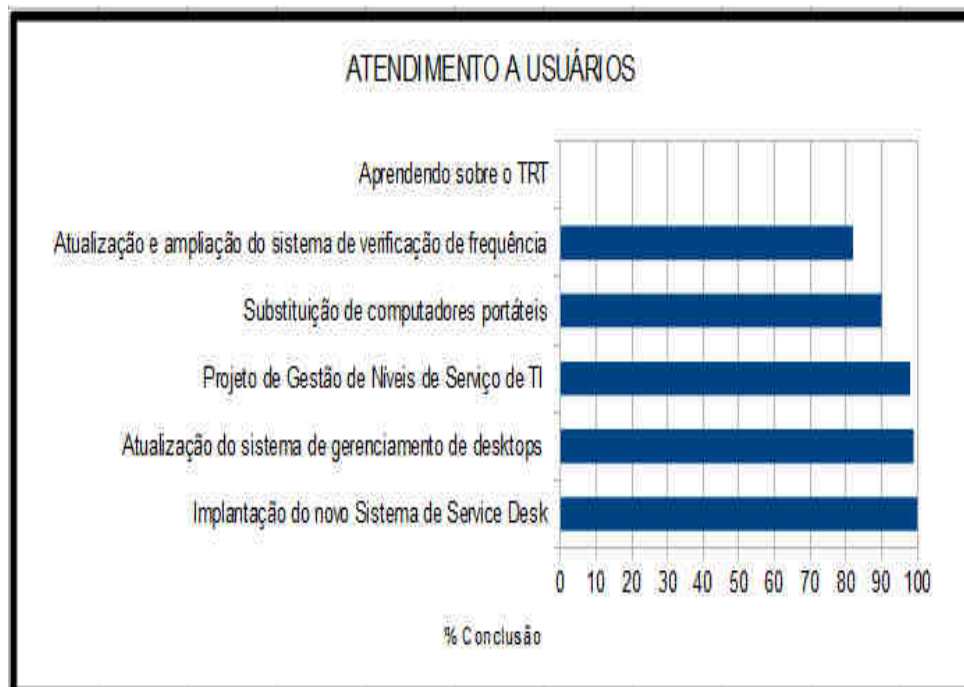

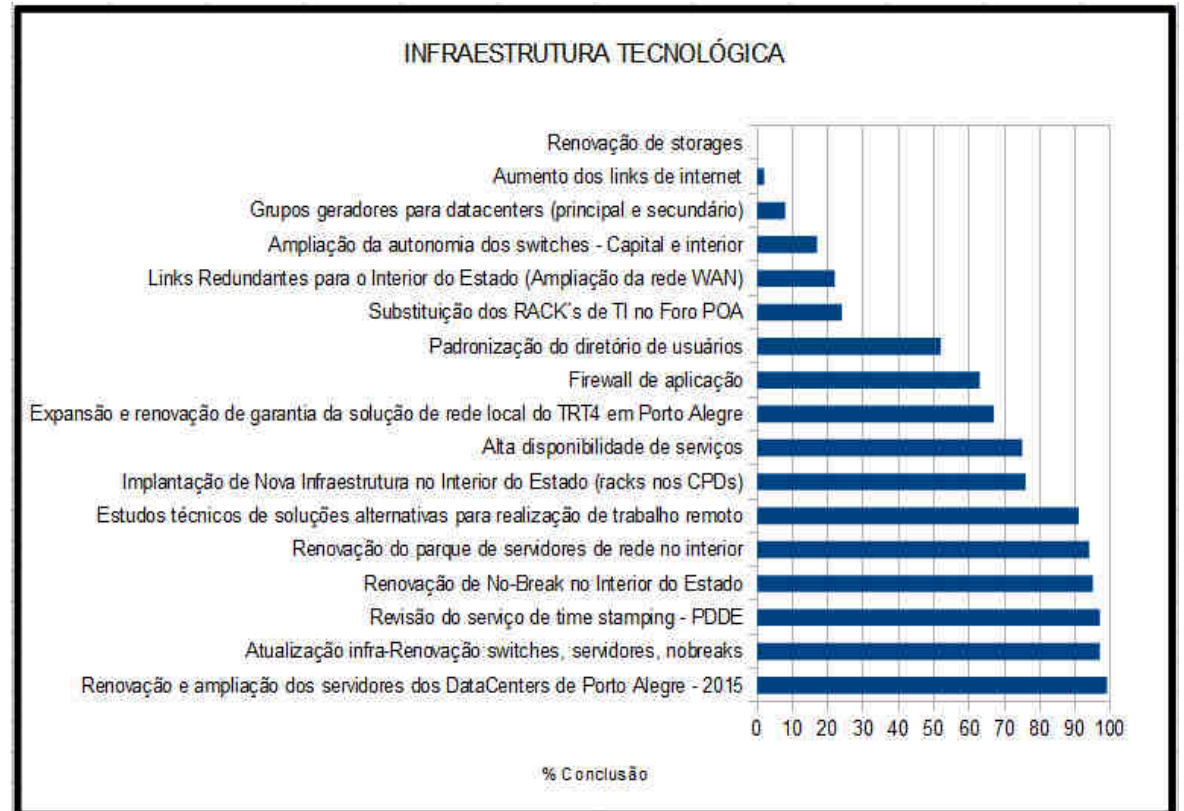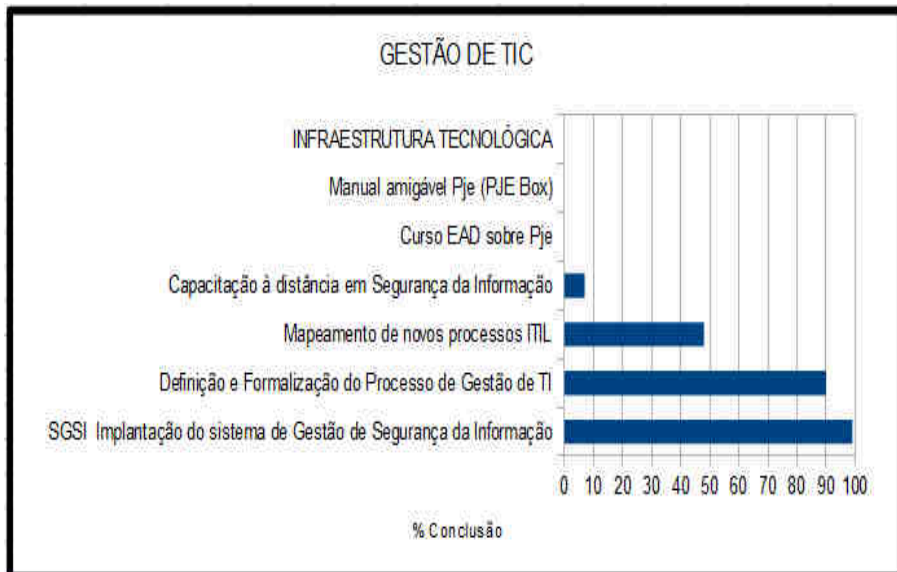

### 3) Situação dos projetos – por Coordenadoria

#### ATENDIMENTO A USUÁRIOS

ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLU SÃO	STATUS
195	<b>Projeto de Gestão de Níveis de Serviço de TI</b>	GP: Charles Falcão LT: Denilson Quadros	Escopo aprovado	Sem Custo	11/04/2016	Posição 15/05: Assyst implantado em 18/maio/16. PA encaminhado para aprovação da Presidência em abril/16 com a definição dos indicadores e métricas (a parte referente ao catálogo já tinha sido aprovada). Enviado Termo de Aceite em 11/05, aguardando a aprovação. Após, providenciar o encerramento do projeto.	Elaboração do catálogo de serviços: <b>concluído</b> -Aprovação da proposta de catálogo: <b>concluído</b> -Implantação do Assyst: <b>concluído</b> -Elaboração de indicadores e métricas: <b>concluído</b> -Implantação: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	98%	Em Execução
199	<b>Atualização do sistema de gerenciamento de desktops</b>	GP: Charles Falcão LT: Ana Moreira	Escopo aprovado	Obs.: O custo está contido no projeto 201.	20/01/2016	Posição 15/05: Dado aceite do produto (Assyst) para o fornecedor, em 20/01/2016. Por decisões técnicas, algumas funcionalidades previstas no escopo inicial não serão utilizadas no Assyst. Enviado Termo de Aceite em 11/05, aguardando a aprovação. Após, providenciar o encerramento do projeto.	-KickOff: <b>concluído</b> -Workshop 1: <b>concluído</b> -Workshop 2: <b>concluído</b> -Workshop 3: <b>concluído</b> -Implantação e homologação: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	99%	Em Execução
201	<b>Implantação do novo Sistema de</b>	GP: Ricardo K.	Escopo aprovado	R\$960.334,55	20/01/2016	Será necessário custo adicional com licenças	-Instalação do software: <b>concluído</b>	100%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
	Service Desk			Obs.: Esse custo é referente aos projetos 201 e 199  Será necessário custo adicional com licenças (R\$263.925,00)		(R\$263.925,00). Posição 15/05: Assyst implantado em 18/maio. Dado aceite do produto (Assyst) para o fornecedor, em 20/01/2016. Operação assistida será sob demanda. Reunião de encerramento realizada. Termos de Aceite e de Encerramento aprovados (anexar no Trace).	-Implantação processos grupo 1: <b>concluído</b> -Implantação processos grupo 2: <b>concluído</b> -Implantação processos grupo 3: <b>concluído</b> -Retomada da implantação: <b>concluído</b> -Implantação do software: <b>concluído</b> -Capacitação: <b>concluído</b> -Apontamento de atraso e inexecução: <b>suspenso</b> -Encerramento: <b>concluído</b>		
242	Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	GP: Charles Falcão LT: Ana Moreira	A Elaborar plano de projeto	R\$ 222.650,00 (realizado - Nfs lançadas no Trace)  R\$300.000,00 (previsto)		Posição 15/05: Contrato assinado em 13/out/15. Projeto piloto até 29/04. Aguardando manifestação da DG sobre as datas (cronograma) para substituição dos equipamentos de POA e a implantação dos prédios que não possuem relógio ponto atualmente. Elaborar plano de projeto com nova data.	-Estudo da solução: <b>concluído</b> -Licitação: <b>concluído</b> -Entrega de equipamentos e software: <b>concluído</b> -Treinamento: <b>concluído</b> -Adaptação e definição de processos: <b>concluído</b> -Implantação: <b>em andamento</b> -Modificações no sistema de frequência: <b>não iniciado</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	82%	Em Execução
316	Substituição de computadores portáteis	GP: Charles Falcão LT: Paula Medaglia	Escopo aprovado	R\$1.355.053,50 (realizado - Nfs lançadas no Trace)		Posição 15/05: 100% dos equipamentos entregues, sendo 281 para Magistrados (3 sinalizaram não ter	-Criação de imagem: <b>concluído</b> -Preparação e distribuição dos equipamentos:	90%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
				R\$1.327.005,00 (previsto). A esse custo foi adicionado o valor de 30 dockstations: R\$28.048,50)		interesse em receber) e 17 para a área Administrativa. Retiradas 23 das 26 dockstations. Encerrar o projeto com pendência de retirada dessas 3 dockstations.	<b>concluído</b> -Compra / Distribuição de dock station para magistrados: <b>em andamento</b> -Redistribuição dos equipamentos antigos: <b>em andamento</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>		
425	<b>Aprendendo sobre o TRT</b>	GP: Charles Falcão	Em elaboração do plano de projeto			Posição 15/05: em elaboração do plano de projeto.			Em planejamento

## DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHA MENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLU SÃO	STATUS
256	<b>SIGA Licitações contratos</b>	- GP: Marcio e Bystronski	Plano de projeto em revisão	Sem custo (custo inicial previsto com a fábrica não será utilizado – desenvolvimento interno)	30/06/2016	Posição 15/05: Definido em reunião com a PO (Daniela Vaz) e Diretora da SETIC, que o projeto só será concluído com a liberação dos itens que faltam (retroalimentação; migração dos dados; alertas; e integração com o sistema ADM). Realizando gestão de mudança, com previsão de conclusão do projeto para 30/junho/2016.	-Análise de requisitos: <b>concluído</b> -Sprint 1 e 2-Implementação da arquitetura básica do sistema: <b>concluído</b> -Sprint 3: Implementação de webcomponentes (view): <b>concluído</b> -Sprint 4: Implementação de permissões: <b>concluído</b> -Sprint 5,6,7 ,8 e 9: Implementação de cadastro de fornecedores: <b>concluído</b> -Sprint 10 e 11: Implementação de cadastro de requisições e aquisições: <b>concluído</b> -Sprint 12, 13, 14, 15 e16: Implementação de Cadastro de Aquisições (Adesão a Registro de Preços): <b>concluído</b> -Sprint 17: Implementação de Cadastro de Aquisições (Licitações -Demais modalidades): <b>concluído</b> -Sprint 18: Implementação de Cadastro de Aquisições (Pregões e Compra Direta): <b>concluído</b> -Sprint 19: Implementação de Cadastro de Aquisições (Partic em Registro de Preços): <b>concluído</b> -Sprint 20 e 21: Implementação de Cadastro Contratos e Aditivos Parte I e II): <b>concluído</b> -Sprint 22 e 23: Correção de	83%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
							defeitos identificados pela área de negócio: <b>concluído</b> -Sprint 24: Alterações de estruturas de dados: <b>concluído</b> -Sprint 25 a 28: Alterações em Aquisições – Parte I a IV: <b>concluído</b> -Sprint 29 a 32: Alterações em Contratos – Parte I a IV: <b>concluído</b> -Sprint 33: Alterações em Aditivos de Contratos – Parte I: <b>em andamento</b> -Demais SPRINTS: <b>não iniciado</b> -Implantação: <b>não iniciado</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>		
257	Estudo de novas tecnologias de portais	GP: Stefano LT: Joice Figueiro	Plano de projeto em revisão	Sem custo		Posição 15/05: Foram estudadas 4 ferramentas. Decidido aceitar proposta de consultoria HedHat e Gartner. Replanejar o projeto com o objetivo de licitar em agosto (para inserir no orçamento de 2017). Necessário realizar as POCs. Projeto parado desde abril.	-Gerencia do projeto: <b>em andamento</b> -Planejamento preliminar: <b>concluído</b> -Estudo das ferramentas de portal: <b>em andamento</b> -Prova de conceito: <b>não iniciado</b> -Avaliação da POC: <b>não iniciado</b> -Finalização: <b>não iniciado</b>	57%	Em Execução
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	GP: Tiago Gomes	Plano de projeto aprovado em nov/2015	A definir	12/09/2016	Posição 15/05: Dashboard e relatório para a CSAUDE entregues e homologados. Dashboard entregue para a SEGESP, ainda não	-Gerência do projeto: <b>em andamento</b> -Sprint 1 a 4 (Relatório Licenças-CSAUDE): <b>concluído</b> -Sprint 5 a 7 (Relatório Pessoas-SEGESP):	39%	Em Execução



ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
						homologado. Para dar andamento ao projeto para esse setor, novas informações começaram a ser acrescentadas nessa entrega independente do retorno da homologação. No entanto, essa atividade está suspensa até o retorno da servidora Luciana (SDS2), que está em licença saúde. Relatórios para a SGE em homologação. Atualizar cronograma no Trace.	<b>concluído</b> -Sprint 8 e 9 (Relatório Equipamentos-SGE): <b>concluído</b> -Sprint 10 e 11(Relatório Equipamentos-SGE): <b>concluído</b> -Sprint 12 (Relatório-CSAUDE): <b>concluído</b> -Sprint 13 (Relatório-CSAUDE): <b>em andamento</b> -Demais Sprints: <b>não iniciado</b>		
400	Implantação do e-JUS2 em outros regionais	GP: André Farias	A Elaborar plano de projeto			Posição 15/05: kick-off realizado na semana de 18/abril.			Em planejamento
402	Férias online para Desembargadores	GP: Márcio Bystronski	Escopo aprovado			Posição 15/05: Retirado do escopo as férias da Alta Administração. Desenvolvimento concluído em final de outubro. Em análise dos itens que foram retornados pelo usuário sobre sua homologação. Projeto estava previsto para ser concluído ainda em 2015.	-Gerência do projeto: <b>em andamento</b> -Sprint 1, 2 e 3 (Estórias de usuários): <b>concluído</b> -Sprint 4 (Preparação do ambiente de desenvolvimento): <b>concluído</b> -Sprint 5 a 9 (Estórias de usuários): <b>concluído</b> -Sprint 10 e 11 (Homologação): <b>concluído</b> -Sprint 12, 13 e 14 (Correções e melhorias):	96%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
							<b>concluído</b> -Sprint 15 (Caixas postais de avisos e modelos de emails): <b>concluído</b> -Sprint 16 (Homologação final e elaboração de manual): <b>concluído</b> -Implantação: <b>não iniciado</b>		
404	Implantação do SIGEP (antigo SGRH)	GP: Márcio Bystronski	A Elaborar plano de projeto			Posição 15/05: Projeto organizado em 3 fases. Fase 1 em homologação pela SEGESP até 10/junho. Fase 3 será entregue em 12/maio. Previsão do retorno sobre a homologação pela SEGESP fase 1 e 2 em 10/agosto e retorno total da homologação em 23/setembro.	-Gerência do projeto: <b>em andamento.</b> -Análise inicial de requisitos: <b>concluído</b> -Desenvolvimento – FASE 1: <b>em andamento</b> -Desenvolvimento – FASE 2: <b>em andamento</b> -Desenvolvimento – FASE 3: <b>concluído</b> -Homologações e correções: <b>em andamento</b>	76%	Em Execução
426	Concurso de Juízes	GP: Joice	Plano de projeto aguardando aprovação			Posição 15/05: projeto em andamento. Aguardando aprovação do plano de projeto pela Natacha.	-Inscrição Preliminar: <b>em andamento</b> -Primeira Etapa–Prova Objetiva: <b>não iniciada</b> -Segunda Etapa-Provas Escritas: <b>não iniciada</b> -Terceira Etapa-Inscrição definitiva: <b>não iniciada</b> -Quarta Etapa-Prova Oral: <b>não iniciada</b> -Quinta Etapa-Avaliação de Títulos: <b>não iniciada</b> -Gerenciamento do	25%	Em execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
							Projeto: <b>em andamento</b>		
428	Disponibilização de excedentes de penhora	GP: Joice	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
429	E-jus2 Sentença	GP: Tiago	Plano de projeto em revisão			Posição 15/05: Atualizar plano de projeto e refletir entregas no cronograma.			Em Execução
430	Inteligência Jurisdicional	GP: Tiago	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
431	Melhorias no sistema GIGS	GP: Fábio Garcia	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
432	Sistema de apoio ao PJe	GP: Joice	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
433	Sistema de auditoria AUDI	GP: Márcio B.	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
434	Mapeamento do desempenho das unidades Judiciárias de 1o Grau	GP: Tiago	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
435	eSocial	GP: Márcio B.	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
436	Cálculo do IR sobre o RRA	GP: Márcio B.	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
437	Interface PJe para Central de	GP: Joice	A Elaborar plano de						Não Iniciado

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
	<b>Mandados</b>		projeto						
438	<b>Automatização dos Logons</b>	GP: Farias	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
439	<b>Memória em tempo real</b>	GP: Joice	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
440	<b>Banco de Dados informativo das edificações do TRT4</b>	GP: Márcio B.	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
446	<b>Certidão Eletrônica dos Feitos Trabalhistas</b>	GP: Luiz Estivalet	Em elaboração do plano de projeto			Posição 15/05: Em elaboração do plano de projeto.			Em Planejamento

## GESTÃO DE TIC

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
213	<b>SGSI Implantação do sistema de Gestão de Segurança da Informação</b>	GP: Cleonice Condotta	Escopo aprovado	R\$215.000,00	01/06/2016	Posição 15/05: Todas etapas concluídas (Plan, Do, Check e Act). Última entrega do fornecedor realizada dia 05/fevereiro. Implantação concluída. Em formalização da análise crítica junto à Presidência, para posteriormente encerrar o projeto.	<p>-Contratação: <b>concluído</b></p> <p>-Planejamento do projeto: <b>concluído</b></p> <p>- <u>Etapa Plan</u> (Workshop1, Política de segurança da informação, Metodologia de gestão de riscos, Análise e avaliação de riscos, Declaração de aplicabilidade e Planos de continuidade de negócio): <b>concluído</b></p> <p>-<u>Etapa implementação Do</u> (Workshop 2, Plano de tratamento de riscos, Teste do Plano de Continuidade Operacional, Testes do Plano de Recuperação de Desastres e Treinamento/ conscientização): <b>concluído</b></p> <p>-<u>Etapa verificação Check</u> (Workshop 3, Indicadores eficácia SGSI, Análise crítica do SGSI): <b>concluído</b></p> <p>-<u>Etapa melhorias Act</u> (Workshop 4, Metodologia de melhoria contínua do SGSI e Entrega metodologia de melhoria contínua): <b>concluído</b></p> <p>-<u>Encerramento da implantação do SGSI</u>: <b>em andamento</b></p> <p>-Encerramento do projeto: <b>em andamento</b></p>	99%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
224	Definição e Formalização do Processo de Gestão de TI	GP: Ricardo K.	Escopo aprovado	Sem custo	11/05/2016	Posição 15/05: Processo regulamentado em 11/05/16. Encaminhar termo de aceite e de encerramento.	-Análise de requisitos: <b>concluído</b> -Modelagem: <b>concluído</b> -Regulamentação: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>em andamento</b>	90%	Em Execução
397	Mapeamento de novos processos ITIL - projeto nacional	GP: Ricardo K.	Plano de projeto aprovado	Projeto com custo		Projeto suspenso conforme registro de mudança em 27/11/2015. Suspenso até a atualização e utilização da nova versão do Assyst (expectativa de retomada na 2ª.quinzena de maio/2016).	-Plano do Projeto Aprovado: <b>concluído</b> -Diagnóstico de Processos: <b>concluído</b> -Modelagem de Processos: <b>suspenso</b>	48%	Suspenso
443	Curso EAD sobre PJe	GP: Pablo Barros	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
444	Manual amigável Pje (PJE Box)	GP: Pablo Barros	A Elaborar plano de projeto						Não Iniciado
445	Capacitação à distância em Segurança da Informação	GP: Cleonice Condotta	Plano de projeto a aprovar		27/09/2016	Posição 15/05: Reunião de Kick-off realizada em 13/maio.	-Gerenciamento do Projeto: <b>em andamento</b> -Apresentação da proposta de projeto para a SEGESP: <b>concluído</b> -Elaboração do material para Capacitação: <b>em andamento</b> -Avaliação viabilidade do treinamento + atribuição AQ (SEGESP): <b>não iniciado</b> -Formatação do material	7%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHA MENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLU SÃO	STATUS
							para EAD (SEGESP): <b>não iniciado</b> -Disponibilização do curso aos usuários na ferramenta EAD – 1ª. Turma (SEGESP): <b>não iniciado</b>		

## INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
52	<b>Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)</b>	GP: Adriano Simioni LT: Ernani	Escopo aprovado	Sem custo em 2014 (equipamentos já adquiridos em anos anteriores)	02/10/2017	Projeto com dependência da SEMPRO. A aquisição de mais 9 racks está suspensa, até que o estoque seja esvaziado. Posição 15/05: Faltam implantar em 12 localidades das 67 totais. Erechim estava prevista para dezembro. Uruguaiana implantada em novembro. Foi encaminhada a lista com as cidades e as pendências, para a Diretora da Setic decidir sobre o projeto. EP marcar reunião para a decisão.	-2012 (Carazinho, Vacaria, Rio Grande, Palmeira Missões): <b>concluído</b> -2013 (Frederico Westphalen, Torres, Panambi, Gravataí, Marau, Osório, Nova Prata): <b>Concluído</b> -2014/1 (Alvorada, Bagé, Bento Gonçalves, Cachoeira do Sul, Cachoeirinha, Canoas, Capão da Canoa, Dom Pedrito, Encantado, Estancia Velha, Estelo, Estrela, Farroupilha, Itaqui, Montenegro, Novo Hamburgo, Passo Fundo, Pelotas, POA–Almox, POA–Big/Transporte/João Telles/Provenzano, Rosário do Sul, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, Santa Rosa, Santa Rosa II, Santana do Livramento, São Gabriel, São Jerônimo, São Leopoldo II, São Lourenço do Sul, São Sebastião do Caí, Sapiranga, Soledade, Taquara, Taquari, Tramandaí, Triunfo): <b>concluído</b> -2014/2 – Caxias e Guaíba: <b>concluído</b> -2015/1 – Sapucaia, Alegrete, Lajeado e São Borja: <b>concluído</b> -2015/1 – demais localidades: <b>em andamento</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	76%	Em Execução
105	<b>Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)</b>	GP: Adriano Simioni LT: Gustavo K.	Escopo aprovado	<b>R\$349.740,00</b> (estimado para 2016: instalação + 2 mensalidades - Nfs ainda não recebidas - a lançar no Trace). Posterior valor anual	19/12/2016	Posição 15/05: Contrato assinado dia 10/nov. Realizado aditivo contratual para que o fornecedor inicie a instalação na metade do ano e seja concluída em novembro (a fim de	-Redefinição do projeto: <b>concluído</b> -Análise de soluções: <b>concluído</b> -Contratação: <b>concluído</b> -Implantação: <b>em andamento</b> -Aceite do projeto: <b>não</b>	22%	Em Execução



ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
				(12 mensalidades): R\$1.172.520,00  R\$609.076,44 (realizado referente a 1 ano de mensalidade-2013/2014)		pagamos somente 2 meses nesse ano). Necessário registro de mudança com novo cronograma.	<b>iniciado</b>		
202	<b>Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD</b>	GP: Adriano Simioni LT: Ernani	Escopo aprovado	<b>R\$ 1.107.984,00 + 367.555,40</b> (20 servidores) Todo valor contido no orçamento 2013	09/10/2017	Valor contido no orçamento de 2013 (R\$1.475.539,40). Dependência da SEMPRO. Posição 15/05: Atendidos 59 foros, restando 2 para atender (Canoas e São Leopoldo). São Leopoldo: aguardando SEMPRO para movimentação dos racks. Canoas: pendência SETIC e SEMPRO. Aguardando definições da nova diretoria da SEMPRO. Foi encaminhada a lista com as cidades e as pendências, para a Diretora da Setic decidir sobre o projeto. EP marcar reunião para a decisão.	- 52 Foros atendidos até 08/2014: <b>concluído</b> -Foros atendidos a partir de 08/2014 – Caxias, São Jerônimo, Esteio, Santa Rosa, Santa Rosa II, Sapucaia e Erechim: <b>concluído</b> -Demais foros atendidos a partir de 08/2014: <b>em andamento</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	97%	Em Execução
208	<b>Revisão do serviço de time</b>	GP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	<b>R\$224.340,00</b> (realizado, referente	18/01/2016	Posição 15/05: instalação dos equipamentos	-Análise de viabilidade: <b>concluído</b>	97%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
	stamping PDDE	- LT: André Livi		a instalação: R\$157.766,40 + 2 mensalidades cada de R\$4.286,80 referente ao suporte e garantia + 58 meses apenas garantia a R\$1.000,00 cada mês) Já lançado no Trace		concluída em 18/jan/2016. Termo de aceite aprovado (anexar no Trace a aprovação). EP marcar reunião de encerramento.	-Licitação: <b>concluído</b> -Execução: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>em andamento</b>		
209	Padronização do diretório de usuários	GP: Adriano Simioni LT: Volnei Susin	Escopo aprovado	Elencar custo com licenças microsoft		Havia sido suspenso em agosto, até a regulamentação do licenciamento Microsoft para equipamentos servidores e usuários (licenças já recebidas). No entanto, deve permanecer suspenso pois depende da instalação dos links redundantes, o qual tem previsão para instalação/reavaliação em novembro/16.	-Criação do grupo de trabalho: <b>concluído</b> -Estudo técnico do cenário atual: <b>concluído</b> -Estudo de possíveis cenários e montagem de laboratório: <b>concluído</b> -Estratégia de migração a ser adotada: <b>suspensa</b> -Licitação: <b>suspensa</b> -Execução: <b>suspensa</b>	52%	Suspense
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	GP: Adriano Simioni LT: Ernani	Escopo aprovado	<b>Sem custo</b> Custo orçado para aquisição dos nobreaks era de R\$82 mil e não será utilizado. Devido ao corte no orçamento, os nobreaks antigos devem ser		Posição 15/05: Projeto deve ser continuado sem aquisição, com reaproveitamento dos nobreaks existentes.	-Análise de viabilidade: <b>concluído</b> -Licitação: <b>em andamento</b> -Execução—prédios interior: <b>não iniciado</b> -Execução—prédios capital: <b>não iniciado</b>	17%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
				reutilizados (já atualizado no Trace)					
211	Firewall de aplicação	GP: Adriano Simioni	Escopo a definir	<b>R\$ 326.430,25</b> (realizado, referente a solução ADC, instalação e consultoria – somente 1 Nf foi lançada no Trace – lançar as demais quando recebidas)  R\$1.300.000,00 (previsto)		Posição 15/05: Projeto reaberto. Trabalho em conjunto dos TRTs (4, 1, 14 e 15), com gestão do TRT4. Equipamentos recebidos dia 03/março. Em homologação para posteriormente, entrar em produção (deverá aguardar a estabilização dos problemas com o storage).	-Análise técnica: <b>concluído.</b> -Licitação: <b>concluída</b> -Execução: <b>em andamento</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	63%	Em Execução
212	Alta disponibilidade de serviços	GP: Adriano Simioni LT: Eric	Escopo a redefinir	Sem custo.	31/03/2016	Posição 15/05: Escopo reprovado, a redefinir. GP fazendo mapeamento da disponibilidade existente por serviço, para apresentar à Diretora da SETIC e definir sobre o andamento do projeto (em atraso—previsão era para 31/03/16). Nova estimativa para concluir a versão final da apresentação: 30/junho.	- HA Banco Oracle: <b>concluído</b> - Análise do ambiente (Foco HA): <b>em andamento</b> - Entrega CPD2 (dependência externa): <b>concluído</b> - Adequação para alta disponibilidade: <b>não iniciado (relatório de necessidades)</b>	75%	Em Execução
321	Renovação e ampliação dos servidores dos DataCenters de Porto Alegre - 2015	GP: Adriano Simioni LT: Germano	Escopo aprovado	<b>R\$2.777.840,00</b> (realizado – Nfs lançadas no Trace)  R\$3.310.795,00		Posição 15/05: equipamentos adquiridos na fase 3 já recebidos. Instalados em 25/fev. Necessário a configuração dos	-Análise da demanda: <b>concluído</b> -Licitação: <b>concluído</b> -Execução do projeto Fase 1: <b>concluído</b> -Execução do projeto	99%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
				(previsto)		servidores, para sua efetiva utilização (a ser realizado 15 dias após a estabilização do problema com o storage).	Fase 2: <b>concluído</b> -Execução do projeto Fase 3: <b>em andamento</b>		
389	Substituição dos RACK's de TI no Foro POA	GP: Adriano Simioni	A elaborar plano de projeto	A definir		PROJETO PARADO EM SET/2015 DEVIDO AO CORTE DE VERBA DA SEMPRO. Paulo Mendes vai verificar com a Natacha se realmente é projeto ou poderia ser uma recomendação da TI para a SEMPRO, via processo administrativo.	-Análise de viabilidade de projeto: <b>em andamento</b> -Licitação: <b>não iniciado</b> -Execução do projeto: <b>não iniciado</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	24%	Suspensão
390	Renovação de No-Break Interior do Estado	GP: Adriano Simioni	Escopo a definir	R\$574.999,70 (Nfs ainda não recebidas- a lançar no Trace)	08/04/2016	Posição 15/05: implantado em todas as localidades (finalizado em 08/04/16). Aguardando aprovação no Termo de Aceite. Após, fazer reunião de encerramento.	-Análise de viabilidade do projeto: <b>concluído</b> -Licitação: <b>concluído</b> -Execução do projeto: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>em andamento</b>	95%	Em Execução
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	GP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	R\$356.000,00 (estimado lançado no Trace)		Posição 15/05: Alta prioridade. Termo de referência será elaborado pela SEMPRO. Encaminhar informações para CGTIC até 30/junho, para que a licitação seja encaminhada até agosto.	-Análise de Viabilidade da Solução: <b>em andamento</b> -Licitações: <b>não iniciado</b> -Execução: <b>não iniciado</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	8%	Em Planejamento
392	Expansão e renovação de garantia da solução de rede	GP: Adriano Simioni	A solicitar aprovação do plano de projeto	R\$1.330.448,13 (Nfs ainda não recebidas- a lançar no Trace)	17/05/2016	Posição 15/05: Escopo alterado (necessário aprovação do plano de projeto-Diretora da	-Análise de viabilidade da solução: <b>concluído</b> -Licitações: <b>concluído</b> -Execução: <b>em</b>	67%	Em Execução

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
	<b>local do TRT4 em Porto Alegre</b>  Nome antigo: Expansão do switch core BD para 20 GB			no Trace)  (verba antiga era de R\$200.000,00)		SETIC). Suporte renovado a partir de 28/fev/2016. Equipamentos entregues dia 29/março. Aguardando estabilização do problema com o storage para conclusão da instalação. Necessário gestão de mudança para confirmação do novo escopo, alteração do nome do projeto e do prazo.	<b>andamento</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>		
393	<b>Renovação do parque de servidores de rede no interior</b>	GP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	R\$599.600,00 (Nfs lançadas no Trace)	14/03/2016	Posição 15/05: instalações concluídas em 14/03/16. EP marcar reunião de encerramento do projeto.	-Análise de mercado: <b>concluído</b> -Licitações: <b>concluído</b> -Execução: <b>concluído</b> -Encerramento: <b>em andamento</b>	94%	Em Execução
394	<b>Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto</b>	GP: Adriano Simioni	Escopo aprovado	Sem custo  Orçado era de R\$600.000,00 – não será usado  (Custo para renovação do citrix já é pago atualmente e por isso não será considerado como custo do projeto)		Posição 15/05: Não aprovada aquisição de nova solução, apenas atualização da solução atual. Registro de mudança realizado em 10/dez. Permanece em testes da atualização (necessário novo registro de mudança).	-Análise de viabilidade da solução: <b>concluído</b> -Instalação do novo ambiente definido: <b>em andamento</b> -Testes: <b>em andamento</b> -Encerramento: <b>não iniciado</b>	91%	Em Execução
441	<b>Aumento dos links de internet</b>	GP: Adriano Simioni	Encaminhar plano de	R\$10 mil mensal (validar quantos		Posição 15/05: ampliar links com novos contratos			Em planejamento

ID	PROJETO	GP / LD (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	PREVISÃO/ ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS	% CONCLUSÃO	STATUS
		LT: Gustavo K.	projeto para aprovação	meses serão considerados como parte do projeto)		e melhores valores. Encaminhar licitação o quanto antes, visto que terá possível economia. Reunião de kick-off realizada.			
442	Renovação de storages	GP: Adriano Simioni LT: Germano	Encaminhar plano de projeto para aprovação	R\$2 milhões		Posição 15/05: reunião de kick-off realizada. Remeter para licitação até final de agosto.			Em planejamento

**PROJETOS CONCLUÍDOS EM 2015 e com alguma pendência de documentação ou de medição de benefícios**

Área	ID	PROJETO	GP / LP (Gerente e Líder Técnico)	ACOMPANHAMENTO	CUSTO	ENTREGA PRODUTO FINAL	OBSERVAÇÃO	STATUS DAS ENTREGAS
CGTIC	215	Revisão da metodologia de gerenciamento de projetos	GP: Deise Albino	Escopo aprovado	R\$73.950,00	16/11/2015	<p>PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE.</p> <p>Pós-projeto: em medição dos benefícios.</p>	<p>-Plano de implantação: <b>concluído</b></p> <p>-Revisão da metodologia de GP: <b>concluído</b></p> <p>-Modelo de gestão de portfólio de projetos: <b>concluído</b></p> <p>-Disseminação da metodologia: <b>concluído</b></p> <p>-Disseminação para a Organização: <b>concluído</b></p> <p>-Acompanhamento projeto piloto: <b>concluído</b></p> <p>- Encerramento: <b>concluído</b></p>
CGTIC	216	Revisão dos processos de planejamento de contratações e gestão de contratos de TIC	GP: Simone Goulart	Escopo a definir	Sem custo	Outubro/2015	<p>Em outubro/2014, realizada revisão do processo de contratação para adequação pontual à resolução do CNJ. Em outubro/2015, processo de gestão revisado e encaminhado PA para aprovação da Presidência. Necessário documentar o projeto no Trace.</p>	<p>-Processos de planejamento de contratações e gestão de contratos de TIC revisados: <b>concluído</b></p>
