


# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

## PROJETOS DA SETIC PDTI 2016-2017

Data: OUTUBRO/2016 v1.0

### 1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria

SETIC - Gráfico de Projetos PDTI atual - por Status SETIC

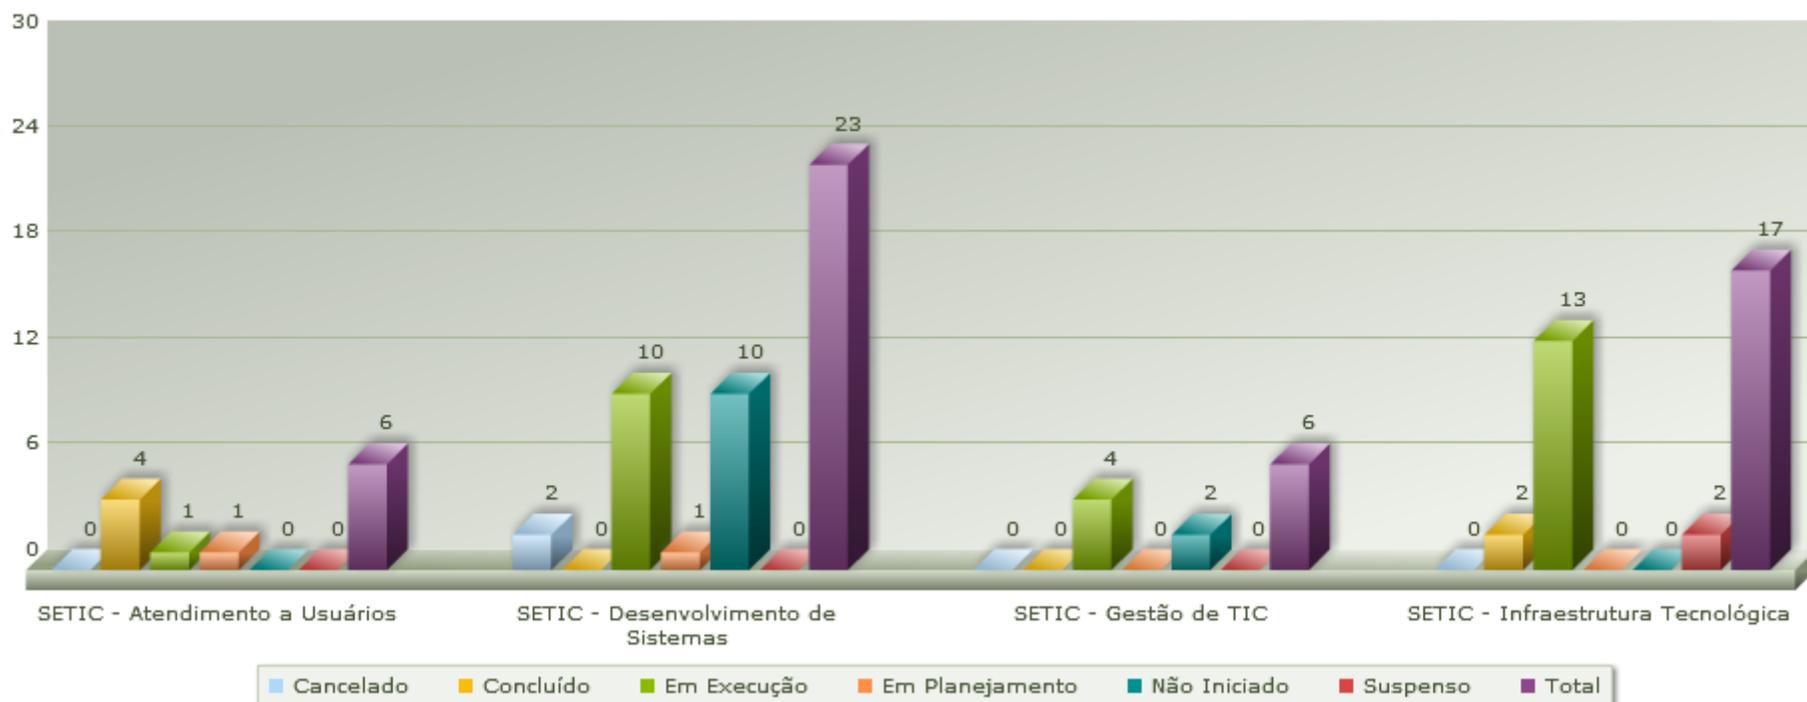

### Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório


O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p><b>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo</b> Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}</math></p>	<p><b>IEP - Indicador de Execução do Projeto</b> Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}</math></p>
<p><b>IDC - Indicador de Desempenho do Custo</b> Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}</math></p>	<p><b>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia</b> Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}</math></p>
<p><b>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento</b> Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IPR = ((\text{Duração Real do Projeto} / \text{Duração da Primeira Linha de Base}) - 1) * 100</math></p>	

# ATENDIMENTO A USUÁRIOS

ATENDIMENTO A USUÁRIOS  
Andamento dos projetos - últimos 3 meses


sub-title

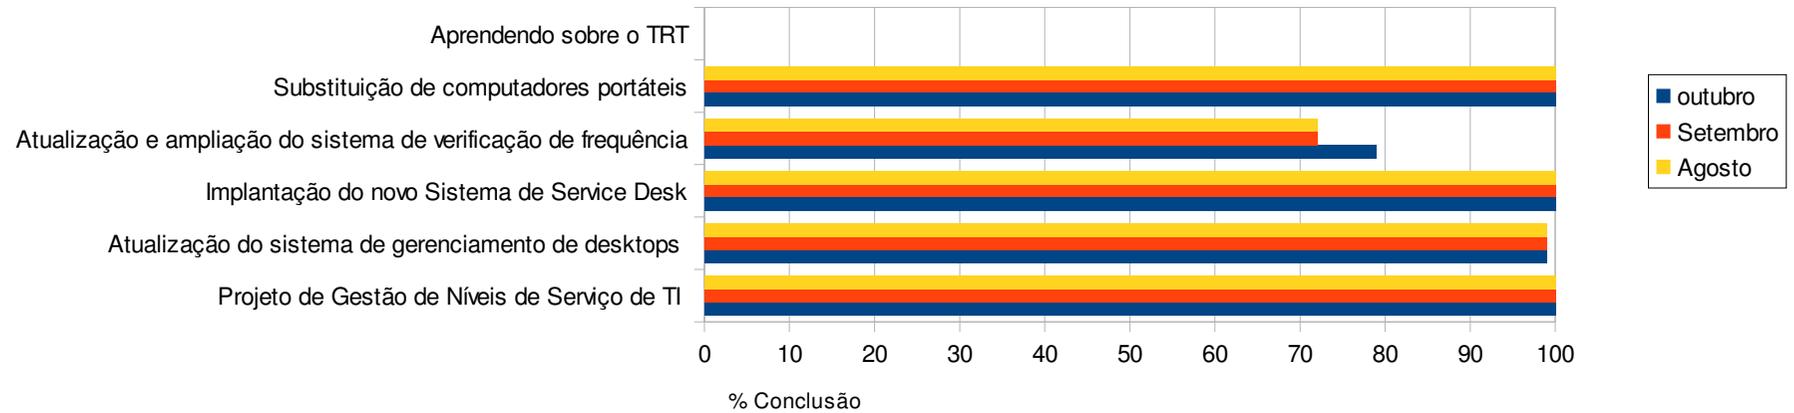



# DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS  
Andamento dos projetos - últimos 3 meses

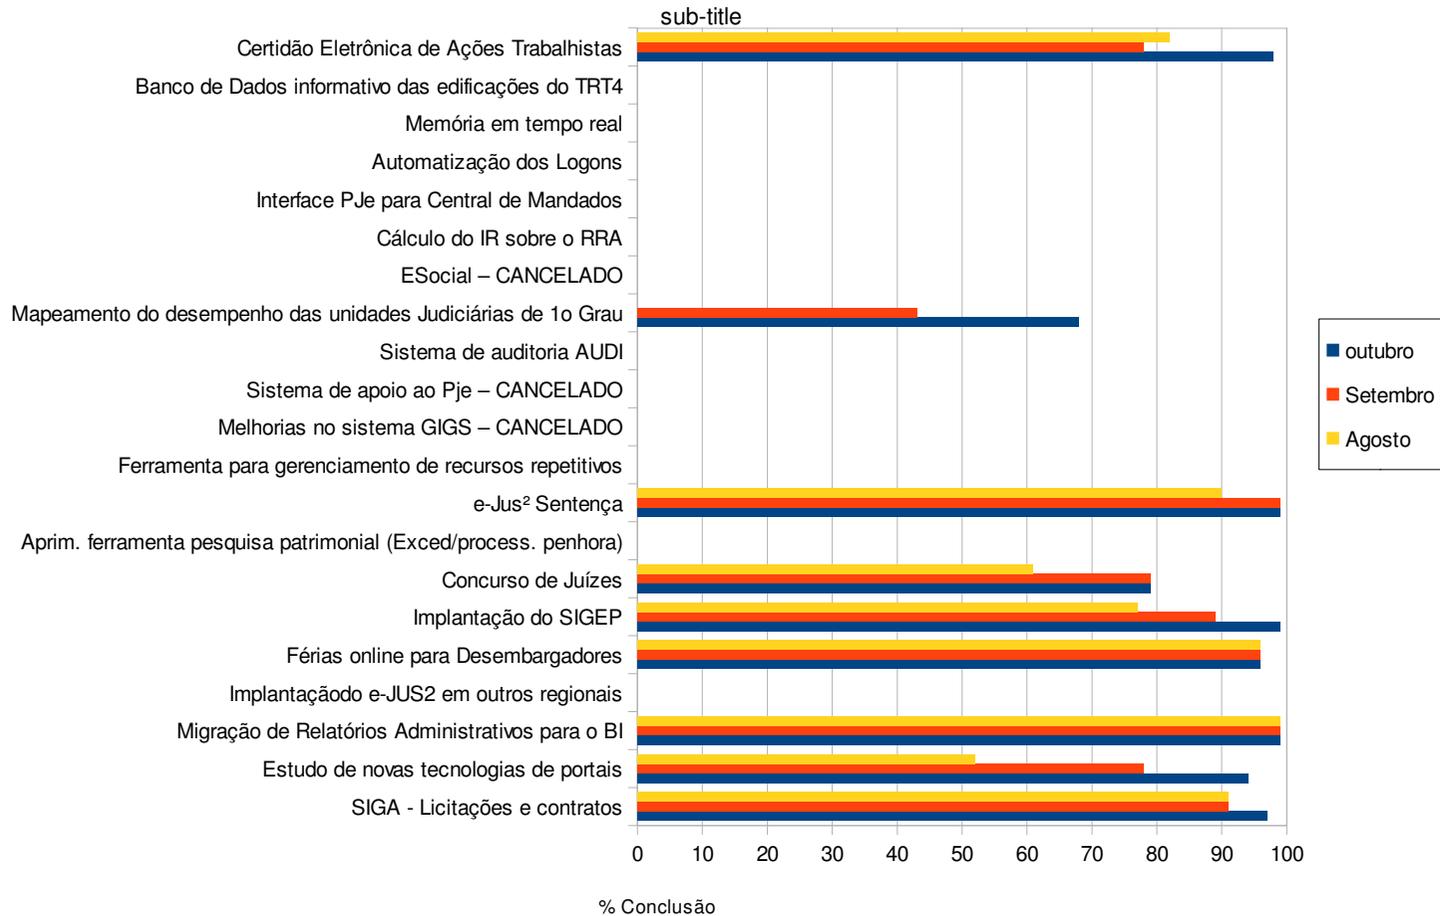


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	Status Entregas	Entrega Produto Final
256	SIGA - Licitações e contratos	MARCIO BYSTRONSKI	Posição 15/10: em definição e validação a migração de dados. Necessário gestão de mudança, para replanear homologação, alterar nome do projeto para SILC e talvez contemplar relatórios no escopo.	Em Execução	07/03/2014	27/09/2016	05/06/2014		97	0	0	0,82	0,91	0	0,57	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS-Em andamento; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em planejamento; SPRINTS 41 - Homologação e Correções com a AREA DE NEGÓCIO - Parte III-Em andamento; SPRINTS 42 - Homologação e Correções com a AREA DE NEGÓCIO - Parte IV-Designada; sprint 43 - Migração de Contratos e Aditivos-Designada; sprints 44 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atualizadas no SAC-Designada; Treinar-Em planejamento; Repasso para operação-Em planejamento; Liberar para Produção (MARCO)-Em planejamento	
257	Estudo de novas tecnologias de portais	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição 15/10: concluído o documento com o resultado da análise técnica. Necessário validação final com a Natacha. A princípio não haverá licitação para a compra de ferramenta. Projeto atrasado, sem previsão de registro de mudança.	Em Execução	27/02/2015	04/10/2016	27/02/2015		94			0,55	0,94	0	1	GERÊNCIA DO PROJETO-Em andamento; Plano de Projeto Aprovado (MARCO)-Concluída; Termo de Aceite Final Aprovado (MARCO)-Em planejamento; Termo de Encerramento Aprovado (MARCO)-Em planejamento; PLANEJAMENTO PRELIMINAR-Concluída; ESTUDO DAS FERRAMENTAS DE PORTAL-Concluída; PROVA DE CONCEITO-Concluída; AVALIAÇÃO DA POC-Concluída; FINALIZAÇÃO-Em andamento	04/10/16
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	TIAGO GOMES SANTOS	Posição 15/10: Entrega para a CSAUDE homologada e reunião de aceite realizada. Entrega para a SGE homologada. Entrega para a SEGESP concluída, será dada como homologado no aceite, visto que a área usuária não deu retorno sobre a homologação. Feito mapeamento sobre % de informações contempladas, comparando-se a solução anterior com a nova, a fim de validar quanto do escopo foi atendido e servir como embasamento para a reunião de aceite com a SEGESP. Agendar reunião	Em Execução	25/02/2015	15/08/2016	25/02/2015		99			0,92	0,99	0	0,83	ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em andamento;	12/09/2016
400	Implantação e-JUS2 em outros regionais	ANDRE SOARES FARIAS		Não Iniciado	21/05/2015	01/06/2015			0			0	0	0			
402	Férias online para Desembargadores	MARCIO BYSTRONSKI	Posição 15/10: Desenvolvimento concluído em final de outubro. Em análise dos itens que foram retornados pelo usuário sobre sua homologação. Projeto está sem prioridade na equipe, itens pendentes ainda não priorizados com Natacha. EP validar a pontuação do projeto e sugerir suspensão.	Em Execução	23/03/2015	18/11/2015	23/03/2015		96			0,85	0,96	0	0,66	IMPLANTAÇÃO-Designada	
404	Implantação do SIGEP	MARCIO BYSTRONSKI	Posição 15/10: todas as etapas do projeto concluídas. Natacha enviou e-mail informando que etapa de migração está homologada. Agendar reunião de aceite final.	Em Execução	12/01/2015	30/09/2016	12/01/2015		99			1	0,99	0	1	ANÁLISE INICIAL DE REQUISITOS-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 1-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 2-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 3-Concluída; HOMOLOGAÇÕES E CORREÇÕES-Concluída	30/09/2016

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	Status Entregas	Entrega Produto Final
426	Concurso de Juizes	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição 15/10: em andamento a etapa de inscrição definitiva, até 18/nov. Projeto sendo executado conforme previsto.	Em Execução	18/04/2016	10/01/2017	18/04/2016		76			1	0,97	0	1	Entrega - Módulo do Candidato-Concluída; Entrega - Módulo de Administração-Concluída; Entrega - Módulo de carga de dados-Concluída; Entrega - Módulo de acompanhamento de sessão de id. provas-Concluída; Sessão de Identif. Prova Discursiva (Secretaria do Concurso)-Concluída; Sessão de Identif. Prova Sentença (Secretaria do Concurso)-Concluída; Terceira Etapa - Inscrição definitiva-Em andamento; Quarta Etapa - Prova oral-Em planejamento; Quinta Etapa - Avaliação de Títulos-Em planejamento; Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento	15/12/2016
428	Aprimoramento de ferramenta de pesquisa patrimonial (Excedentes e processamento de penhora)	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Projeto estratégico. Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016).	Não Iniciado	12/04/2016	22/04/2016			0			0	0	0			
429	e-Jus <sup>2</sup> Sentença	TIAGO GOMES SANTOS	Posição 15/10: entrega do produto final realizada em 19/08. Em contato com usuário para realização da reunião de aceite final.	Em Execução	05/04/2016	19/08/2016	05/04/2016		99			0,88	0,99	0	0,86	INÍCIO DO PROJETO-Concluída; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em andamento; DESENVOLVIMENTO (Adaptações para edição de sentença) sprints 1..8-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Homologação das adaptações) sprints 2..8-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Desenvolvimento dos ajustes solicitados + treinamento SAU) sprints 3..8-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Homologação dos ajustes solicitados) sprints 4..8-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Interface envio textos PJE) sprints 5..8-Concluída; Monitoramento uso - sprints 6..7..8-Concluída; Treinamento EAD-Concluída	19/08/2016
430	Ferramenta para gerenciamento de recursos repetitivos	TIAGO GOMES SANTOS	Projeto estratégico. Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016).	Não Iniciado	12/04/2016	22/04/2016			0			0	0	0			
431	Melhorias no sistema GIGS	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	CANCELAR PROJETO.	Cancelado	13/04/2016	25/04/2016			0			0	0	0		CANCELADO	
432	Sistema de apoio ao PJe	JOICE PAVEK FIGUEIRO	CANCELAR PROJETO.	Cancelado	13/04/2016	01/08/2016			0			0	0	0		CANCELADO	
433	Sistema de auditoria AUDI	MARCIO BYSTRONSKI	Posição 15/10: Usuário (Tânia), enviou informações para início do projeto.	Não Iniciado	13/04/2016	01/08/2016			0			0	0	0			
434	Mapeamento do desempenho das unidades Judiciárias de 1o Grau	TIAGO GOMES SANTOS	Posição 15/10: Em desenvolvimento do relatório de desempenho geral das unidades. Entrega do produto final prevista para 02/12.	Em Execução	11/07/2016	07/12/2016	11/07/2016		68			1	0,93	0	1	INÍCIO DO PROJETO-Concluída; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em planejamento; Dashboard-Concluída; Relatório - Desempenho Geral das Unidades-Em andamento; Programa de cadastro e atualização das variáveis-Concluída	02/12/2016
435	eSocial	MARCIO BYSTRONSKI	Posição 15/10: CANCELADO MOTIVO: desenvolvimento será realizado no SIGEP pelo TRT2. Comissão de Informática autorizou o cancelamento e a abertura de projeto específico para o REINF, não atendido pelo SIGEP.	cancelado	13/04/2016	25/04/2016			0			0	0	0		CANCELADO	
436	Cálculo do IR sobre o RRA	MARCIO BYSTRONSKI	Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016). DG deverá fornecer maiores informações antes do início.	Não Iniciado	13/04/2016	25/04/2016			0			0	0	0			



# GESTÃO DE TIC


## GESTÃO DE TIC Andamento dos projetos - últimos 3 meses

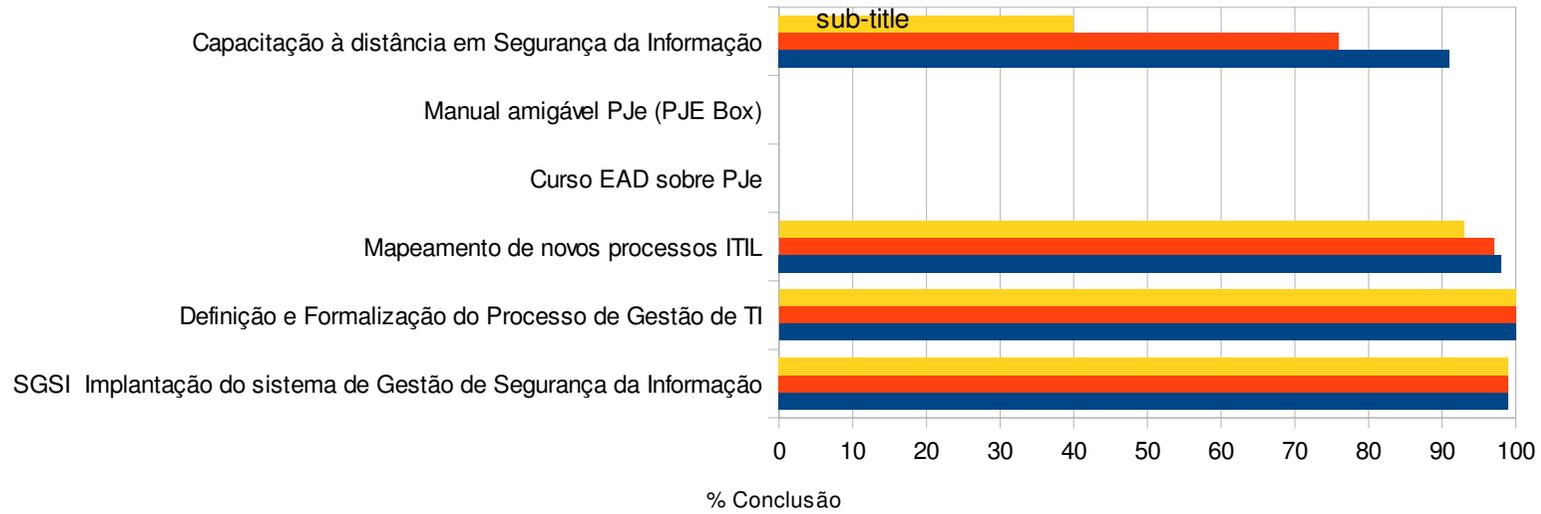

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	Status Entregas	Entrega Produto Final
213	SGSI Implantação do sistema de Gestão de Segurança da Informação	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Posição 15/10: Termo de encerramento aprovado em 13/10 e anexado (termo e aprovação) no trace. Benefícios serão medidos até 19/12.	CONCLUÍDO	01/08/2014	03/06/2016	01/08/2014		99	280000	215000	1	1	0,76	1	CONCLUÍDO	01/07/2016
224	Definição e Formalização do Processo de Gestão de TI	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	Processo regulamentado em 11/05/16. *** PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE *** Mapa de Benefícios anexado.	CONCLUÍDO	14/04/2014	25/05/2016	14/04/2014	12/08/2016	100			1	1	0	1	CONCLUÍDO	11/05/2016
397	Mapeamento de novos processos ITIL	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	Posição 15/10: produto final entregue em 08/08/2016. Reunião de aceite realizada, TA e ata encaminhados dia 07/out. Reunião de encerramento a ser agendada. Mapa de benefícios anexado e custo lançado.	CONCLUÍDO	28/07/2015	29/08/2016	28/07/2015		98	278666	136000	0,8	0,98	0,48	0,75	Plano do Projeto Aprovado-Concluída; Termo de Aceite Final Aprovado-Em andamento; Termo de Encerramento Aprovado-Designada; Entrevistas-Concluída; Apresentação de Resultados - Diagnóstico-Concluída; Definir Fluxos e Atividades SGTI-Concluída; Validação dos Processos TO BE e documentos-Concluída; Parametrização Assyst-Concluída; Promover Workshops Técnicos-Concluída; Apresentação de resultados - Modelagem Processos TO BE-Concluída	08/08/2016
443	Curso EAD sobre PJe	JANINA ALVES FAGUNDES		Não Iniciado	14/04/2016	02/08/2016			0			0	0	0		Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento	
444	Manual amigável PJe (PJE Box)	PABLO PAULO LOPES BARROS (ASSESSOR - CJ2)	INCLUÍDO NO ESCOPO DO PROJETO 443	Não Iniciado	14/04/2016	02/08/2016			0			0	0	0		Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento	
445	Capacitação à distância em Segurança da Informação	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Posição 15/10: ocorrendo as inscrições para a 1a. turma, que ocorrerá de 24/10 até 24/11.	Em Execução	18/04/2016	14/12/2016	18/04/2016		91			1	1	0	1	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Elaboração do material para Capacitação-Concluída; Avaliação viabilidade do treinamento + atribuição AQ (SEGESP)-Concluída; Formatação do material para EAD (SEGESP)-Concluída; Disponibilização do curso na ferramenta EAD - Turma Piloto (SEGESP)-Concluída; Acompanhamento Turma Piloto (SETIC/SEGESP)-Designada; Ajustes no treinamento (SETIC/SEGESP)-Designada	28/11/2016

# INFRAESTRUTURA

## INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA Andamento dos projetos - últimos 3 meses

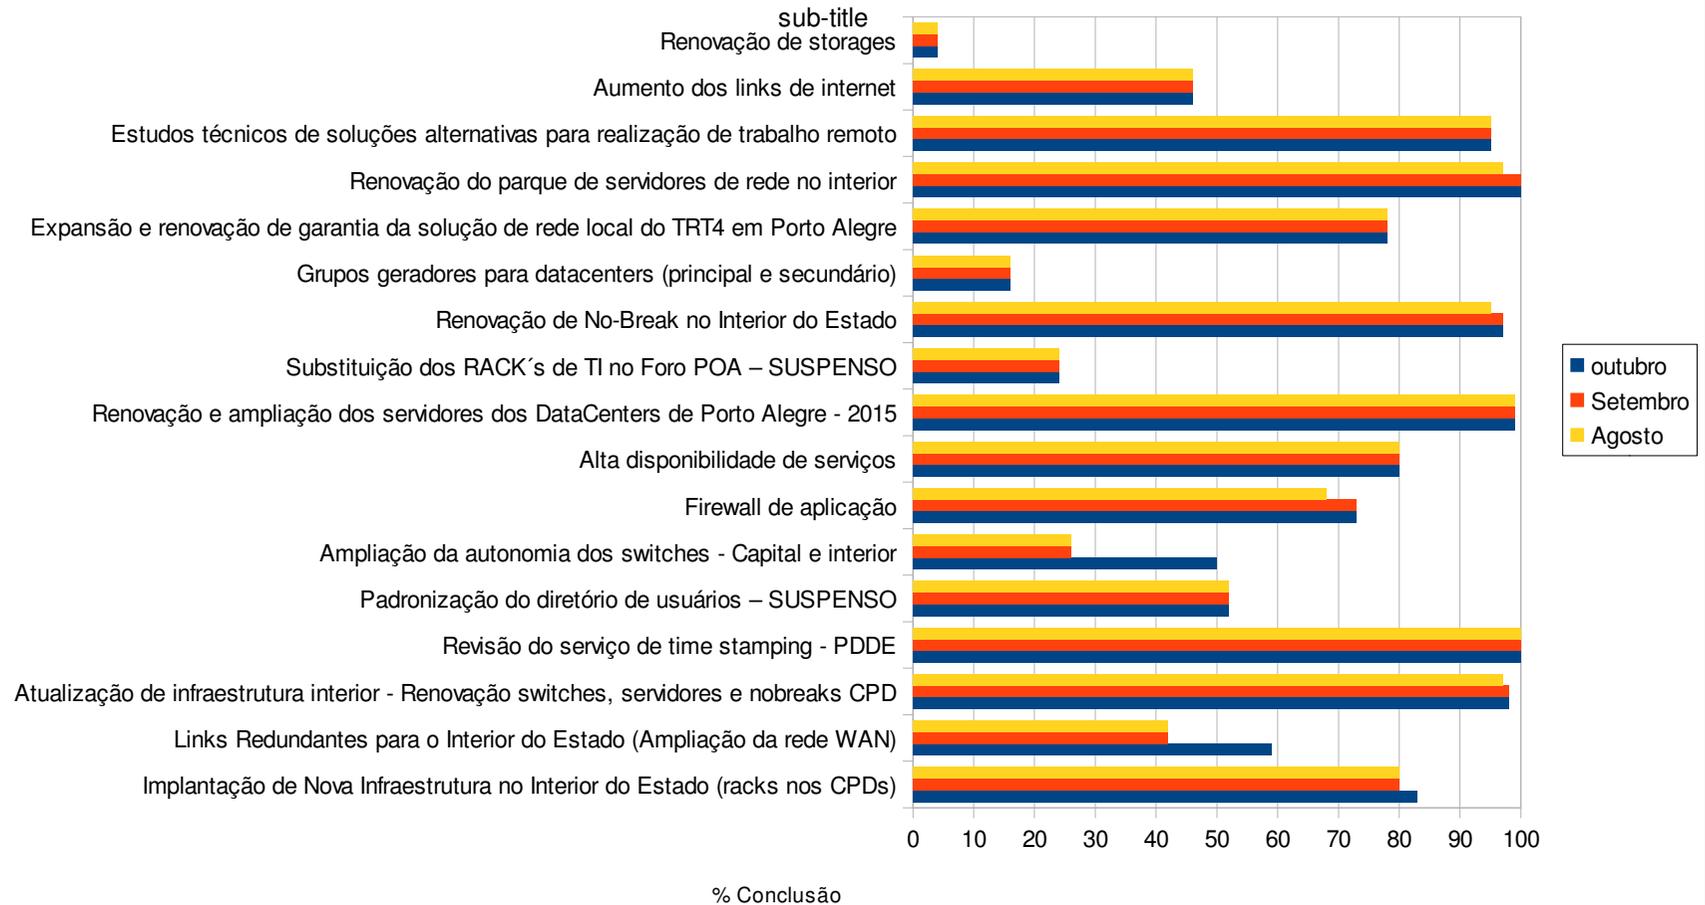

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	Status Entregas	Entrega Produto Final
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição 15/10: aprovada a compra de 5 racks, no valor de R\$50.000,00. Caso sobre orçamento, será solicitado mais 6. Falta implantar em 10 localidades das 67 totais. SEMPRO se comprometeu com 6 em 2016 e 5 em 2017 (Gramado e Viamão será em 2017 mas sem data específica definida). Houve ajustes nas datas da SEMPRO, sem impacto na data final.	Em Execução	09/01/2012	18/12/2017	19/04/2012		83	453000	453000	1	0,98	1	1	Localidades 2012/1-Concluída; Localidades 2012/2-Concluída; Localidades 2013/1-Concluída; Localidades 2013/2-Concluída; Localidades 2014/01-Concluída; Localidades 2014/02-Concluída; Localidades 2015/01-Em andamento; Compra de 5 racks-Em andamento; gerencia do projeto-Em andamento	15/12/2017
105	Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/10: Projeto iniciou em 01/julho, tendo 120 dias para conclusão. Eliminada pendência da SEMPRO. Entrega do produto final prevista para novembro. No entanto, fornecedor em atraso nas entregas parciais, que são informais - PONTO DE ATENÇÃO, pois pode acarretar em atraso do projeto (reunião com equipe em 27/09 e com fornecedor em 30/09 - anexar ata).	Em Execução	07/05/2010	14/11/2016	17/01/2014		59	2360000	609076,44	1	0,45	0,25	1	Análise de Soluções-Concluída; Contratação-Concluída; Implementação do link redundante-Em andamento; Homologação e Aceite-Em planejamento; Gerenciamento do Projeto-Em andamento	14/11/2016
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	Valor contido no orçamento de 2013 (R\$1.475.539,40). Dependência da SEMPRO. Posição 15/10: Atendidos 59 foros, restando 2 para atender. SEMPRO forneceu a data outubro/2016 para São Leopoldo e passou Canoas de setembro/2016 para Fev/2017, necessitando novo registro de mudança.	Em Execução	07/02/2014	06/03/2017	07/02/2014		98	1479568,4	1479559,4	1	1	0,99	0,8	Foros atendidos até 08/2014-Concluída; Canoas-Em andamento; Caxias do Sul-Concluída; Erechim-Concluída; Esteio-Concluída; Santa Rosa-Concluída; Santa Rosa II-Concluída; São Jerônimo-Concluída; São Leopoldo I-Em andamento; Sapucaia do Sul-Concluída; Gerência de Projetos-Em andamento	
208	Revisão do serviço de time stamping - PDDE	ANDRE LUZ LIVI	*** PROJETO CONCLUÍDO *** Mapa de Benefícios enviado.	Concluído	18/08/2014	10/12/2015	15/10/2014	02/09/2016	100	224340	224340	1	1	1	1	CONCLUÍDO	18/01/2015
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	Havia sido suspenso em agosto, até a regulamentação do licenciamento Microsoft para equipamentos servidores e usuários (licenças já recebidas). No entanto, deve permanecer suspenso pois depende da instalação dos links redundantes, o qual tem previsão para instalação/reavaliação em novembro/16.	Suspensão	28/08/2014	19/02/2016	28/08/2014		52			0,33	0,52	0		Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Suspensa; Licitação-Suspensa; Execução-Suspensa; Gerência do Projeto-Em planejamento	
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	Posição 15/10: Aguardando data da SEMPRO para instalações elétricas. Necessário registro de mudança, para contemplar essa atividade e a aquisição dos nobreaks. Previsão para entrega do produto final para 19/12/2016.	Em Execução	25/08/2014	19/12/2016	10/11/2014		50	0	0	0,5	0,53	0	0,75	Análise de viabilidade do projeto-Concluída; Licitação-Em andamento; Prédios Interior (cabearmento elétrico)-Em planejamento; Prédios Capital-Em andamento; Gerencia de Projeto-Em andamento	19/12/2016
211	Firewall de aplicação	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/10: Implantado em produção, porém, com alguns problemas. Sendo monitorado antes do aceite final.	Em Execução	09/02/2015	21/10/2016	04/03/2015		73	248437	248437	0,66	0,74	1	0,8	Análise Técnica-Concluída; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerencia de projeto-Em andamento	06/10/2016
212	Alta disponibilidade de serviços	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/10: Escopo reprovado, a redefinir. Elaborado o mapeamento da disponibilidade existente por serviço. Paulo marcará a apresentação para a Diretora da SETIC (definir nova data).	Em Execução	07/02/2014	23/09/2016	07/07/2014		80			0,33	0,8	0	1	Gerenciamento Projeto-Em andamento; Análise do Ambiente (Foco HA)-Em andamento; HA Banco Oracle-Concluída; entrega do CPD2-Concluída; Relatório Alta Disponibilidade-Em andamento; Adequações para alta disponibilidade-Em planejamento	31/03/2016
321	Renovação e ampliação dos servidores dos DataCenters de Porto Alegre - 2015	GERMANO DE MELLO ANDERSSON	Posição 15/10: reunião de encerramento realizada e ata anexada. Necessário ajustar o Termo de Encerramento para envio.	concluído	31/10/2014	30/06/2016	21/11/2014		99	3310795	2777840	0,83	0,99	0,83	1	Análise da demanda-Concluída; Licitação-Concluída; Execução do projeto Fase 1-Concluída; Execução do projeto Fase 2-Concluída; Execução do projeto Fase 3-Concluída; Gerência de projeto-Em andamento	

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	Status Entregas	Entrega Produto Final
389	Substituição dos RACK's de TI no Foro POA	ADRIANO SIMIONI	PROJETO PARADO EM SET/2015 DEVIDO AO CORTE DE VERBA DA SEMPRO.	Suspensão	24/04/2015	15/02/2016	24/04/2015		24			0	0,24	0		Análise de Viabilidade de Projeto-Suspensa; Licitação-Em planejamento; Execução do Projeto-Em planejamento; Gerência de Projeto-Em planejamento	
390	Renovação de No-Break no Interior do Estado	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/10: implantado em todas as localidades (finalizado em 15/06/16). Reunião de encerramento realizada. Necessário ajustar o Termo de Encerramento para envio.	Em Execução	24/04/2015	20/04/2016	24/04/2015		97	0	0	0,75	0,97	0	1	Análise de Viabilidade do Projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Execução do Projeto-Concluída; Gerência do Projeto-Em andamento	15/06/2016
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/10: enviado para o setor de Licitações, mas ainda faltam documentos da SETIC. SEMPRO revisando o projeto executivo. Ajustes de local de instalações. Registro de mudança será feito após pregão.	Em Execução	01/06/2015	24/11/2016	01/06/2015		16	0	0	0	0,24	0	0,8	Análise de Viabilidade da Solução-Em andamento; Licitações-Em andamento; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	
392	Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4 em Porto Alegre	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/10: cronograma em conjunto com a SEMPRO, com previsão de conclusão entre dezembro/16 a fev/17. Já instalados 2 no prédio Sede, de 57 (Sede e Foro). Necessário registro de mudança.	Em Execução	02/03/2015	17/05/2016	02/03/2015		78	0	0	0,5	0,78	0	0,8	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Licitações-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	
393	Renovação do parque de servidores de rede no interior	ADRIANO SIMIONI	Instalações concluídas em 14/03/16. *** PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE *** Mapa de benefício anexado.	Concluído	01/06/2015	10/06/2016	01/06/2015	15/09/2016	100	500000	599600	1	1	1,19	1	CONCLUÍDO	14/03/2016
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/10: será feito pregão ainda em 2016 para compra do netScaler gateway, docs sendo elaborados (custo adicional ao projeto de 30 mil). Replanejar o projeto e incluir custo. Aquisição aprovada pela CI (ata de 15/09/2016).	Em Execução	02/03/2015	09/09/2016	14/08/2015		95	0	0	0,25	0,95	0	0,8	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	
441	Aumento dos links de internet	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/10: aguardando aceite contratual das instalações Level 3 e Ávato, para encaminhar aceite do projeto.	Em Execução	12/04/2016	17/10/2016	12/04/2016		46			0,42	0,46	0	1	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Contratação-Concluída; Execução-Em andamento; Homologação-Designada; Transição para Operação-Designada	05/10/2016
442	Renovação de storages	ADRIANO SIMIONI	Posição 15/10: Falta aprovação da Natacha no plano de projeto. Pregão previsto para 19/10. Licitação não será mais nacional, fazer registro de mudança. Renegociar fase de contratação para entregar o produto (configuração) até 20/12. Aprovada pela CI aquisição dos storages em sistema ALL FLASH (ata CI de 15/09/2016) - R\$4.663.569,00 (Já lançado no Trace).	Em Execução	14/04/2016	19/06/2017	25/04/2016		3	4663569	0	0,5	0,03	0	0,83	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Em andamento; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	
