

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PROJETOS DA SETIC PDTI 2016-2017

Data: DEZEMBRO/2016 v3.0

1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria




Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}$</p>	<p>IEP - Indicador de Execução do Projeto Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}$</p>
<p>IDC - Indicador de Desempenho do Custo Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}$</p>	<p>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p>Fórmula $IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}$</p>
<p>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p>Fórmula $IPR = ((\text{Duração Real do Projeto} / \text{Duração da Primeira Linha de Base}) - 1) * 100$</p>	


ATENDIMENTO A USUÁRIOS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

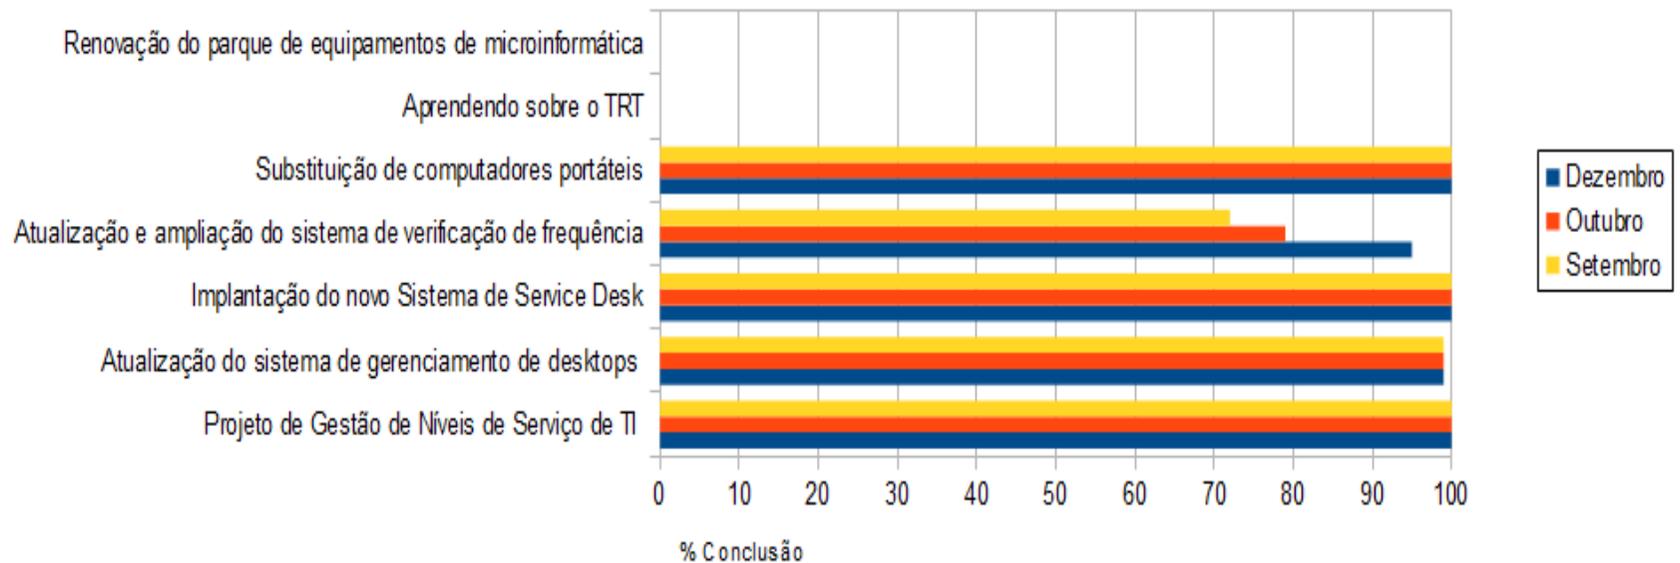

Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
195	Projeto de Gestão de Níveis de Serviço de TI	DENILSON RIBEIRO DE QUADROS	*** PROJETO CONCLUÍDO *** Mapa de benefícios anexado.	Concluído	02/05/2014	02/10/2015	02/05/2014	23/06/2016	100			1	1	0	1	147,8	CONCLUÍDO	18/05/2016
199	Atualização do sistema de gerenciamento de desktops	ANA LUCIA MOREIRA	Posição Dez/16: Aceite do produto (Assyst) em 20/01/2016. Realizadas duas reuniões de encerramento. Aguardando retorno sobre as pendências do termo de encerramento, a fim de validar o que realmente será utilizado do ITAM.	Concluído	05/02/2014	18/05/2015	11/04/2014		99,06			1	0,99	0	0,66	118	CONCLUÍDO	20/01/2016
201	Implantação do novo Sistema de Service Desk	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	Assyst implantado em 18/maio/2015. Aceite para o fornecedor em 20/01/2016. Mapa de Benefícios anexado. *** PROJETO CONCLUÍDO***.	Concluído	05/02/2014	21/10/2015	05/02/2014	28/04/2016	100	R\$ 960.334,55	R\$ 1.174.159,55	0,9	1	1,22	0,83	84,3	CONCLUÍDO	20/01/2016
242	Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	ANA LUCIA MOREIRA	Posição Dez/16: realizada nova homologação. SETIC vai sugerir inexecução para a SEGESP, em reunião dia 09/dez. Após, replanejar ou encerrar o projeto.	Em Execução	10/04/2014	11/11/2016	10/04/2014		95,36	R\$ 222.650,00	R\$ 222.650,00	0,33	0,95	1	1	27,02	Estudar solução de relógio ponto com biometria com ou sem compra de software-Concluída; Licitação-Em andamento; Implantação-Em andamento	
316	Substituição de computadores portáteis	PAULA MEDAGLIA GRUSSNER	*** PROJETO CONCLUÍDO ***. Custos lançados e mapa de benefícios anexado.	Concluído	18/09/2014	22/04/2016	07/05/2013	13/07/2016	100	R\$ 1.355.053,50	R\$ 1.355.053,50	1	1	1	1	37,68	CONCLUÍDO	20/05/2016
425	Aprendendo sobre o TRT	CHARLES FERREIRA FALCAO	Projeto em stand-by.	Em Planejamento					0			0	0	0	0	0		
451	Renovação do Parque de Equipamentos de Microinformática (computadores, notebooks)	EVERTON POLINA	Posição Dez/16: Equipamentos já comprados. Elaborar a proposta de projeto e iniciar o planejamento do projeto.	Em Planejamento					0			0	0	0	0	0		

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Andamento dos projetos - últimos 3 meses

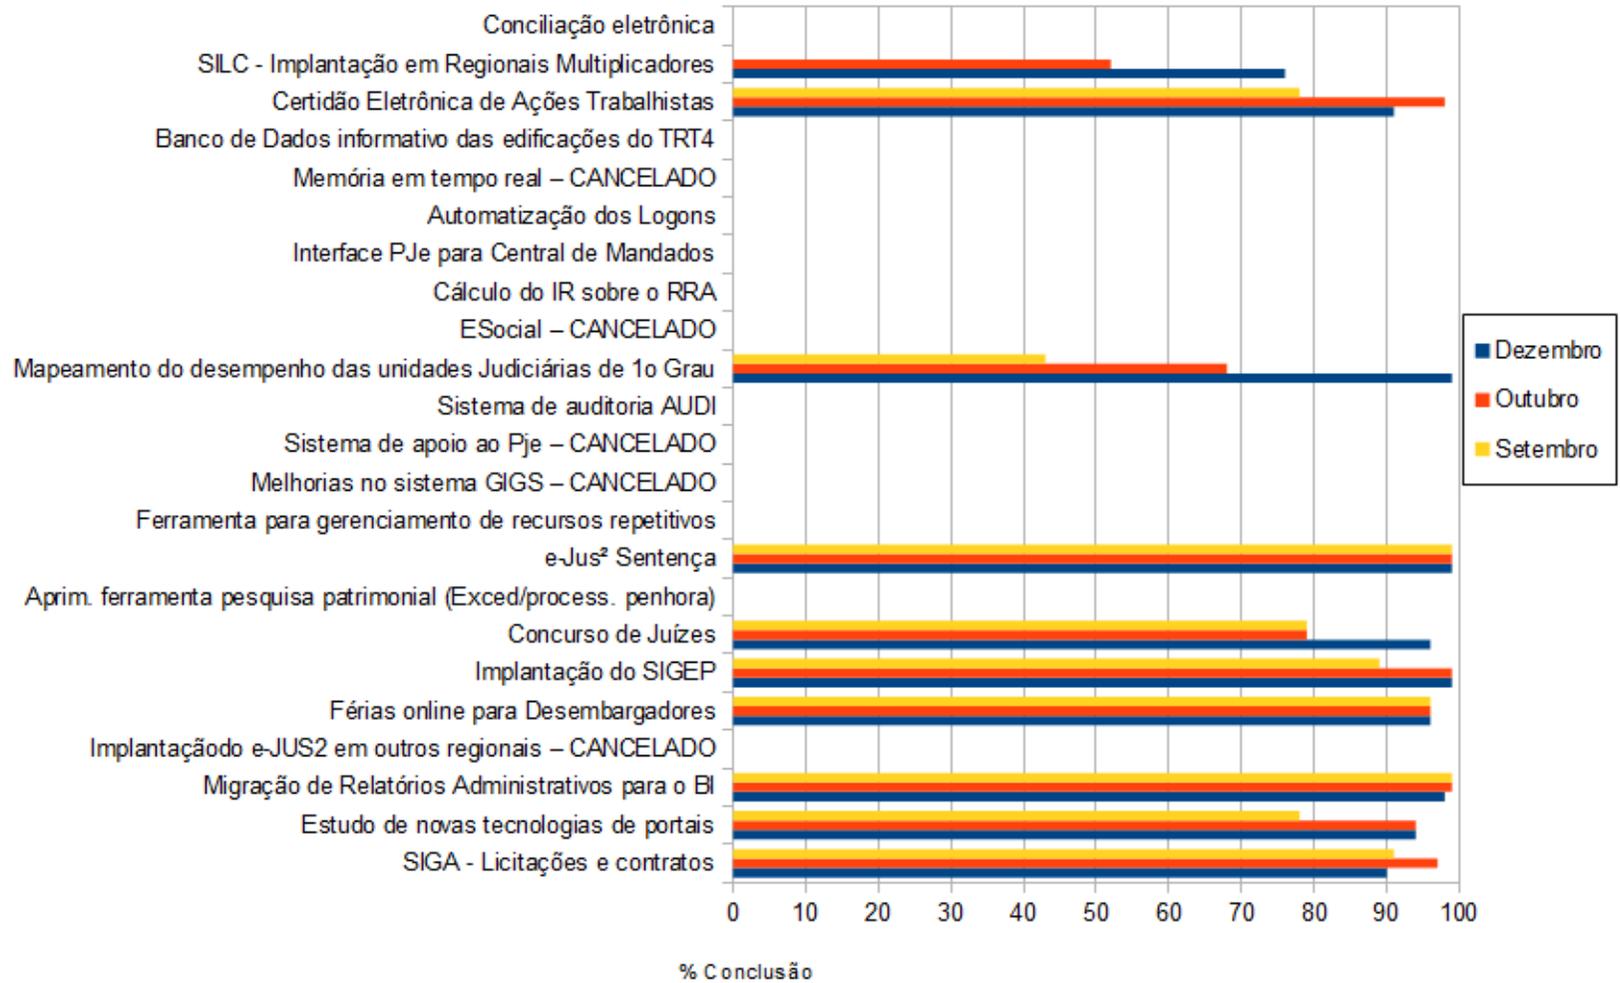


Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
256	SIGA - Licitações e contratos	MARCIO BYSTRONSKI	Posição Dez/2016: GP fez registro de mudança, faltou alterar o nome do projeto. CLC comprometeu-se em homologar a migração de dados até 15/12. No aguardo para ser possível a homologação da retroalimentação e posterior implantação.	Em Execução	07/03/2014	29/04/2032	05/06/2014		90,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1,33	1,87	0	0,57	919,5	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS-Concluída; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em planejamento; PLANEJAMENTO DETALHADO-Concluída; ANÁLISE DE REQUISITOS-Concluída; Sprints anteriores: concluídas; Sprint 49 - Homologação da migração de dados-Em andamento; Sprint 50 - Fim da homologação e ajustes da migração de dados-Em planejamento; Sprint 51 - Ajustes da migração de dados-Em planejamento; Sprints 52 a 56: Concluída; Sprints 57 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atualizadas no SILC-Em andamento;	
257	Estudo de novas tecnologias de portais	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição Dez/16: definida a ferramenta a ser utilizada: Portal SDINT. Reunião de aceite realizada. Encaminhar Termo de Encerramento.	Concluído	27/02/2015	04/10/2016	27/02/2015		97,81			0,55	0,94	0	1	130,1	CONCLUÍDO	16/12/16
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	TIAGO GOMES SANTOS	Posição Dez/16: Entrega para a CSAUDE homologada e reunião de aceite realizada. Entrega para a SGE dada como homologada. Feito mapeamento sobre % de informações contempladas, comparando-se a solução anterior com a nova, a fim de validar quanto do escopo foi atendido. EP marcar reunião com SEGESP para realizar o aceite. GP revisar o Termo de Aceite e elaborar o Termo de Encerramento.	Em Execução	25/02/2015	15/08/2016	25/02/2015		99,66			0,92	0,99	0	0,83	0	INÍCIO DO PROJETO-Concluída; GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS-Em planejamento; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em andamento; DESENVOLVIMENTO (Relatório Licenças - CSAUDE) sprints 1 a 4-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Pessoas - SEGESP) sprints 5 a 7-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Equipamentos - SGE) sprints 8 a 11-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório - CSAUDE) sprints 12 a 13-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Equipamentos - SGE) sprints 14 a 17-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Cedências e Requisições - SEGESP) sprints 18 a 20-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatórios BI ADM - SEGESP) sprints 21-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Homologação SEGESP)-Concluída	12/09/2016
400	Implantação e-JUS2 em outros regionais	ANDRE SOARES FARIAS	Motivo do cancelamento: Tribunais não custearam os deslocamentos da equipe do TRT4 em virtude dos cortes orçamentários.	Cancelado					0			0	0	0	0	0		

402	Férias online para Desembargadores	MARCIO BYSTRONSKI	Posição Dez/16: Desenvolvimento concluído em final de outubro/2015. Reavaliado itens reportados pelo usuário, faltando desenvolver apenas um para finalização do projeto: notificação de período excluído. Ainda sem prazo para conclusão.	Em Execução	23/03/2015	18/11/2015	23/03/2015		96,33				0,85	0,96	0	0,66	0	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS-Em planejamento; PLANEJAMENTO DETALHADO-Concluída; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Designada; Sprint 1 a 3 - Estórias de usuários-Concluída; Sprint 4 - Preparação do ambiente de desenvolvimento-Concluída; Sprint 5 a 9 - Implementação das estórias de usuários-Concluída; Sprint 10 - Homologação-Concluída; Sprint 11 - Homologação-Concluída; Sprint 12 a 14 - Implementação de correções e melhorias-Concluída; Sprint 15 - Caixas postais de avisos e modelos de emails-Concluída; Sprint 16 - Homologação final e Elaboração de manual-Concluída; IMPLANTAÇÃO-Designada	
404	Implantação do SIGEP	MARCIO BYSTRONSKI	Posição Dez/16: todas as etapas do projeto concluídas. Área usuária sinalizou problemas na homologação. De qualquer forma, a intenção é implantar em 07/jan/2017.	Em Execução	12/01/2015	30/09/2016	12/01/2015		99,97				1	0,99	0	1	15,61	ANÁLISE INICIAL DE REQUISITOS-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 1-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 2-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 3-Concluída; HOMOLOGAÇÕES E CORREÇÕES-Concluída	30/09/2016
426	Concurso de Juizes	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição Dez/16: Prova oral realizada em 02/dez. Em andamento a avaliação de títulos. Finalização da 5a. etapa em 15/dez. Encerrar o projeto.	Concluído	18/04/2016	10/01/2017	18/04/2016		95,81				1	0,98	0	1	0	CONCLUÍDO	15/12/2016
428	Aprimoramento de ferramenta de pesquisa patrimonial (Excedentes e processamento de penhora)	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Projeto estratégico. Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016).	Não Iniciado					0				0	0	0	0	0		
429	e-Jus? Sentença	TIAGO GOMES SANTOS	Posição Dez/16: entrega do produto final realizada em 19/08. Reunião de aceite realizada e termo de aceite aprovado. Reunião de encerramento agendada para 14/dez.	Concluído	05/04/2016	19/08/2016	05/04/2016		99,45				0,89	0,99	0	0,86	14,28	CONCLUÍDO	19/08/2016
430	Ferramenta para gerenciamento de recursos repetitivos	TIAGO GOMES SANTOS	Projeto estratégico. Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016).	Não Iniciado					0				0	0	0	0	0		
431	Melhorias no sistema GIGS	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Motivo do cancelamento: projeto não aprovado pela Comissão de Informática.	Cancelado					0				0	0	0	0	0		
432	Sistema de apoio ao PJe	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Motivo do cancelamento: com o acesso fornecido ao TRT4 para a realização de alterações no PJe, entendeu-se que a solicitação de um sistema paralelo não se faz mais necessária. As necessidades existentes devem ser encaminhadas para a SETIC desenvolver diretamente no Pje.	Cancelado					0				0	0	0	0	0		
433	Sistema de auditoria AUDI	MARCIO BYSTRONSKI	Usuário (Tânia), enviou informações para início do projeto.	Não Iniciado					0				0	0	0	0	0		
434	Mapeamento do desempenho das unidades Judiciais de 1o Grau	TIAGO GOMES SANTOS	Entrega do produto final realizada dia 25/11/2016. Termo de aceite encaminhado. Reunião de encerramento marcada para dia 14/dez.	Concluído	11/07/2016	02/12/2016	11/07/2016		99,16				0,8	0,99	0	1	-3	CONCLUÍDO	25/11/2016
435	eSocial	MARCIO BYSTRONSKI	Motivo do cancelamento: desenvolvimento será realizado no SIGEP pelo TRT2. Comissão de informática autorizou o cancelamento e a abertura de projeto específico para o REINF, não atendido pelo SIGEP.	Cancelado					0				0	0	0	0	0		

436	Cálculo do IR sobre o RRA	MARCIO BYSTRONSKI	Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016). DG deverá fornecer maiores informações antes do início.	Não Iniciado					0			0	0	0	0	0			
437	Interface PJe para Central de Mandados	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016).	Não Iniciado					0			0	0	0	0	0			
438	Automatização dos Logons	ANDRE SOARES FARIAS		Não Iniciado					0			0	0	0	0	0			
439	Memória em tempo real	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Motivo do cancelamento: deve ser tratado no escopo do projeto do Novo portal de Internet, a ser incluído no PDTI 2017. Ata reunião da CI de 15/09/2016.	Cancelado					0			0	0	0	0	0			
440	Banco de Dados informativo das edificações do TRT4	MARCIO BYSTRONSKI	Aguardar demandas da folha e SIGEP para avaliar possibilidade de priorizar o projeto (ata reunião da CI de 15/09/2016).	Não Iniciado					0			0	0	0	0	0			
446	Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	Posição Dez/2016: registro de mudança encaminhado dia 07/dez. Será liberado apenas para uso interno. Início da utilização dia 30/11. Em 19/dez, previsão de liberação do modelo de certidão por unidade judiciária e em 31/jan, a versão final completa.	Em Execução	03/05/2016	23/02/2017	03/05/2016		91,51			1	1,01	0	0,86	217,8		PLANEJAMENTO-Concluída; Sistema web para elaboração de certidões de ações trabalhistas-Em andamento; Entrega 1 - Certidão em HTML-Concluída; EXECUÇÃO DA SPRINT-Concluída; DESENVOLVIMENTO SPRINT 14 - CERTIDÃO POR UNIDADE JUDICIÁRIA-Em andamento; EXECUÇÃO DA SPRINT-Em andamento; Treinamento da equipe de atendimento-Em planejamento	
447	SILC - Implantação em Regionais Multiplicadores	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	Posição Dez/16: realizada implantação no TRT23. Aguardando avaliação final do TRT14.	Em Execução	12/09/2016	11/01/2017	12/09/2016		76,33			0,6	0,81	0	1	-1,47		Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Preparação para implantação-Concluída; Ambiente REDMINE divulgado para os regionais participantes do gtSILC-Em andamento; Manual de usuário disponibilizado para os regionais participantes da fase piloto-Concluída; Manual de instalação disponibilizado para os regionais participantes da fase piloto-Concluída; Pacotes de software disponibilizados para o TRT23-Concluída; Ajustes decorrentes da primeira implantação-Concluída; Pacotes de software disponibilizados para o TRT14-Em andamento; Ajustes decorrentes da segunda implantação-Em andamento; Estudos técnicos preliminares para nacionalização do sistema (gtSILC)-Em andamento; Avaliação sobre a nacionalização do sistema (gtSILC)-Em planejamento	19/12/2016
448	Conciliação Eletrônica	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Posição Dez/16: o sistema do TRT18 foi cedido para uso do TRT4. Ele está sendo adaptado para que a área usuária valide se vai atender às suas necessidades. Necessário GP adaptar e encaminhar o plano de projeto para aprovação.	Em Execução	23/09/2016	04/10/2016			0			0	0	0	0	0			


GESTÃO DE TIC

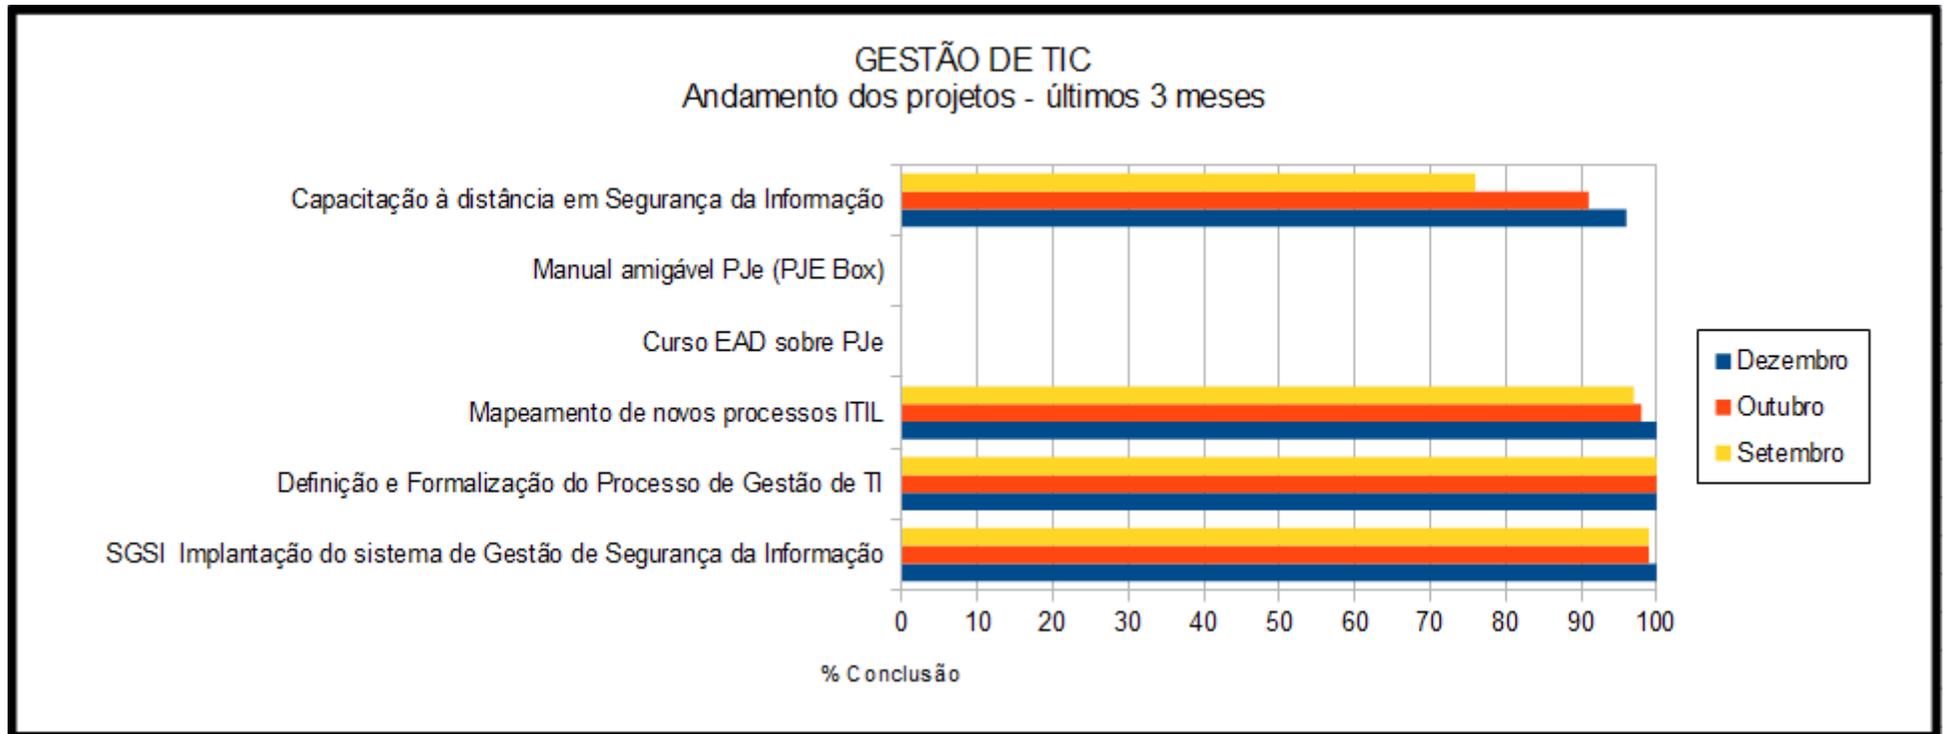

Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
213	SGSI Implantação do sistema de Gestão de Segurança da Informação	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Produto entregue em 01/07/2016. *** PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE***. Custos lançados. Benefícios serão medidos até 19/12.	Concluído	01/08/2014	03/06/2016	01/08/2014	20/10/2016	100	R\$ 280.000,00	R\$ 215.000,00	1	1	0,76	1	19,72	CONCLUÍDO	01/07/2016
224	Definição e Formalização do Processo de Gestão de TI	RICARDO KRAUSE	Processo regulamentado em 11/05/16. *** PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE *** Mapa de Benefícios anexado.	Concluído	14/04/2014	25/05/2016	14/04/2014	12/08/2016	100			1	1	0	1	41,02	CONCLUÍDO	11/05/2016
397	Mapeamento de novos processos ITIL	RICARDO KRAUSE	Produto final entregue em 08/08/2016. Mapa de benefícios anexado e custo lançado. *** PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE***	Concluído	28/07/2015	29/08/2016	28/07/2015	20/10/2016	100	R\$ 278.666,00	R\$ 136.000,00	1	1	0,48	0,75	123,5	CONCLUÍDO	08/08/2016
443	Curso EAD sobre PJe	JANINA ALVES FAGUNDES		Não Iniciado					0			0	0	0	0	0		
444	Manual amigável PJe (PJE Box)	PABLO PAULO LOPES BARROS	INCLUÍDO NO ESCOPO DO PROJETO 443	Não Iniciado					0			0	0	0	0	0		
445	Capacitação à distância em Segurança da Informação	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Posição Dez/16; primeira turma do curso finalizada dia 21/nov. Termo de aceite e de encerramento sendo revisado para a marcação da reunião de aceite.	Concluído	18/04/2016	14/12/2016	18/04/2016		96,79			0,87	0,96	0	1	14,08	CONCLUÍDO	28/11/2016

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA Andamento dos projetos - últimos 3 meses

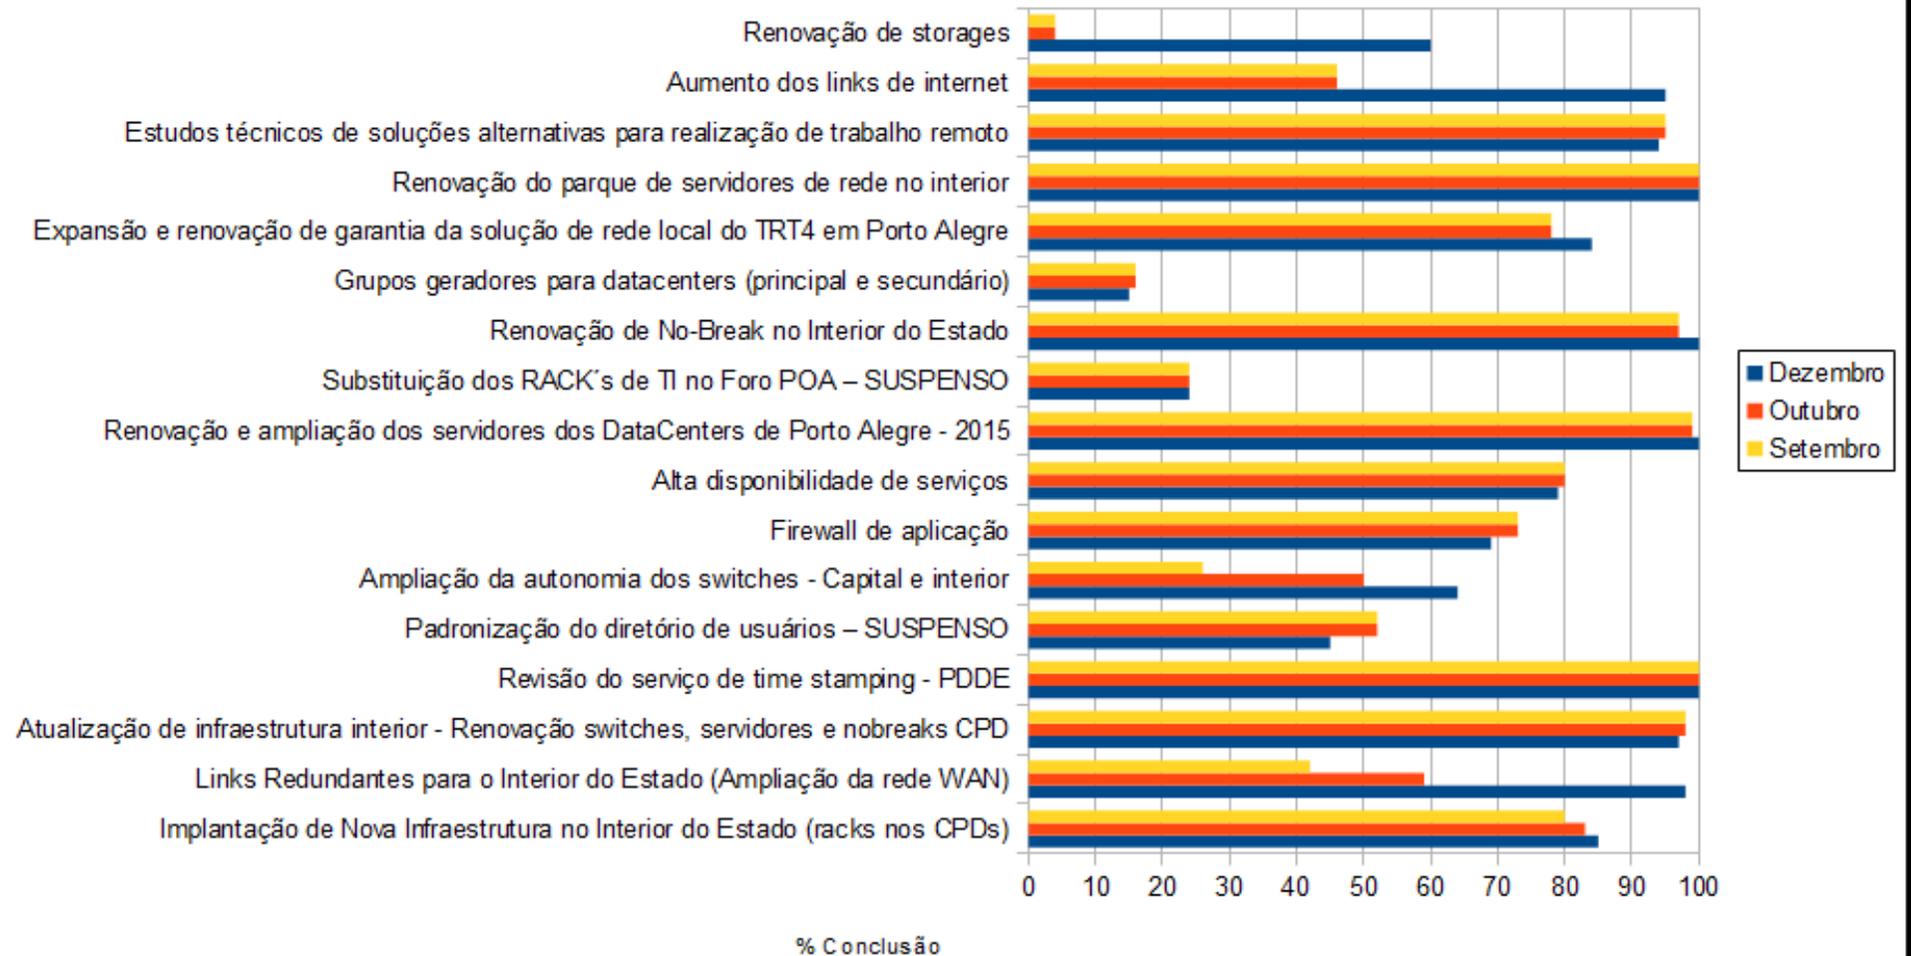

Id	Projeto	GP	Observacao	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição Dez/16: realizada a compra de 5 racks (confirmar o valor de R\$50.000,00). Solicitado no plano de aquisições 2017 a aquisição de mais 3 racks, no valor total de R\$60.000,00. Falta implantar em 11 localidades das 67 totais. SEMPRO havia se comprometido com 6 em 2016, ainda não realizadas e 5 em 2017.	Em Execução	09/01/2012	18/12/2017	19/04/2012		85,9	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	1	0,94	1	1	180,1	Localidades 2012/1 A 2014/02-Concluída; Localidades 2015/01-Em andamento; Compra de 5 racks-Em andamento; gerencia do projeto-Em andamento	15/12/2017
105	Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)	ADRIANO SIMIONI	Posição Dez/16: Projeto iniciou em 01/julho, tendo 120 dias para conclusão. Eliminada pendência da SEMPRO. Realizada conclusão da instalação dos links dia 30/nov. Necessário realizar aceite formal e encaminhar o encerramento do projeto.	Em Execução	07/05/2010	14/11/2016	17/01/2014		98,13	R\$ 2.360.000,00	R\$ 609.076,44	0,6	0,98	0,25	1	136,5	Análise de Soluções-Concluída; Contratação-Concluída; Implementação do link redundante-Concluída; Homologação e Aceite-Em andamento; Gerenciamento do Projeto-Em andamento	14/11/2016
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	Valor contido no orçamento de 2013 (R\$1.475.539,40). Dependência da SEMPRO. Posição Dez/16: Atendidos 59 foros, restando 2 para atender. GP encaminhou registro de mudança, com data final de entrega para 28/02/2017.	Em Execução	07/02/2014	07/03/2017	07/02/2014		97,39	R\$ 1.479.568,40	R\$ 1.479.559,40	0,88	0,98	0,99	1	-17,47	Foros atendidos até 08/2014-Concluída; Canoas-Em andamento; Caxias do Sul-Concluída; Erechim-Concluída; Esteio-Concluída; Santa Rosa-Concluída; Santa Rosa II-Concluída; São Jerônimo-Concluída; São Leopoldo I-Em andamento; Sapucaia do Sul-Concluída; Gerência de Projetos-Em andamento	28/02/2017
208	Revisão do serviço de time stamping - PDDE	ANDRE LUZ LVI	*** PROJETO CONCLUÍDO *** Mapa de Benefícios enviado.	Concluído	18/08/2014	10/12/2015	15/10/2014	02/09/2016	100	R\$ 224.340,00	R\$ 224.340,00	1	1	1	1	23,92	CONCLUÍDO	18/01/2016
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	Havia sido suspenso em agosto, até a regulamentação do licenciamento Microsoft para equipamentos servidores e usuários (licenças já recebidas). Depois permaneceu suspenso pela dependência da instalação dos links redundantes, o qual foi instalado em novembro/16. No entanto, não temos certeza que teremos orçamento para a manutenção dos dois links para 2017, para que a solução seja baseada em autenticação central. Enquanto isso, infra vai realizar testes em uma localidade, para validar como a autenticação central se comporta, a fim de depender apenas da questão orçamentária.	Suspensão	28/08/2014	19/02/2016	28/08/2014		45,89			0,33	0,45	0		0	Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Suspensa; Licitação-Suspensa; Execução-Suspensa; Gerência do Projeto-Em planejamento	
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	Posição Dez/16: Registro de mudança encaminhado. Data entrega do produto final permanece 19/12/2016. Adicionado custo de R\$77.99,00 para os no-breaks (já empenhado).	Em Execução	25/08/2014	13/01/2017	10/11/2014		64,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	1	0,69	0	1	49,05	Análise de viabilidade do projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Prédios Interior (cabearno elétrico)-Em andamento; Prédios Capital-Em andamento; Gerencia de Projeto-Em andamento	19/12/2016
211	Firewall de aplicação	ADRIANO SIMIONI	Posição Dez/16: Implantado em produção, porém, com alguns problemas. Sendo monitorado antes do aceite final.	Em Execução	09/02/2015	21/10/2016	04/03/2015		69,57	R\$ 248.437,00	R\$ 248.437,00	0,5	0,69	1	0,8	48,71	Análise Técnica-Concluída; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerencia de projeto-Em andamento	06/10/2016
212	Alta disponibilidade de serviços	ADRIANO SIMIONI	Posição Dez/16: Escopo reprovado, a redefinir. Elaborado o mapeamento da disponibilidade existente por serviço. Paulo marcará a apresentação para a Diretora da SETIC (definir nova data).	Em Execução	07/02/2014	23/09/2016	07/07/2014		79,5			0,33	0,79	0	1	38,35	Gerenciamento Projeto-Em andamento; Análise do Ambiente (Foco HA)-Em andamento; HA Banco Oracle-Concluída; entrega do CPD2-Concluída; Relatório Alta Disponibilidade-Em andamento; Adequações para alta disponibilidade-Em planejamento	31/03/2016
321	Renovação e ampliação dos servidores dos DataCenters de Porto Alegre - 2015	GERMANO	*** PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE ***. Custos lançados e Mapa de Benefícios anexado.	Concluído	31/10/2014	11/10/2016	21/11/2014	11/10/2016	100	R\$ 3.310.795,00	R\$ 2.777.840,00	1	1	0,83	1	56,16	CONCLUÍDO	14/06/2016

389	Substituição dos RACK's de TI no Foro POA	ADRIANO SIMIONI	PROJETO PARADO EM SET/2015 DEVIDO AO CORTE DE VERBA DA SEMPRO. Solicitado no Plano de Aquisições de 2017, a compra dos racks.	Suspensão	24/04/2015	15/02/2016	24/04/2015		24,48			0	0,24	0		0	Análise de Viabilidade de Projeto-Suspensa; Licitação-Em planejamento; Execução do Projeto-Em planejamento; Gerência de Projeto-Em planejamento	
390	Renovação de No-Break no Interior do Estado	ADRIANO SIMIONI	*** PROJETO CONCLUÍDO ***. Custos lançados e MAPA BENEFÍCIOS anexado.	Concluído	24/04/2015	15/06/2016	24/04/2015	10/11/2016	100	R\$ 350.000,00	R\$ 574.999,70	1	1	1,64	1	41,36	CONCLUÍDO	15/06/2016
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição Dez/16: SEMPRO elaborou o projeto executivo. Problema no pregão em 2016. Solicitação de compra incluída no Plano de Aquisições 2017.	Em Execução	01/06/2015	24/11/2016	01/06/2015		15,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0	0,15	0	0,8	100,6	Análise de Viabilidade da Solução-Em andamento; Licitações-Em andamento; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	
392	Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4 em Porto Alegre	ADRIANO SIMIONI	Posição Dez/16: cronograma em conjunto com a SEMPRO, com previsão de conclusão entre dezembro/16 a fev/17. Já instalados 2 no prédio Sede, de 57 (Sede e Foro). GP encaminhou registro de mudança com essas datas.	Em Execução	02/03/2015	24/11/2016	02/03/2015		84,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,5	0,84	0	1	164,7	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Licitações-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	28/02/2017
393	Renovação do parque de servidores de rede no interior	ADRIANO SIMIONI	Instalações concluídas em 14/03/16. *** PROJETO CONCLUÍDO NO TRACE *** Mapa de benefício anexado.	Concluído	01/06/2015	10/06/2016	01/06/2015	15/09/2016	100	R\$ 500.000,00	R\$ 599.600,00	1	1	1,19	1	75,36	CONCLUÍDO	14/03/2016
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição Dez/16: compra do netscaler gateway será realizada no início de 2017. Custo adicional ao projeto de 30 mil, contido na mudança encaminhada pelo GP em 23/nov. Aquisição aprovada pela CI (ata de 15/09/2016). Talvez seja realizada nova mudança no escopo e custo, para contemplar solução VDI.	Em Execução	02/03/2015	12/12/2016	14/08/2015		94,75	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,25	0,94	0	0,8	72,35	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	09/12/2016
441	Aumento dos links de internet	ADRIANO SIMIONI	Posição Dez/16: Realizado aceite contratual das instalações Level 3 e Avato. GP fez o Termo de Aceite. EP marcar reunião de Aceite do projeto. Atualizar no Trace a data de entrega do produto final.	Concluído	12/04/2016	17/10/2016	12/04/2016		95,45			0,85	0,95	0	1	67,53	CONCLUÍDO	26/09/2016
442	Renovação de storages	ADRIANO SIMIONI	Posição Dez/16: Aprovada pela CI aquisição dos storages em sistema ALL FLASH (ata CI de 15/09/2016) - R\$4.663.569,00 (já lançado no Trace). Planejamento era do produto ser entregue pelo fornecedor até 23/12, com previsão da instalação física até 20/01/2017 e lógica até 28/02, com treinamento posterior. GP avaliando as mudanças no planejamento para registro de mudança no projeto. Após, necessário aprovação da Diretora da SETIC na nova versão do plano de projeto.	Em Execução	14/04/2016	17/03/2017	25/04/2016		60,73	R\$ 5.000.000,00	R\$ 0,00	0,33	0,9	0	0,83	-21,89	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Em andamento; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	
