


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PROJETOS DA SETIC PDTI 2016-2017

Data: Abril/2017 v1.0

1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria

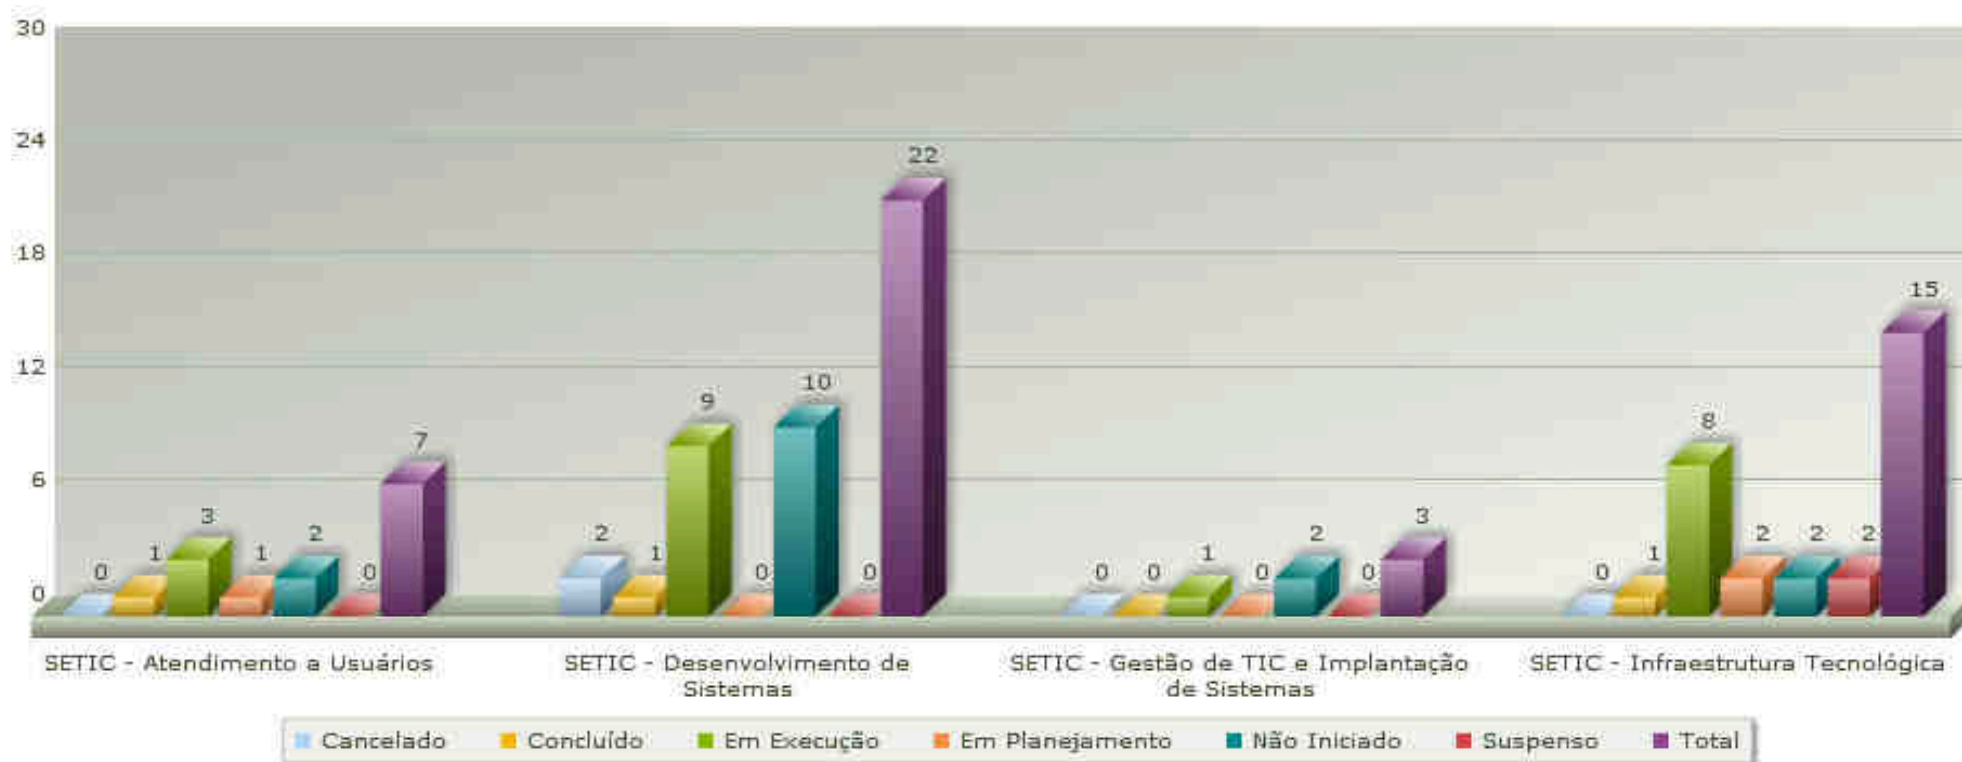


Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula IDE = (Quantidade de entregas realizadas no momento da medição) / (Quantidade de entregas previstas no momento da medição)</p>	<p>IEP - Indicador de Execução do Projeto Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula IEP = (Percentual de execução realizado) / (Percentual de execução previsto)</p>
<p>IDC - Indicador de Desempenho do Custo Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula IDC = (Custo acumulado real) / (Custo acumulado previsto)</p>	<p>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p>Fórmula IAM = (Qtd. de itens obrigatórios apresentados) / (Qtd. de itens obrigatórios previstos)</p>
<p>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p>Fórmula IPR = ((Duração Real do Projeto / Duração da Primeira Linha de Base) - 1) * 100</p>	

ATENDIMENTO A USUÁRIOS


Andamento dos projetos - últimos 3 meses

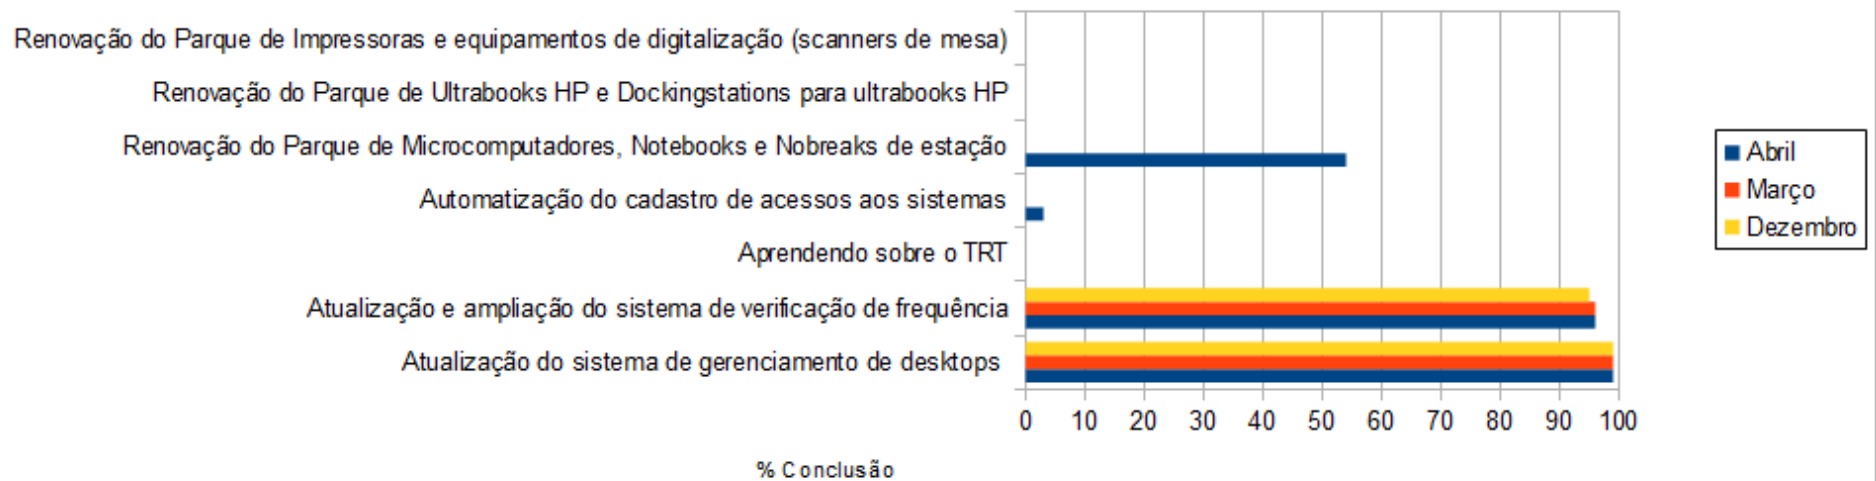

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
199	Atualização do sistema de gerenciamento de desktops	ANA LUCIA MOREIRA	Posição Abr/17: Aceite do produto (Assyst) em 20/01/2016. Realizadas duas reuniões de encerramento. Finalizando Termo de Encerramento e Mapa de Benefícios.	Concluído	05/02/2014	18/05/2015	11/04/2014		99,53			1	0,99	0	0,66	117,98	CONCLUÍDO	20/01/2016
242	Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	ANA LUCIA MOREIRA	Posição Abr/17: dia 29/março/2017, assinado pela Presidente o termo de rescisão unilateral do contrato com a empresa Roless, em razão da inexecução total do objeto do contrato (PA 0002884-44.2015). GP completar os termos para o encerramento do projeto.	Em Execução	10/04/2014	11/11/2016	10/04/2014		96,19	R\$ 222.650,00	R\$ 222.650,00	0,33	0,96	1	1	27,02	Estudar solução de relógio ponto com biometria com ou sem compra de software-Concluída; Licitação-Em andamento; Implantação-Em andamento	
425	Aprendendo sobre o TRT	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição Abr/17: Projeto deve ser retomado. Esclarecer dúvidas com a Natacha e elaborar plano de projeto.	Em Planejamento	11/04/2016	28/07/2016			0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento	
438	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição Abr/17: Reunião de kick-off realizada dia 31/março. SM elaborando requisitos. Em agendamento das reuniões com as equipes de desenvolvimento e infra envolvidas.	Em Execução	24/03/2017	31/07/2017	03/04/2017		2,75			0,5	0,09	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definição da listagem de métodos necessária para a integração com cada sistema (MARCO)-Em andamento; Plano de implementação dos serviços para gestão do cadastro (MARCO)-Designada; Desenvolvimento de serviços de automatização dos registros nas bases de dados (MARCO)-Designada; Desenvolvimento de uma interface de usuário única para a gestão de credenciais (MARCO)-Designada	14/07/2017
451	Renovação do Parque de Microcomputadores, Notebooks e Nobreaks de estação	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição Abr/17: Notebooks e microcomputadores comprados e em distribuição. Encaminhada a licitação dos nobreaks. Reunião de kick-off realizada dia 07/abril.	Em Execução	18/07/2016	17/07/2017	20/07/2016		54,47	R\$ 6.060.308,00	R\$ 5.419.746,00	0,66	0,65	0,89		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em andamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Documentação técnica dos microcomputadores e notebooks para licitação-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de microcomputadores e notebooks (MARCO)-Concluída; Documentação técnica dos no-breaks para licitação (MARCO)-Concluída; Contrato assinado com o fornecedor de no-breaks (MARCO)-Designada; Recebimento de 1350 computadores desktop com configuração padrão (MARCO)-Concluída; Recebimento de 92 computadores desktop com maior capacidade (MARCO)-Concluída; Recebimento de 236 notebooks (MARCO)-Concluída; Recebimento de 972 no-breaks (MARCO)-Designada; Instalação dos 1350 computadores desktop e dos 58 notebooks da EJ (MARCO)-Em andamento; Fornecimento dos 92 computadores desktop e dos 178 notebooks (MARCO)-Em andamento	29/06/2017

459	Renovação do Parque de Ultrabooks HP e Dockingstations para ultrabooks HP	EVERTON RAFAEL POLINA	Não Iniciado	23/03/2017	17/07/2017			0	R\$ 1.362.000,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento
460	Renovação do Parque de Impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	EVERTON RAFAEL POLINA	Não Iniciado	23/03/2017	17/07/2017			0	R\$ 1.283.172,11	R\$ 0,00	0	0	0	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento


DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

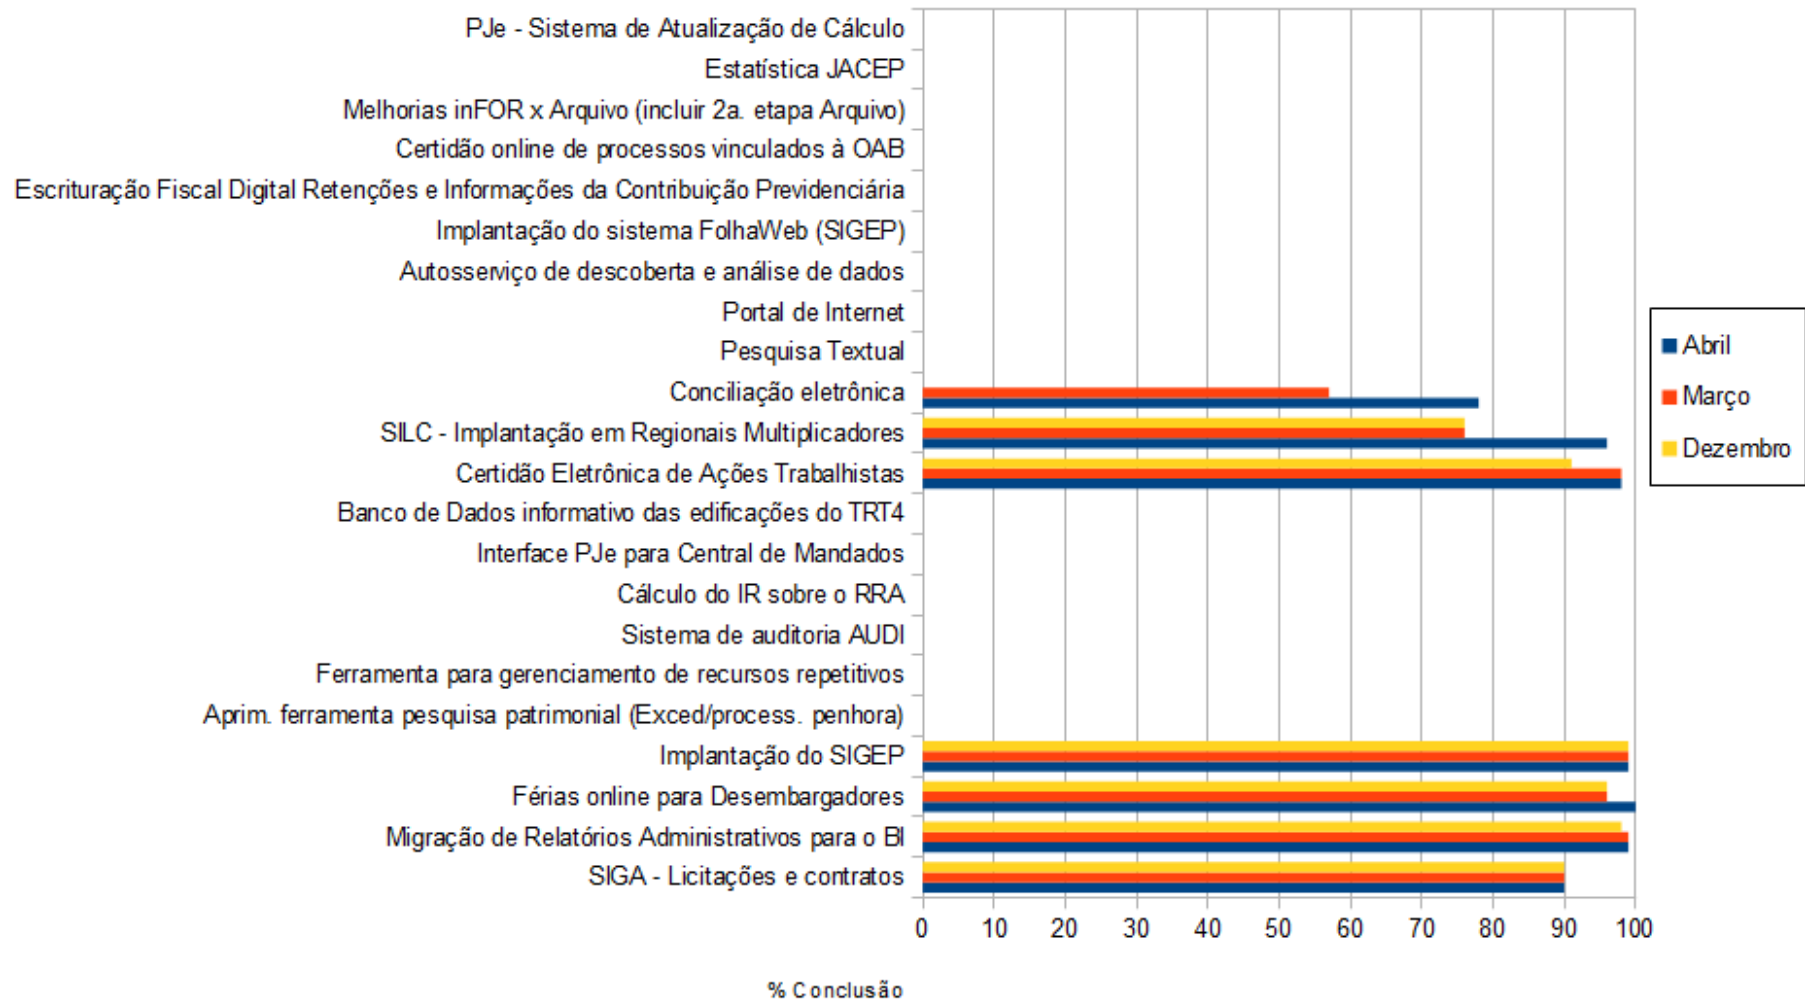

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
256	SIGA - Licitações e contratos	MARCIO BYSTRONS KI	Posição Abr/17: CLC realizou homologação da migração dos dados. SETIC realizando correções para ser possível homologação da retroalimentação e posterior implantação. GP fazer novo registro de mudança, para alterar prazo, incluir relatório no escopo do projeto e alterar nome do projeto para SILC.	Em Execução	07/03/2014	15/12/2017	05/06/2014		90,35	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,84	0,91	0	0,71	101,02	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS-Concluída; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em planejamento; PLANEJAMENTO DETALHADO-Concluída; ANÁLISE DE REQUISITOS-Concluída; Sprints anteriores: concluídas; Sprint 49 - Homologação da migração de dados-Em andamento; Sprint 50 - Fim da homologação e ajustes da migração de dados-Em planejamento; Sprint 51 - Ajustes da migração de dados-Em planejamento; Sprints 52 a 56 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atualizadas no SILC-Concluída; Sprints 52 a 56 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atualizadas no SILC-Concluída; Sprints 57 - Atualização do Sistema de Compras a partir de informações atualizadas no SILC-Em andamento; Sprint 58 - Homologação: não iniciado; Sprint 59 - Ajustes: não iniciado; Implantação: não iniciado.	
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	TIAGO GOMES SANTOS	Posição Abr/17: Entrega para a CSAUDE e SGE concluída. Desenvolvimento que foi feito para a SEGESP está sendo utilizado pelo AGE. Deve ser elaborada gestão de mudança para que a AGE realize o aceite e para adicionar o desenvolvimento do "Quadro de Cargos e Funções", a ser utilizado pela AGE.	Em Execução	25/02/2015	15/08/2016	25/02/2015		99,66			0,92	0,99	0	0,71	0	INÍCIO DO PROJETO-Concluída; GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS-Em planejamento; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em andamento; DESENVOLVIMENTO (Relatório Licenças - CSAUDE) -Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Pessoas - SEGESP)-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatório Equipamentos - SGE) - Concluída; DESENVOLVIMENTO (Cedências e Requisições - SEGESP) - Concluída; DESENVOLVIMENTO (Relatórios BI ADM - SEGESP)-Concluída; DESENVOLVIMENTO (Homologação SEGESP)-Concluída	12/09/2016
402	Férias online para Desembargadores	MARCIO BYSTRONS KI	Início utilização do sistema em produção dia 06/março/17. *** PROJETO CONCLUÍDO ***. Medir benefícios em Agosto/2017.	Concluído	23/03/2015	18/11/2015	23/03/2015	23/03/2017	100			1	1	0	0,66	0	CONCLUÍDO	06/03/2017
404	Implantação do SIGEP	MARCIO BYSTRONS KI	Posição Abr/17: todas as etapas do projeto concluídas. Área usuária sinalizou problemas na homologação. Intenção era implantar em 07/jan/2017. GP resgatar documentação e anexar no Trace: última versão do plano de projeto, atas e emails de envio, etc.	Em Execução	12/01/2015	30/09/2016	12/01/2015		99,97			1	0,99	0	0,57	15,61	ANÁLISE INICIAL DE REQUISITOS-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 1-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 2-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 3-Concluída; HOMOLOGAÇÕES E CORREÇÕES-Concluída	30/09/2016
428	Aprimoramento de ferramenta de pesquisa patrimonial (Excedentes e processamento de penhora)	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Projeto estratégico. Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016). Projeto sendo conduzido de forma global no TRT4 pela AGE. Ainda sem definição de requisitos.	Não Iniciado	12/04/2016	22/04/2016			0			0	0	0		0		
430	Ferramenta para gerenciamento de recursos repetitivos	TIAGO GOMES SANTOS	Projeto estratégico. Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016).	Não Iniciado	12/04/2016	22/04/2016			0			0	0	0		0		

457	Pesquisa Textual	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição Abr/2017: Kickoff realizado 07/abr. Ferramenta instalada para testes e conhecimento da equipe SDINT.	Em Execução	20/03/2017	14/08/2017							0	0	0	0,4	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definir escopo do produto-Em planejamento; Sprint 1-Em planejamento; Sprint 2-Em planejamento; Sprint 3-Em planejamento; Sprint 4-Em planejamento; Sprint 5-Em planejamento; Sprint 6-Em planejamento; Sprint 7-Em planejamento; Implantação-Em planejamento	04/08/2017
458	Portal de Internet	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição Abr/2017: Kickoff realizado 07/abril. Realizando migração dos programas.	Em Execução	20/03/2017	28/08/2017							0	0	0	0,4	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definir escopo do produto-Em planejamento; Sprint 1-Em planejamento; Sprint 2-Em planejamento; Sprint 3-Em planejamento; Sprint 4-Em planejamento; Sprint 5-Em planejamento; Sprint 6-Em planejamento; Sprint 7-Em planejamento; Sprint 8-Em planejamento; Implantação-Em planejamento	21/08/2017
461	Autosserviço de descoberta e análise de dados	TIAGO GOMES SANTOS	*** Anexar Proposta Projeto ***. Posição Abr/17: projeto em execução. Necessário formalizar plano de projeto e fazer reunião de kickoff. Incluir custo de aquisição da ferramenta e horas de consultoria.	Em Execução	06/04/2017	02/05/2017							0	0	0		0		
462	Implantação do sistema FolhaWeb (SIGEP)	MARCIO BYSTRONS KI	*** Anexar Proposta de Projeto ***	Não Iniciado	10/04/2017	04/05/2017							0	0	0		0		
463	Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF)	MARCIO BYSTRONS KI	*** Anexar Proposta de Projeto ***	Não Iniciado	10/04/2017	28/04/2017							0	0	0		0		
464	Certidão online de processos vinculados à OAB	JOICE PAVEK FIGUEIRO	*** Anexar Proposta de Projeto ***	Não Iniciado	10/04/2017	03/05/2017							0	0	0		0		
465	Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo)	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	*** Anexar Proposta de Projeto ***	Não Iniciado	10/04/2017	04/05/2017							0	0	0		0		
466	Estatística JACEP	TIAGO GOMES SANTOS	*** Anexar Proposta de Projeto ***	Não Iniciado	10/04/2017	08/05/2017							0	0	0		0		
467	PJe - Sistema de Atualização de Cálculo	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA		Não Iniciado	10/04/2017	05/05/2017							0	0	0		0		


GESTÃO DE TIC e IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

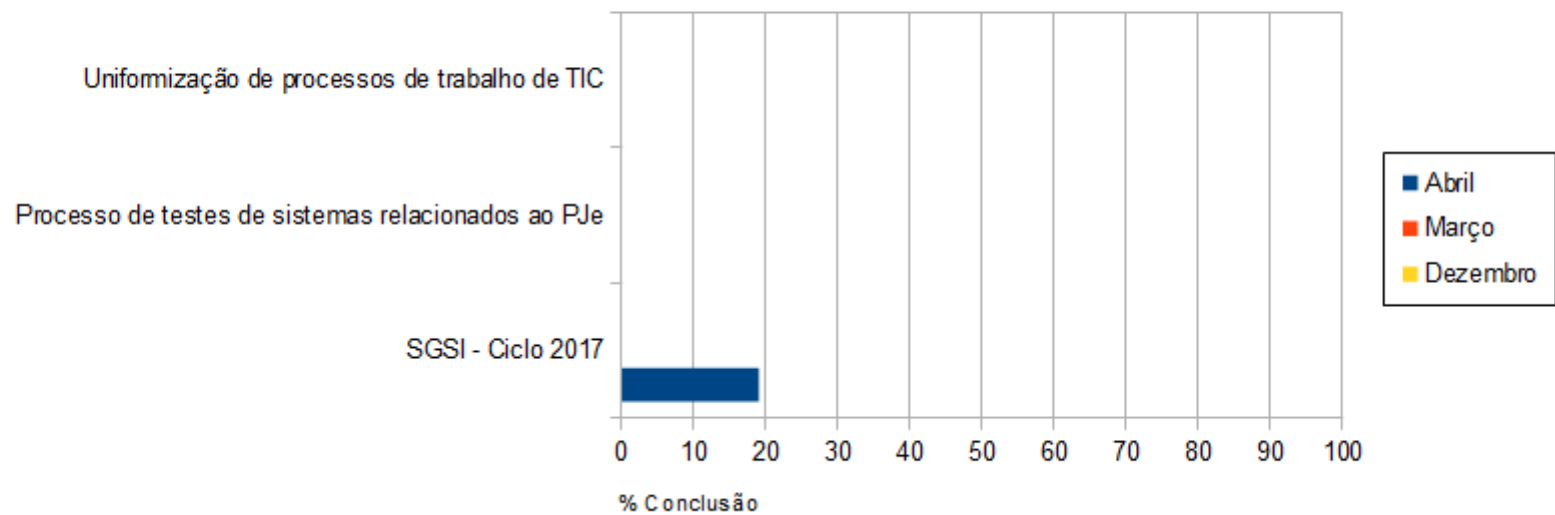

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Inicio Previsto	Fim Previsto	Inicio Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
452	SGSI - Ciclo 2017	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Posição Abr/17: definição do escopo e metodologia aprovados. Metas e indicadores definidos. Realizado primeiro teste de continuidade. Em análise a avaliação de riscos.	Em Execução	01/03/2017	17/04/2018	01/03/2017		18,67			1	0,85	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Formalização do Escopo do SGSI-Concluída; Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos -Concluída; Análise e Avaliação de Riscos-Em andamento; Declaração de Aplicabilidade-Designada; Plano de Tratamento de Riscos-Designada; Testes do Plano de Continuidade de TIC-Em andamento; Revisão do Plano de Continuidade de TIC-Designada; Treinamento e Conscientização em SI-Em andamento; Revisão da Política de Segurança da Informação-Designada; Indicadores SGSI-Em andamento; Análise Crítica do SGSI-Designada	04/04/2018
470	Processo de testes de sistemas relacionados ao PJe	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	*** Anexar Proposta de Projeto ***	Não Iniciado	17/04/2017	04/08/2017			0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento	
471	Uniformização de processos de trabalho de TIC	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	*** Anexar Proposta de Projeto ***	Não Iniciado	18/04/2017	07/08/2017			0			0	0	0		0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento	

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Andamento dos projetos - últimos 3 meses

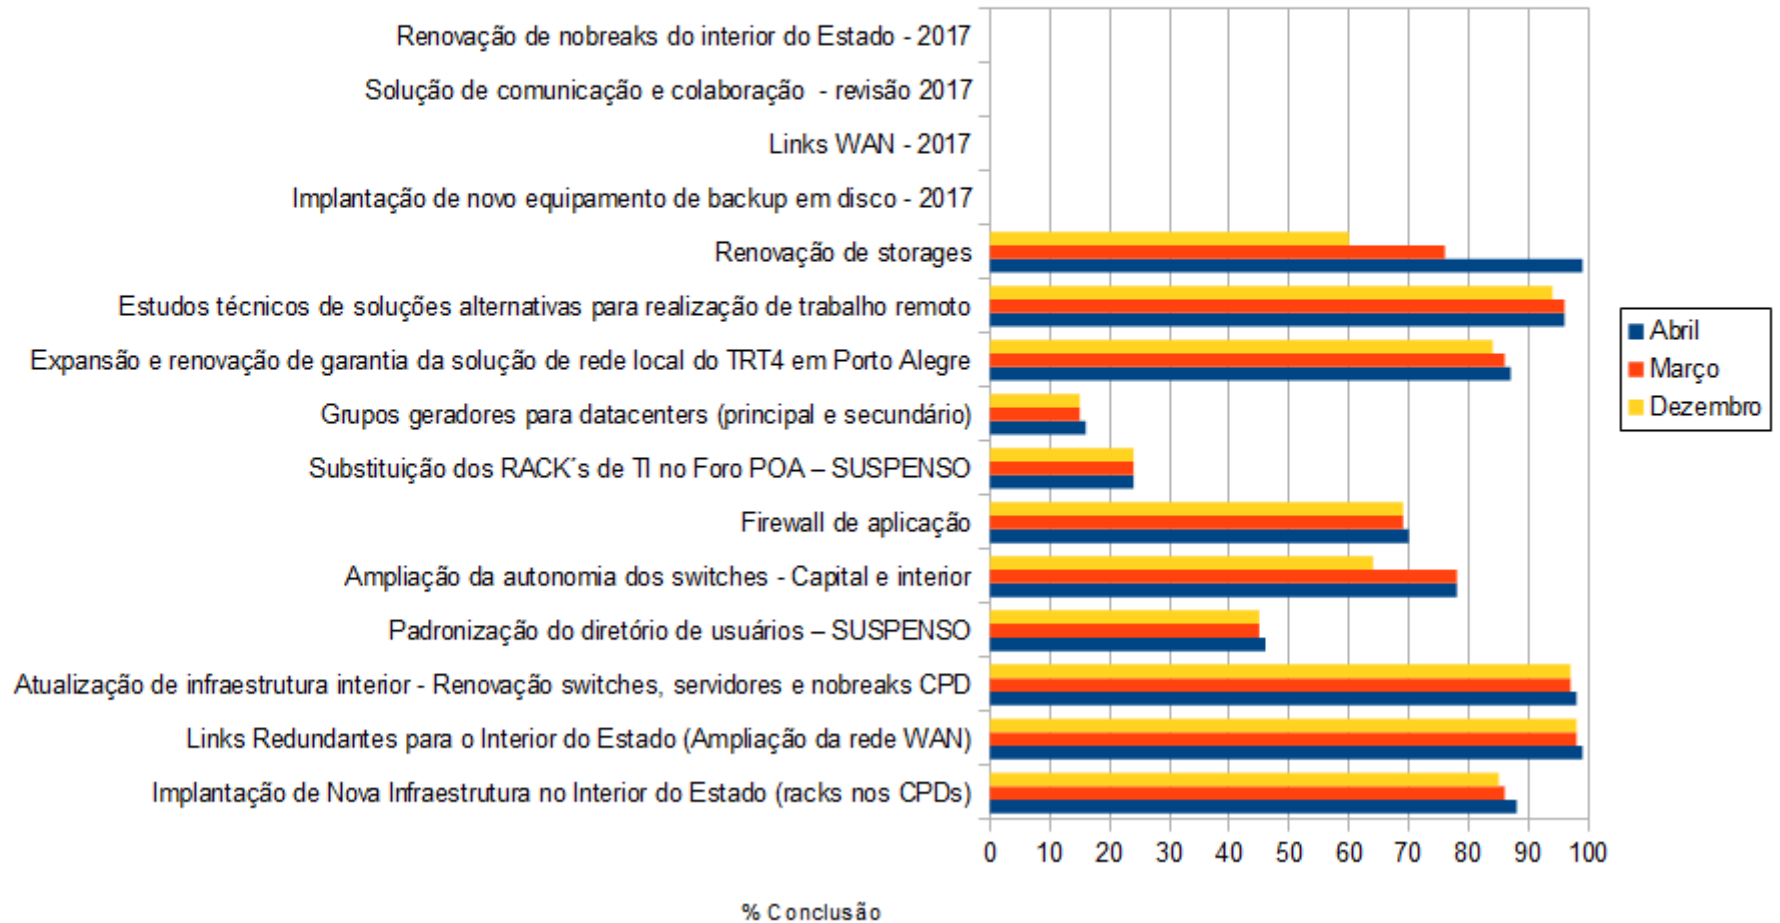

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição Abr/17: realizada a compra de 5 racks. Solicitado no plano de aquisições 2017 a aquisição de mais 3 racks, no valor total de R\$60.000,00 (caso realmente forem necessários, fazer registro de mudança). Falta implantar em 9 localidades das 67 totais, sendo feito conforme cronograma da SEMPRO.	Em Execução	09/01/2012	18/12/2017	19/04/2012		87,99	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	0,85	0,89	1	1	180,07	Localidades 2012/1-Concluída; Localidades 2012/2-Concluída; Localidades 2013/1-Concluída; Localidades 2013/2-Concluída; Localidades 2014/01-Concluída; Localidades 2014/02-Concluída; Localidades 2015/01-Em andamento; Compra de 5 racks-Em andamento; gerencia do projeto-Em andamento	15/12/2017
105	Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)	ADRIANO SIMIONI	Posição Abr/17: Realizada conclusão da instalação dos links dia 30/nov/16 (dado aceite para o fornecedor nesse dia). Necessário encaminhar Termo de Aceite e Termo de Encerramento do projeto.	Em Execução	07/05/2010	14/11/2016	17/01/2014		98,88	R\$ 3.686.840,00	R\$ 1.935.916,44	0,8	0,98	0,2	0,83	136,51	Análise de Soluções-Concluída; Contratação-Concluída; Implementação do link redundante-Concluída; Homologação e Aceite-Concluída; Gerenciamento do Projeto-Em andamento	30/11/2016
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	Valor contido no orçamento de 2013 (R\$1.475.539,40). Dependência da SEMPRO. Posição Abr/17: Atendidos 60 foros, restando 1 para atender. Aguardando data SEMPRO para novo cronograma.	Em Execução	07/02/2014	07/03/2017	07/02/2014		98,26	R\$ 1.479.568,40	R\$ 1.479.559,40	0,81	0,98	0,99	0,8	-17,47	Foros atendidos até 08/2014-Concluída; Canoas-Em andamento; Caxias do Sul-Concluída; Erechim-Concluída; Esteio-Concluída; Santa Rosa-Concluída; Santa Rosa II-Concluída; São Jerônimo-Concluída; São Leopoldo I-Concluída; Sapucaia do Sul-Concluída; Gerência de Projetos-Em andamento	28/02/2017
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	Havia sido suspenso em agosto/15, até a regulamentação do licenciamento Microsoft para equipamentos servidores e usuários (licenças já recebidas). Depois permaneceu suspenso pela dependência da instalação dos links redundantes, o qual foi instalado em novembro/16. Infra realizou testes em Guaíba e Alvorada, para validar como a autenticação central se comporta. Conforme PDTI, deve ser retomado em 2017.	Suspensão	28/08/2014	19/02/2016	28/08/2014		45,89			0,33	0,45	0	0		Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Suspensa; Licitação-Suspensa; Execução-Suspensa; Gerência do Projeto-Em planejamento	
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	Dependência da SEMPRO. Posição Abr/17: Adicionado custo de R\$77.900,00 para os no-breaks (já empenhado). Em homologação da solução.	Em Execução	25/08/2014	13/01/2017	10/11/2014		78,21	R\$ 77.900,00	R\$ 77.900,00	0,6	0,78	1	1	49,05	Análise de viabilidade do projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Prédios Interior (cabearno elétrico)-Concluída; Prédios Capital-Em andamento; Gerencia de Projeto-Em andamento	19/12/2016

211	Firewall de aplicação	ADRIANO SIMIONI	Posição Abr/17: Implantado em produção, porém, com alguns problemas na utilização do PJE (inexecução sendo avaliada).	Em Execução	09/02/2015	21/10/2016	04/03/2015	69,57	R\$ 248.437,00	R\$ 248.437,00	0,5	0,69	1	0,8	48,71	Análise Técnica-Concluída; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerencia de projeto-Em andamento	
389	Substituição dos RACK's de TI no Foro POA	ADRIANO SIMIONI	Posição Abr/17: Solicitado no Plano de Aquisições de 2017, a compra dos racks. Paulo Mendes vai validar com SEMPRO e Natacha os riscos de mudar o rack sem substituir o cabeamento. O que for necessário, irá encaminhar solicitação para a SEMPRO.	Suspensão	24/04/2015	15/02/2016	24/04/2015	24,48	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00	0	0,24	0	0	0	Análise de Viabilidade de Projeto-Suspensa; Licitação-Em planejamento; Execução do Projeto-Em planejamento; Gerencia de Projeto-Em planejamento	
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição Abr/17: SEMPRO elaborou o projeto executivo. Em contratação. Precisa ser replanejado após contrato assinado. Replanejar custo também. Compra incluída no Plano de Aquisições 2017.	Em Execução	01/06/2015	24/11/2016	01/06/2015	15,74	R\$ 797.085,61	R\$ 0,00	0	0,15	0	0,8	100,56	Análise de Viabilidade da Solução-Em andamento; Licitações-Em andamento; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	
392	Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4 em Porto Alegre	ADRIANO SIMIONI	Posição Abr/17: cronograma em conjunto com a SEMPRO. Nova previsão informada pela SEMPRO é de final de abril. Solicitado à SEMPRO o reposicionamento de 28 APs e acréscimo de 29 APs. Ambos já disponibilizados, faltando apenas 4 no Foro Prédio 1 e os do prédio Sede TRT.	Em Execução	02/03/2015	24/11/2016	02/03/2015	86,86	R\$ 1.330.448,12	R\$ 1.324.798,92	0,5	0,86	0,99	1	164,74	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Licitações-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	28/02/2017
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição Abr/17: compra do netcaler gateway realizada (custo adicional de 30 mil-mudança de 23/nov). Necessária nova mudança no escopo e custo, para contemplar solução VDI.	Em Execução	02/03/2015	12/12/2016	14/08/2015	96,27	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,5	0,96	0	0,8	72,35	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento	09/12/2016
442	Renovação de solução de storage	ADRIANO SIMIONI	Posição Abr/17: Produto final entregue em 17/março/2017. Termos de Aceite e Encerramento sendo revisados, para conclusão do projeto.	Concluído	14/04/2016	17/03/2017	25/04/2016	98,7	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.400.000,00	0,87	0,98	1,08	0,85	-16,78	CONCLUÍDO	17/03/2017
453	Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017	ADRIANO SIMIONI		Não Iniciado	13/03/2017	05/07/2017		0	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0	0	0	0		Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento	
454	Links WAN - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição Abr/17: intenção realizar reunião de kickoff dia 20/abr.	Em Planejamento	10/01/2017	30/11/2017		0	R\$ 2.033.643,48	R\$ 0,00	0	0	0	0		Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Levantamento de Requisitos-Em planejamento; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	
455	Solução de comunicação e colaboração - revisão 2017	ADRIANO SIMIONI		Não Iniciado	13/03/2017	05/07/2017		0	R\$ 414.612,00	R\$ 0,00	0	0	0	0		Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento	

456	Renovação de nobreaks do interior do Estado - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição Abr/17: intenção realizar reunião de kickoff dia 20/abr.	Em Planejamento	07/07/2016	31/07/2017			0	R\$ 176.000,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Especificação Técnica-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento
-----	--	-----------------	--	-----------------	------------	------------	--	--	---	----------------	----------	---	---	---	---	---
