

RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PROJETOS DA SETIC PDTI 2016-2017

Data: Junho/2017 v1.0

1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria




Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

| | |
|---|--|
| <p>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}$</p> | <p>IEP - Indicador de Execução do Projeto Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}$</p> |
| <p>IDC - Indicador de Desempenho do Custo Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}$</p> | <p>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p>Fórmula $IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}$</p> |
| <p>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p>Fórmula $IPR = ((\text{Duração Real do Projeto} / \text{Duração da Primeira Linha de Base}) - 1) * 100$</p> | |

ATENDIMENTO A USUÁRIOS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

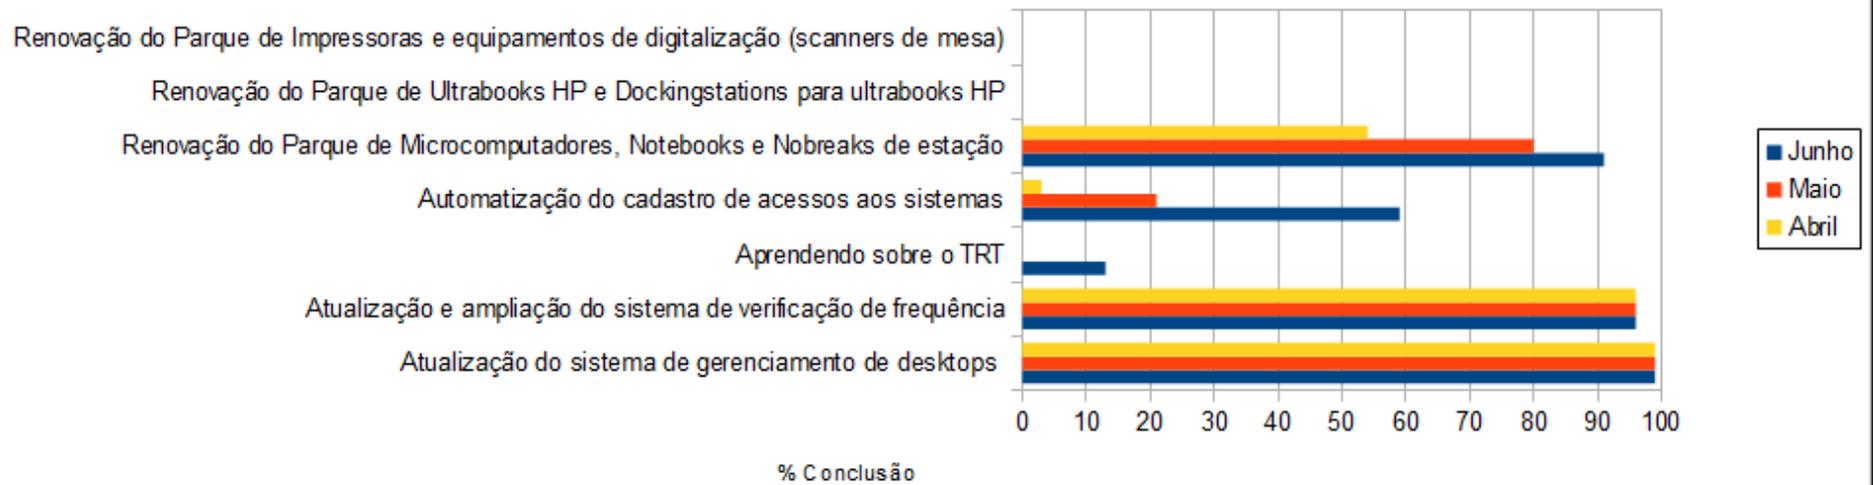


ATENDIMENTO A USUÁRIOS

| Id | Projeto | GP | Observacao | Status | Início Previsto | Fim Previsto | Início Realizado | Fim Realizado | %C | Custo Estimado | Custo Realizado | IDE | IEP | IDC | IAM | IPR | Status Entregas | Entrega Produto Final |
|-----|---|-----------------------|--|-----------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------|----------------|-----------------|------|------|-----|------|--------|---|-----------------------|
| 199 | Atualização do sistema de gerenciamento de desktops | ANA LUCIA MOREIRA | Posição junho/17: Aceite do produto (Assyst) em 20/01/2016. Aguardando aprovação da Natacha no Termo de Encerramento (metodologia anterior), para finalização do projeto. | Concluído | 05/02/2014 | 18/05/2015 | 11/04/2014 | | 99,53 | | | 1 | 0,99 | 0 | 0,83 | 117,98 | | 20/01/2016 |
| 242 | Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência | ANA LUCIA MOREIRA | Posição junho/17: dia 29/março/2017, assinado pela Presidente o termo de rescisão unilateral do contrato com a empresa Roless, em razão da inexecução total do objeto do contrato (PA 0002884-44.2015). Natacha enviou em 05/junho email para a SEGESP se manifestar quanto ao interesse na continuidade do projeto. | Em Execução | 10/04/2014 | 11/11/2016 | 10/04/2014 | | 96,19 | R\$ 222.650,00 | R\$ 222.650,00 | 0,33 | 0,96 | 1 | 0,75 | 27,02 | Estudar solução de relógio ponto com biometria com ou sem compra de software-Concluída; Licitação-Em andamento; Implantação-Em andamento | |
| 425 | Aprendendo sobre o TRT | EVERTON RAFAEL POLINA | Posição junho/17: reunião de kick-off realizada dia 08/06. Treinamento turma 1 iniciará dia 28/06. Turma 4 encerrará dia 16/08. Visitas acontecerão de 01/08 a 31/10. Projeto deve ser encerrado em 2017. | Em Planejamento | 04/05/2017 | 20/11/2017 | 15/05/2017 | | 13,21 | | | | | | | | Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Designada; Planejamento de Treinamentos e Visitas -Em andamento; Treinamentos-Em andamento; Visitas-Em planejamento | 31/10/2017 |
| 438 | Automatização do cadastro de acessos aos sistemas | EVERTON RAFAEL POLINA | Posição junho/17: Especificação e desenvolvimento em andamento na maioria das equipes e já concluída na SDS2, internet e DB. SDSA não tem previsão de quando vão priorizar o desenvolvimento. | Em Execução | 24/03/2017 | 31/07/2017 | 03/04/2017 | | 59,52 | | | 0,33 | 0,69 | 0 | 1 | 0 | Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Definição da listagem de métodos necessária para a integração com cada sistema-Em andamento; Plano de implementação dos serviços para gestão do cadastro-Em andamento; Desenvolvimento de serviços de automatização dos registros nas bases de dados-Em andamento; Interface de usuário única gestão de credenciais-Em andamento | 14/07/2017 |

| Id | Projeto | GP | Observacao | Status | Inicio Previsto | Fim Previsto | Inicio Realizado | Fim Realizado | %C | Custo Estimado | Custo Realizado | IDE | IEP | IDC | IAM | IPR | Status Entregas | Entrega Produto Final | |
|-----|---|-----------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------|------------------|------------------|-----|------|------|-----|-----|--|-----------------------|--|
| 451 | Renovação do Parque de Microcomputadores, Notebooks e Nobreaks de estação | EVERTON RAFAEL POLINA | Posição junho/17: Notebooks e microcomputadores comprados e em distribuição. Encaminhada a licitação dos nobreaks, pregão será em 16/06. Após assinatura do contrato, fazer registro de mudança no projeto. | Em Execução | 18/07/2016 | 17/07/2017 | 20/07/2016 | | 90,88 | R\$ 6.060.308,00 | R\$ 5.419.746,00 | 0,9 | 0,96 | 0,89 | 1 | 0 | Plano Projeto-Concluída; Encerramento-Designada; Documentação técnica-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de microcomputadores e notebooks-Concluída; Documentação técnica dos no-breaks para licitação-Concluída; Contrato assinado-Designada; Recebimento de 1350 computadores desktop com configuração padrão-Concluída; Recebimento de 92 computadores desktop com maior capacidade-Concluída; Recebimento de 236 notebooks-Concluída; Recebimento de 972 no-breaks-Designada; Instalação dos 1350 computadores desktop e dos 58 notebooks da E.J-Concluída; Fornecimento dos 92 computadores desktop e dos 178 notebooks -Concluída | 29/06/2017 | |
| 459 | Renovação do Parque de Ultrabooks HP e Dockingstations para ultrabooks HP | EVERTON RAFAEL POLINA | Posição junho/17: verificar se TRT4 será partícipe da licitação nacional. Fazer plano e kick-off (segundo semestre 2017). | Não Iniciado | 23/03/2017 | 17/07/2017 | | | 0 | R\$ 1.362.000,00 | R\$ 0,00 | | | | | | | | |
| 460 | Renovação do Parque de Impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa) | EVERTON RAFAEL POLINA | Posição junho/2017: projeto em planejamento. Fazer kick-off na semana de 19/06. | Em Planejamento | 23/03/2017 | 17/07/2017 | | | 0 | R\$ 1.283.172,11 | R\$ 0,00 | | | | | | Plano-Em planejamento; Encerramento-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Levantamento de Requisitos-Em planejamento; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento | | |

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Andamento dos projetos - últimos 3 meses

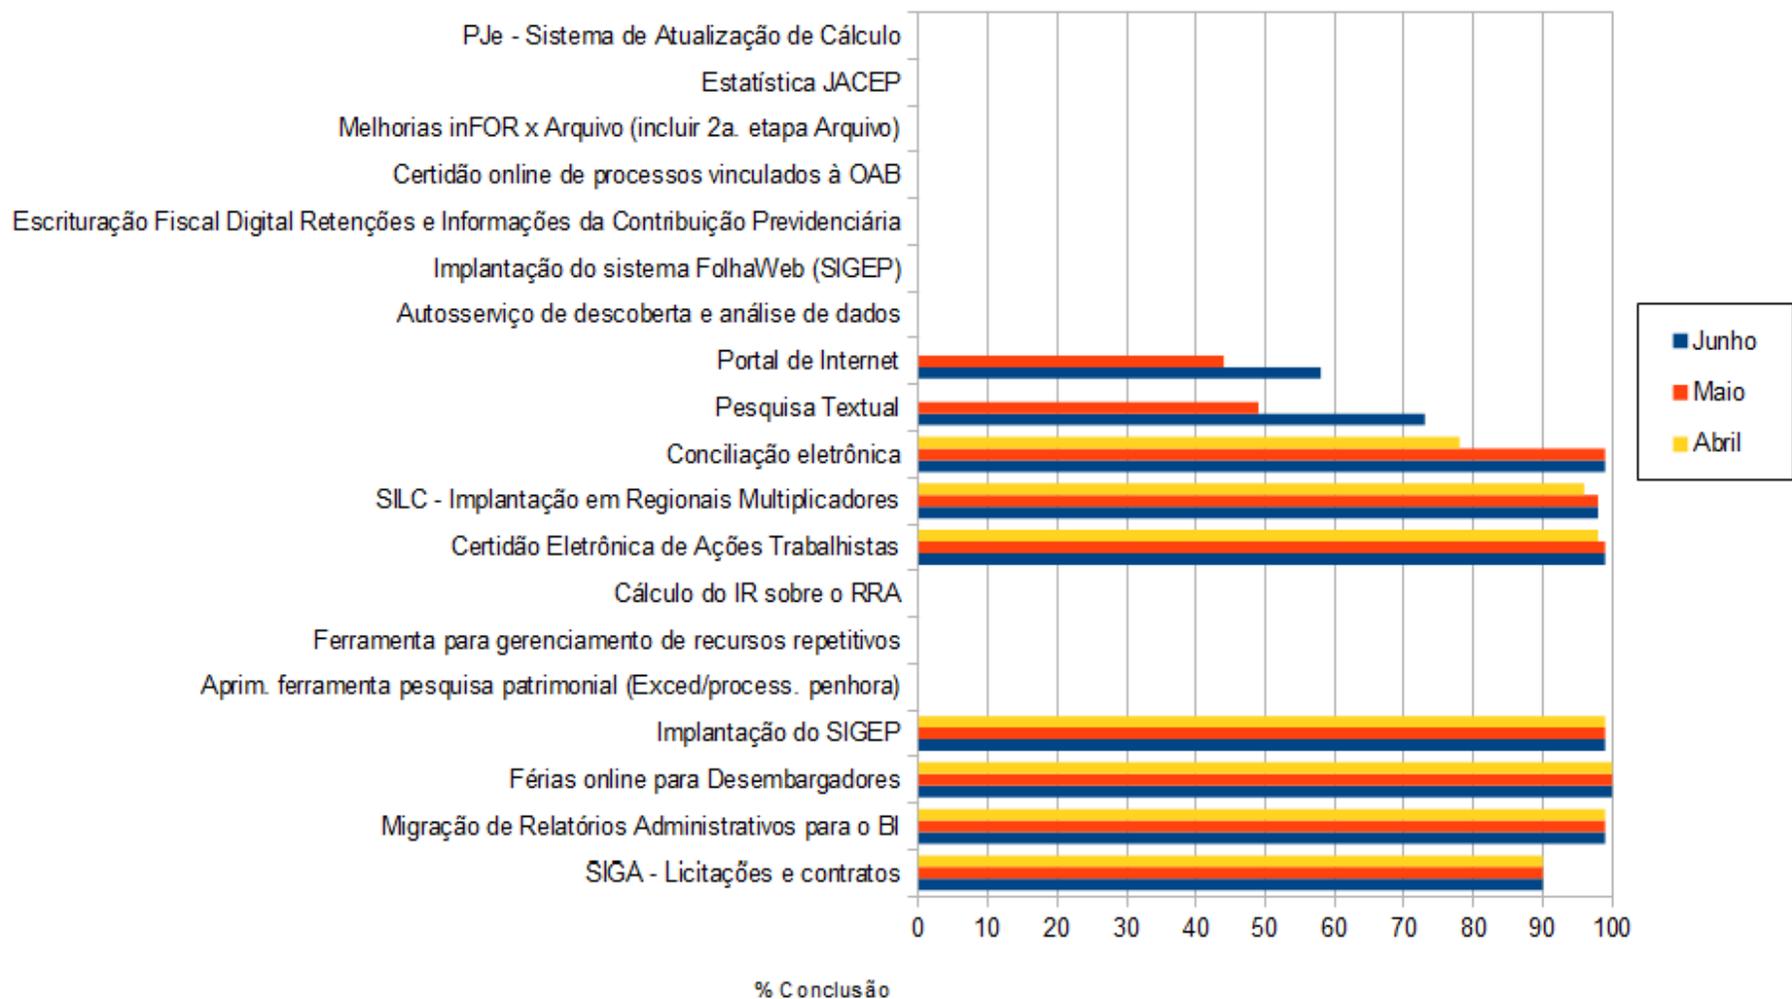


DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

| Id | Projeto | GP | Observacao | Status | Inicio Previsto | Fim Previsto | Inicio Realizado | Fim Realizado | %C | Custo Estimado | Custo Realizado | IDE | IEP | IDC | IAM | IPR | Status Entregas | Entrega Produto Final |
|-----|---|--------------------------|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------|----------------|-----------------|------|------|-----|------|-------|--|-----------------------|
| 256 | SIGA - Licitações e contratos | MARCIO BYSTRONS KI | Posição Junho/17: CLC realizou homologação da migração dos dados. Atualmente está homologando a retroalimentação (deveria concluir em 16/06). Natacha está negociando nova data para entrada em produção: 03/julho. GP fazer novo registro de mudança, para alterar prazo, incluir relatório no escopo do projeto e alterar nome do projeto para SILC. | Em Execução | 07/03/2014 | 22/02/2017 | 05/06/2014 | | 90,35 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | 0,84 | 0,9 | 0 | 0,71 | 56,57 | ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em planejamento; PLANEJAMENTO DETALHADO-Concluída; ANÁLISE DE REQUISITOS-Concluída; Sprints 1 a 48-Concluída; Sprint 49 - Homologação da migração de dados-Em andamento; Sprint 50 - Fim da homologação e ajustes da migração de dados-Em planejamento; Sprint 51 - Ajustes da migração de dados-Em planejamento; Sprints 52 a 56-Concluída; Sprints 56 e 57-Em planejamento; Implantação: não iniciada | 03/07/2017 |
| 387 | Migração de Relatórios Administrativos para o BI | TIAGO GOMES SANTOS | Posição junho/17: Entrega para a CSAUDE e SGE concluída. Desenvolvimento que foi feito para a SEGESP está sendo utilizado pelo AGE. AGE deverá dar o aceite do projeto (não será feita gestão de mudanças) AGE não priorizou novas demandas nos relatórios (dash de pessoas). Projeto será encerrado. No encerramento, justificar cancelamento da parte SEGESP. GP elaborar termos de aceite e encerramento para reuniões na semana de 19/junho. Informada pela Natacha data de 31/05/2017 como conclusão. | Em Execução | 25/02/2015 | 15/08/2016 | 25/02/2015 | | 99,66 | | | 0,92 | 0,99 | 0 | 0,71 | 0 | INÍCIO DO PROJETO-Concluída; GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS-Em planejamento; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em andamento; DESENVOLVIMENTO Sprint 1 a 26: Concluída Encerramento do projeto: em andamento | 12/09/2016 |
| 402 | Férias online para Desembargadores | MARCIO BYSTRONS KI | Início utilização do sistema em produção dia 06/março/17. *** PROJETO CONCLUÍDO ***. Medir benefícios em Agosto/2017. | Concluído | 23/03/2015 | 18/11/2015 | 23/03/2015 | 23/03/2017 | 100 | | | 1 | 1 | 0 | 0,66 | 0 | | 06/03/2017 |
| 404 | Implantação do SIGEP | MARCIO BYSTRONS KI | Posição junho/17: todas as etapas do projeto concluídas. Escopo do projeto vai até a migração. SEGESP informou para o controle interno de que está homologado. GP resgatar documentação e anexar no Trace: última versão do plano de projeto, atas e emails de envio, etc. GP fazer Termos de Aceite e de Encerramento. Fazer aceite com a SEGESP. | Em Execução | 12/01/2015 | 30/09/2016 | 12/01/2015 | | 99,97 | | | 1 | 0,99 | 0 | 0,57 | 15,61 | ANÁLISE INICIAL DE REQUISITOS-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 1-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 2-Concluída; DESENVOLVIMENTO - FASE 3-Concluída; HOMOLOGAÇÕES E CORREÇÕES-Concluída | 30/09/2016 |
| 428 | Aprimoramento de ferramenta de pesquisa patrimonial (Excedentes e processamento de penhora) | LUCIA GONTARSKI SPERANZA | Posição Junho/2017: projeto sendo conduzido pela AGE (escopo diferente da proposta inicial do projeto - validar com Natacha). SETIC realizando reuniões para detalhamento dos requisitos, a fim de estimar a complexidade do projeto. | Não Iniciado | 12/04/2016 | 22/04/2016 | | | 0 | | | | | | | | | |

| Id | Projeto | GP | Observacao | Status | Inicio Previsto | Fim Previsto | Inicio Realizado | Fim Realizado | %C | Custo Estimado | Custo Realizado | IDE | IEP | IDC | IAM | IPR | Status Entregas | Entrega Produto Final | |
|-----|---|--------------------------------|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------|----------------|-----------------|------|------|-----|------|-------|---|-----------------------|--|
| 430 | Ferramenta para gerenciamento de recursos repetitivos | TIAGO GOMES SANTOS | Projeto estratégico. Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016). Projeto deve iniciar no segundo semestre/2017. | Não Iniciado | 12/04/2016 | 22/04/2016 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 436 | Cálculo do IR sobre o RRA | MARCIO BYSTRONS KI | Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016). DG deverá fornecer maiores informações antes do início. Posição junho/17: Conforme conversa entre Farias e Eder, esse projeto é menos prioritário do que o REINF (463). | Não Iniciado | 13/04/2016 | 25/04/2016 | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 446 | Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas | LUIZ FERNANDO ESTIVALET | Posição junho/17: reunião de aceite realizada dia 09/junho. Fazer reunião de encerramento. Repasse para SAU planejado para 13/06 e publicação da regulamentação até 14/06. | Em Execução | 03/05/2016 | 08/03/2017 | 03/05/2016 | | 98,73 | | | 0,85 | 0,98 | 0 | 1 | 230,5 | PLANEJAMENTO-Concluída; Sistema web para elaboração de certidões de ações trabalhistas-Concluída; Entrega 1 - Certidão em HTML-Concluída; EXECUÇÃO DA SPRINT-Concluída; DESENVOLVIMENTO SPRINT 14 - CERTIDÃO POR UNIDADE JUDICIÁRIA-Concluída; EXECUÇÃO DA SPRINT-Concluída; Treinamento da equipe de atendimento-Em planejamento | 14/06/2017 | |
| 447 | SILC - Implantação em Regionais Multiplicadores | DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO | Posição junho/17: Estudos Técnicos Preliminares aprovado pelo CSJT. A implantação nos demais regionais será projeto gerenciado pelo Conselho. Reunião de aceite realizada dia 12/junho. Elaborar ata e realizar a reunião de encerramento. | Em Execução | 12/09/2016 | 11/01/2017 | 12/09/2016 | | 97,96 | | | 0,91 | 0,97 | 0 | 0,83 | -1,47 | Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em andamento; Sprints-Concluídas | 22/02/2017 | |
| 448 | Conciliação Eletrônica | FABIO DE OLIVEIRA GARCIA | Posição junho/17: em encerramento. Reunião de aceite realizada dia 16/06. Termo com prazo de aprovação até 23/06. | Em Execução | 12/12/2016 | 29/03/2017 | 12/12/2016 | | 99,67 | | | 1 | 0,99 | 0 | 0,87 | 23,06 | SPRINT Autenticação de usuários-Concluída; SPRINT Unificação de Módulos-Concluída; SPRINT Customização de layout, textos e mensagens-Concluída; HOMOLOGAÇÃO NEGOCIAL-Concluída; Manuais dos usuários-Concluída; Treinamento-Concluída; Implantação do sistema em produção-Concluída | 09/05/2017 | |

| Id | Projeto | GP | Observacao | Status | Inicio Previsto | Fim Previsto | Inicio Realizado | Fim Realizado | %C | Custo Estimado | Custo Realizado | IDE | IEP | IDC | IAM | IPR | Status Entregas | Entrega Produto Final |
|-----|---|--------------------------|---|--------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|----|----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|-----------------------|
| 464 | Certidão online de processos vinculados à OAB | JOICE PAVEK FIGUEIRO | Posição junho/17: verificar se pode ser atendido na CEAT. Em caso positivo, cancelar como projeto e atender como ação. | Não Iniciado | 10/04/2017 | 28/04/2017 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 465 | Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo) | LUIZ FERNANDO ESTIVALET | Posição junho/17: Farias precisa avaliar a lista com as solicitações (Natacha) e o chamado no Assyst, para avaliar o que precisa ser feito. | Não Iniciado | 10/04/2017 | 04/05/2017 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 466 | Estatística JACEP | TIAGO GOMES SANTOS | Posição junho/17: Projeto deve iniciar no segundo semestre/2017. | Não Iniciado | 10/04/2017 | 04/05/2017 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 467 | PJe - Sistema de Atualização de Cálculo | FABIO DE OLIVEIRA GARCIA | | Não Iniciado | 10/04/2017 | 05/05/2017 | | | 0 | | | | | | | | | |

GESTÃO DE TIC e IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

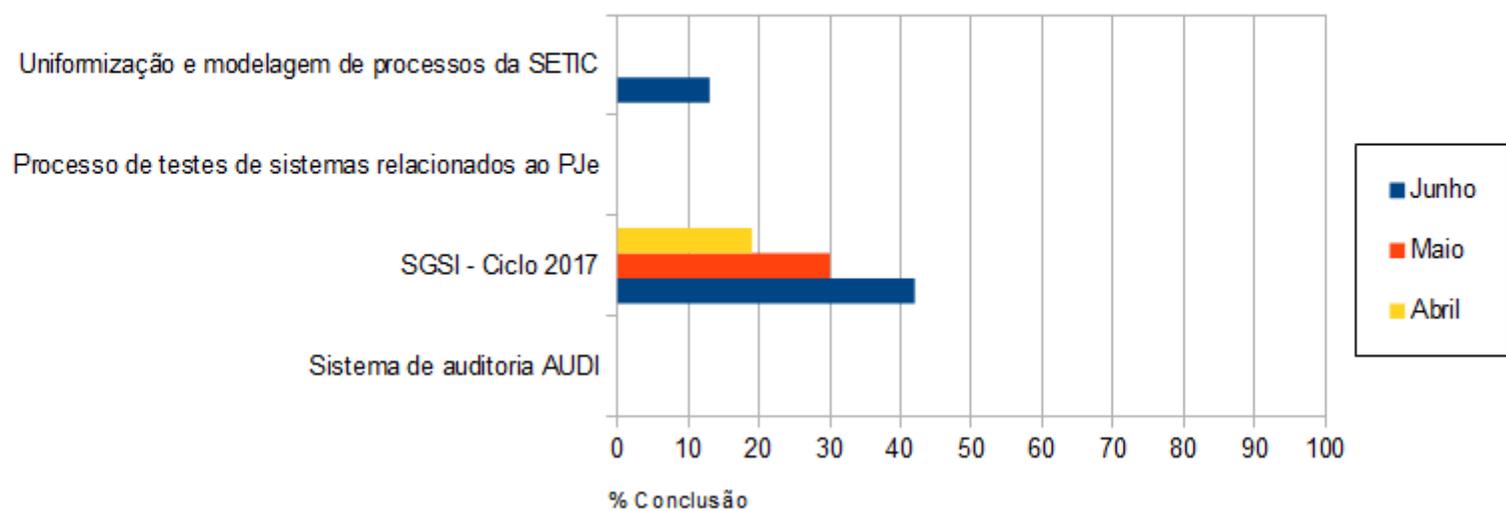


GESTÃO DE TIC / IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

| Id | Projeto | GP | Observacao | Status | Inicio Previsto | Fim Previsto | Inicio Realizado | Fim Realizado | %C | Custo Estimado | Custo Realizado | IDE | IEP | IDC | IAM | IPR | Status Entregas | Entrega Produto Final |
|-----|--|--|--|--------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------|----------------|-----------------|------|------|-----|-----|-----|--|-----------------------|
| 433 | Sistema de auditoria AUDI | PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2) | Posição junho/17: solicitar à SECONT que encaminhe o termo de cooperação para iniciar a implantação do sistema. Fazer plano de projeto para reunião de kick-off. | Não Iniciado | 13/04/2016 | 01/08/2016 | | | 0 | | | | | | | | | |
| 452 | SGSI - Ciclo 2017 | CLEONICE SANTOS CONDOTTA | Posição junho/17: mapeamento dos processos e preparação dos questionários para avaliação de riscos concluídos. Em prazo para respostas dos questionários. Declaração de aplicabilidade aguardando aprovação da Administração. Turma 2 EAD em execução. | Em Execução | 01/03/2017 | 17/04/2018 | 01/03/2017 | | 42,33 | | | 0,75 | 1,13 | 0 | 1 | 0 | Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Formalização do Escopo do SGSI-Concluída; Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos -Concluída; Análise e Avaliação de Riscos-Em andamento; Declaração de Aplicabilidade-Em andamento; Plano de Tratamento de Riscos-Designada; Testes do Plano de Continuidade de TIC-Em andamento; Revisão do Plano de Continuidade de TIC-Designada; Treinamento e Conscientização em SI-Em andamento; Revisão da Política de Segurança da Informação-Designada; Indicadores SGSI-Em andamento; Análise Crítica do SGSI-Designada | 04/04/2018 |
| 470 | Processo de testes de sistemas relacionados ao PJe | PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2) | Posição junho/17: reunião de kick-off realizada dia 16/junho. Natacha definiu data de 30/11 para conclusão. Ajustar cronograma e enviar plano de projeto. | Não Iniciado | 17/04/2017 | 04/08/2017 | | | 0 | | | | | | | | | |

| Id | Projeto | GP | Observacao | Status | Inicio Previsto | Fim Previsto | Inicio Realizado | Fim Realizado | %C | Custo Estimado | Custo Realizado | IDE | IEP | IDC | IAM | IPR | Status Entregas | Entrega Produto Final |
|-----|---|--------------------------|---|-------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------|----------------|-----------------|-----|------|-----|------|-----|--|-----------------------|
| 471 | Uniformização e modelagem de processos da SETIC | RICARDO KRAUSE KURYLENKO | Posição junho/17: reunião de kick-off realizada dia 09/junho. Em modelagem dos processos dos níveis de serviço e do plano anual de capacitação. | Em Execução | 22/05/2017 | 31/01/2018 | 22/05/2017 | | 13,04 | | | 0 | 0,46 | 0 | 0,66 | 0 | Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)- Em andamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Modelagem processo de monitoramento e de aferição dos níveis de serviços (SLA's) (CAU/CGTIC)-Em andamento; Modelagem processo de construção do plano anual de capacitação (CGTIC)- Em andamento; Modelagem processo de modelagem de processos (CGTIC/SETIC)-Em planejamento; Modelagem processo de gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC (CIT/CGTIC)-Em planejamento; Regulamentação (CGTIC/SETIC)-Em planejamento | 30/11/2017 |

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Andamento dos projetos - últimos 3 meses

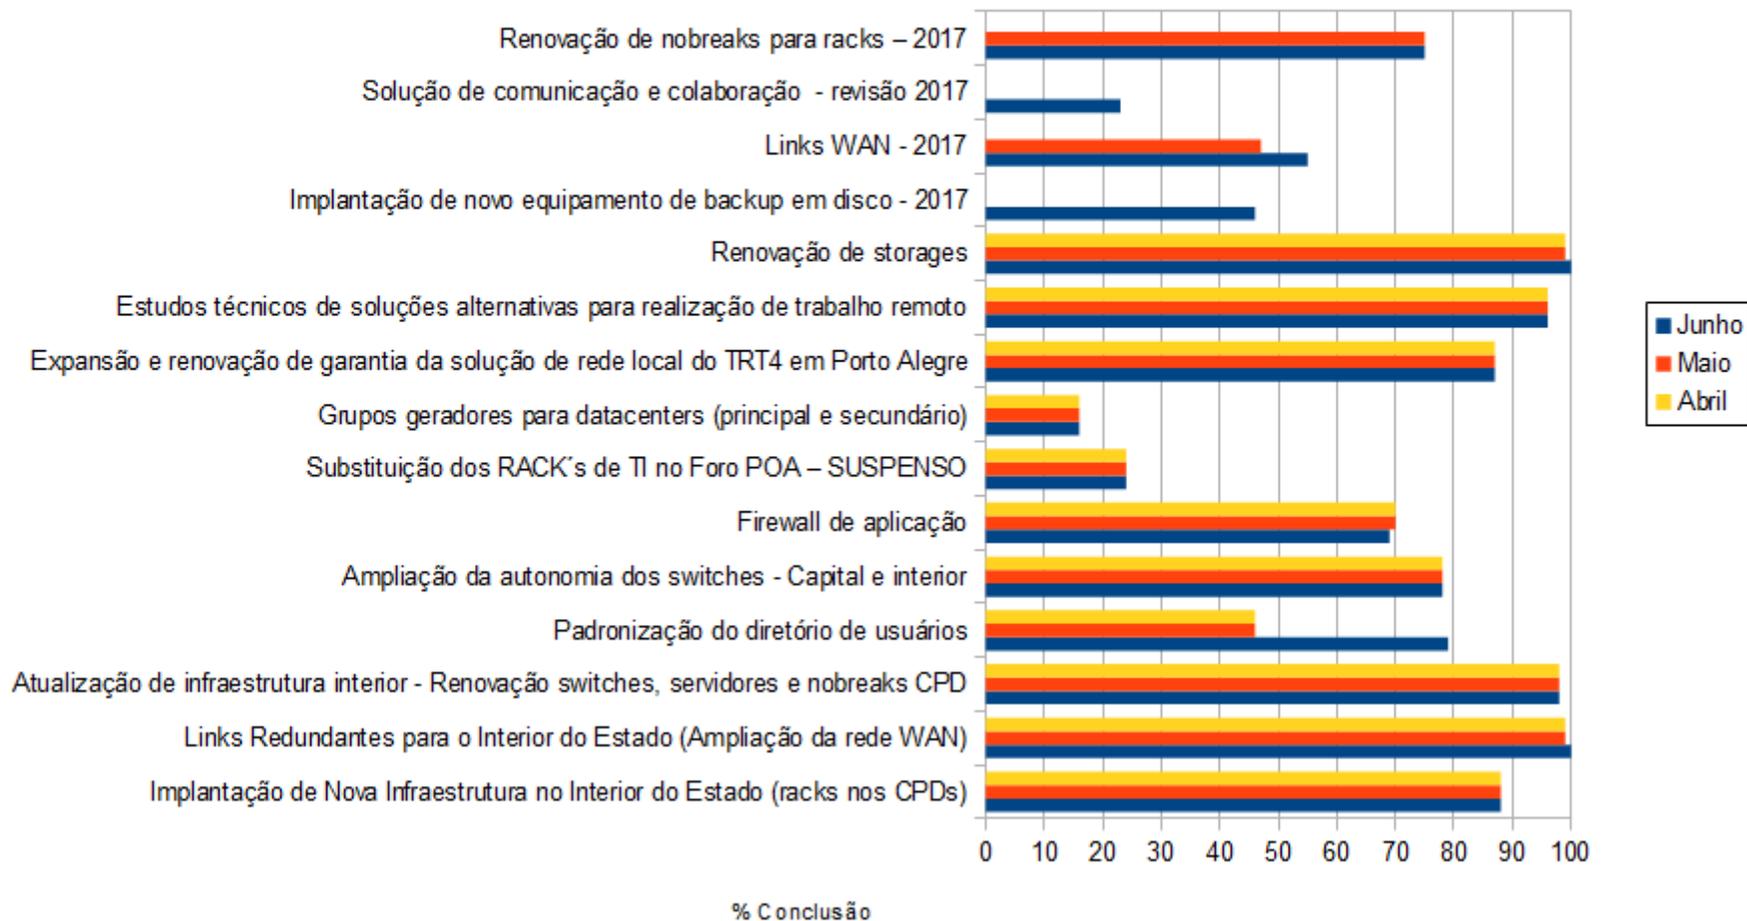

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

| Id | Projeto | GP | Observacao | Status | Inicio Previsto | Fim Previsto | Inicio Realizado | Fim Realizado | %C | Custo Estimado | Custo Realizado | IDE | IEP | IDC | IAM | IPR | Status Entregas | Entrega Produto Final |
|-----|--|--------------------|---|-------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------|------------------|------------------|------|------|------|------|--------|---|-----------------------|
| 52 | Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs) | ADRIANO SIMIONI | Projeto com dependência da SEMPRO. Posição junho/17: conforme reunião com a sempro em 06/06: Arroio Grande: nova sede prevista para 2018. Rede ficará como está. Camaquã: dezembro/2017. Cruz Alta: 2018. Ijuí: outubro/2017 (rack 2). Lagoa Vermelha (excluída do projeto). Três Passos: 2018. Canoas: dezembro/2017. Viamão: nova sede prevista para setembro/2017 e sala atual não comporta novo rack ((rack3). Santiago: SETIC transferir os ativos para dentro do novo rack (parte da sempro está pronta). Gramado: Sempro e SETIC avliaram que não é necessário pois a sala não comporta novo rack (seria necessária a realização de obra) e o CPD não apresenta problemas. | Em Execução | 09/01/2012 | 18/12/2017 | 19/04/2012 | | 87,99 | R\$ 453.000,00 | R\$ 453.000,00 | 0,85 | 0,89 | 1 | 1 | 180,07 | Localidades 2012/1-Concluída; Localidades 2012/2-Concluída; Localidades 2013/1-Concluída; Localidades 2013/2-Concluída; Localidades 2014/01-Concluída; Localidades 2014/02-Concluída; Localidades 2015/01-Em andamento; Compra de 5 racks-Em andamento; gerencia do projeto-Em andamento | 15/12/2017 |
| 105 | Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN) | ADRIANO SIMIONI | PROJETO CONCLUÍDO. Anexar Mapa de Benefícios. Informações solicitadas para Adriano e Gustavo, dia 29/maio17. | Em Execução | 07/05/2010 | 14/11/2016 | 17/01/2014 | 11/05/2017 | 100 | R\$ 1.326.840,00 | R\$ 1.326.840,00 | 1 | 1 | 0,11 | 0,77 | 136,51 | Análise de Soluções-Concluída; Contratação-Concluída; Implementação do link redundante-Concluída; Homologação e Aceite-Concluída; Gerenciamento do Projeto-Concluída | 30/11/2016 |
| 202 | Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD | ERNANI SOARES KERN | Projeto com dependência da SEMPRO. Posição junho/2017: Canoas: dezembro/2017. Em conversa com o Luis da Sempro este informou que eles farão a reforma em Canoas em 1 VT de cada vez, instalando rack de parede, puxando a rede eletrológica, e incluindo o switch que forneceremos. As mudanças devem começar em maio, após finalizarem as redes elétricas dos nobreaks da capital. SETIC instalar os switches após reforma da Sempro. | Em Execução | 07/02/2014 | 07/03/2017 | 07/02/2014 | | 98,26 | R\$ 1.479.568,40 | R\$ 1.479.559,40 | 0,81 | 0,98 | 0,99 | 0,8 | -17,47 | Foros atendidos até 08/2014-Concluída; Canoas-Em andamento; Caxias do Sul-Concluída; Erechim-Concluída; Esteio-Concluída; Santa Rosa-Concluída; Santa Rosa II-Concluída; São Jerônimo-Concluída; São Leopoldo I-Concluída; Sapucaia do Sul-Concluída; Gerência de Projetos-Em andamento | 28/02/2017 |
| 209 | Padronização do diretório de usuários | VOLNEI CESAR SUSIN | Posição junho/2017: Projeto retomado e em replanejamento. Apresentado estudo para Natacha dia 09/06. CIT fazer levantamento e avaliar custo benefício em adquirimos novos servidores para cada localidade. Após, realizar gestão de mudança. | Em Execução | 28/08/2014 | 19/12/2017 | 28/08/2014 | | 78,72 | | | 1 | 0,91 | 0 | 0,5 | 125,94 | Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Em andamento; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência do Projeto-Em planejamento | |

| Id | Projeto | GP | Observacao | Status | Inicio Previsto | Fim Previsto | Inicio Realizado | Fim Realizado | %C | Custo Estimado | Custo Realizado | IDE | IEP | IDC | IAM | IPR | Status Entregas | Entrega Produto Final |
|-----|---|--------------------|--|-------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------|------------------|------------------|-----|------|------|------|--------|--|-----------------------|
| 210 | Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior | ERNANI SOARES KERN | Projeto com dependência da SEMPRO. Posição junho/2017: Interior: concluída a extensão da rede elétrica até os switches. Verificado pela SETIC apenas em Passo fundo e apresentou defeito (curto circuito). Aguardando solução da SEMPRO. Necessidade de verificar todas as demais localidades. Prédio Sede: concluído em maio/2017. Prédio Adm: fazer o circuito elétrico (ligação switch-nobreak). Prédio Foro 1: fazer o circuito elétrico (ligação switch-nobreak). Prédio Foro 2: fazer o circuito elétrico (ligação switch-nobreak). Prédio Foro 3: fazer o circuito elétrico (ligação switch-nobreak). | Em Execução | 25/08/2014 | 13/01/2017 | 10/11/2014 | | 78,21 | R\$ 77.900,00 | R\$ 77.900,00 | 0,6 | 0,78 | 1 | 0,75 | 49,05 | Análise de viabilidade do projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Prédios Interior (cabeario elétrico)-Concluída; Prédios Capital-Em andamento; Gerencia de Projeto-Em andamento | 19/12/2016 |
| 211 | Firewall de aplicação | ADRIANO SIMIONI | Posição junho/17: Produto apresentou problemas na utilização do PJE, que inviabilizaram o aceite do produto. Processo de inexecução está com a CGTIC. O objetivo do projeto deve continuar, apresentar solução sem a licitação. | Em Execução | 09/02/2015 | 21/10/2016 | 04/03/2015 | | 69,57 | R\$ 248.437,00 | R\$ 248.437,00 | 0,5 | 0,69 | 1 | 0,6 | 48,71 | Análise Técnica-Concluída; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerencia de projeto-Em andamento | |
| 389 | Substituição dos RACK's de TI no Foro POA | ADRIANO SIMIONI | Projeto com dependência da SEMPRO. Posição junho/17: Solicitado no Plano de Aquisições de 2017, a compra dos racks. Para viabilizar, é necessário agenda conjunta entre SEMPRO e SETIC, em finais de semana, para operacionalizar a troca dos racks. Compra dos racks será encaminhada somente se houver possibilidade de realizar as trocas conforme cronograma a ser construído. Relatório encaminhado para a SEMPRO, aguardando retorno. | Suspensão | 24/04/2015 | 15/02/2016 | 24/04/2015 | | 24,48 | R\$ 60.000,00 | R\$ 0,00 | 0 | 0,24 | 0 | 0 | 0 | Análise de Viabilidade de Projeto-Suspensa; Licitação-Em planejamento; Execução do Projeto-Em planejamento; Gerencia de Projeto-Em planejamento | |
| 391 | Grupos geradores para datacenters (principal e secundário) | ADRIANO SIMIONI | Posição junho/17: Primeira licitação falhou. Está em processo de repetição do certame. Previsão de publicação até final de junho. Fazer gestão de mudança. | Em Execução | 01/06/2015 | 24/11/2016 | 01/06/2015 | | 15,74 | R\$ 797.085,61 | R\$ 0,00 | 0 | 0,15 | 0 | 0,8 | 100,56 | Análise de Viabilidade da Solução-Em andamento; Licitações-Em andamento; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento | |
| 392 | Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4 em Porto Alegre | ADRIANO SIMIONI | Projeto com dependência da SEMPRO. Posição junho/2017: concluídas as instalações, restando apenas verificar pendência no 10º andar do prédio sede (falta 1 ap). Falta conectar cabos. | Em Execução | 02/03/2015 | 24/11/2016 | 02/03/2015 | | 86,86 | R\$ 1.330.448,12 | R\$ 1.324.798,92 | 0,5 | 0,86 | 0,99 | 0,8 | 164,74 | Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Licitações-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento | 28/02/2017 |
| 394 | Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto | ADRIANO SIMIONI | Posição junho/17: compra do netscaler gateway realizada (custo adicional de 30 mil-mudança de 23/nov). Retomar VDI. Replanejar projeto. Informada pela Natácha data de 30/06/2017 como conclusão. | Em Execução | 02/03/2015 | 12/12/2016 | 14/08/2015 | | 96,27 | R\$ 30.000,00 | R\$ 0,00 | 0,5 | 0,96 | 0 | 0,8 | 72,35 | Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento | |
| 442 | Renovação de solução de storage | ADRIANO SIMIONI | PROJETO CONCLUÍDO. Fazer Mapa de Benefícios (medir final de Junho). | Concluído | 14/04/2016 | 17/03/2017 | 25/04/2016 | 15/05/2017 | 100 | R\$ 5.000.000,00 | R\$ 5.400.000,00 | 1 | 1 | 1,08 | 1 | -16,78 | | 17/03/2017 |

| Id | Projeto | GP | Observacao | Status | Inicio Previsto | Fim Previsto | Inicio Realizado | Fim Realizado | %C | Custo Estimado | Custo Realizado | IDE | IEP | IDC | IAM | IPR | Status Entregas | Entrega Produto Final |
|-----|---|-----------------|---|-----------------|-----------------|--------------|------------------|---------------|-------|------------------|-----------------|-----|------|-----|-----|-----|--|-----------------------|
| 453 | Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017 | ADRIANO SIMIONI | Posição junho/2017: especificação da compra já em andamento. Kick-off realizado dia 09/junho. Aprovar plano de projeto e anexar docs no trace. | Em Execução | 13/03/2017 | 19/12/2017 | 19/05/2017 | | 45,69 | R\$ 900.000,00 | R\$ 0,00 | 0,5 | 0,87 | 0 | 0 | 0 | Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em andamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento | 18/12/2017 |
| 454 | Links WAN - 2017 | ADRIANO SIMIONI | Posição junho/17: kickoff dia 20/abr. Encaminhado para licitação. Edital pronto, aguardando data pregão. Necessário entrar em contato com a SEMPRO assim que encerrar a licitação, principalmente se o vencedor não for a OI (provável necessidades de adequações). | Em Planejamento | 10/01/2017 | 30/11/2017 | 09/03/2017 | | 55,39 | R\$ 2.033.643,48 | R\$ 0,00 | | | | | | Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento | 30/11/2017 |
| 455 | Solução de comunicação e colaboração - revisão 2017 | ADRIANO SIMIONI | Posição junho/2017: kick-off realizado dia 09/junho. Em elaboração do termo de referência. | Em Planejamento | 13/03/2017 | 16/11/2017 | 06/06/2017 | | 22,72 | R\$ 414.612,00 | R\$ 0,00 | | | | | | Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em andamento; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Implantação-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento | 29/09/2017 |
| 456 | Renovação de nobreaks para racks - 2017 | ADRIANO SIMIONI | Posição junho/17: kick-off realizado dia 20/abr. Aguardando homologação do leilão. | Em Planejamento | 07/07/2016 | 31/07/2017 | 30/09/2016 | | 75,17 | R\$ 176.000,00 | R\$ 0,00 | | | | | | Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Especificação Técnica-Concluída; Contratação-Em andamento; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento | 31/07/2017 |
