


# RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

## PROJETOS DA SETIC PDTI 2016-2017

Data: Agosto/2017 v1.0

### 1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria

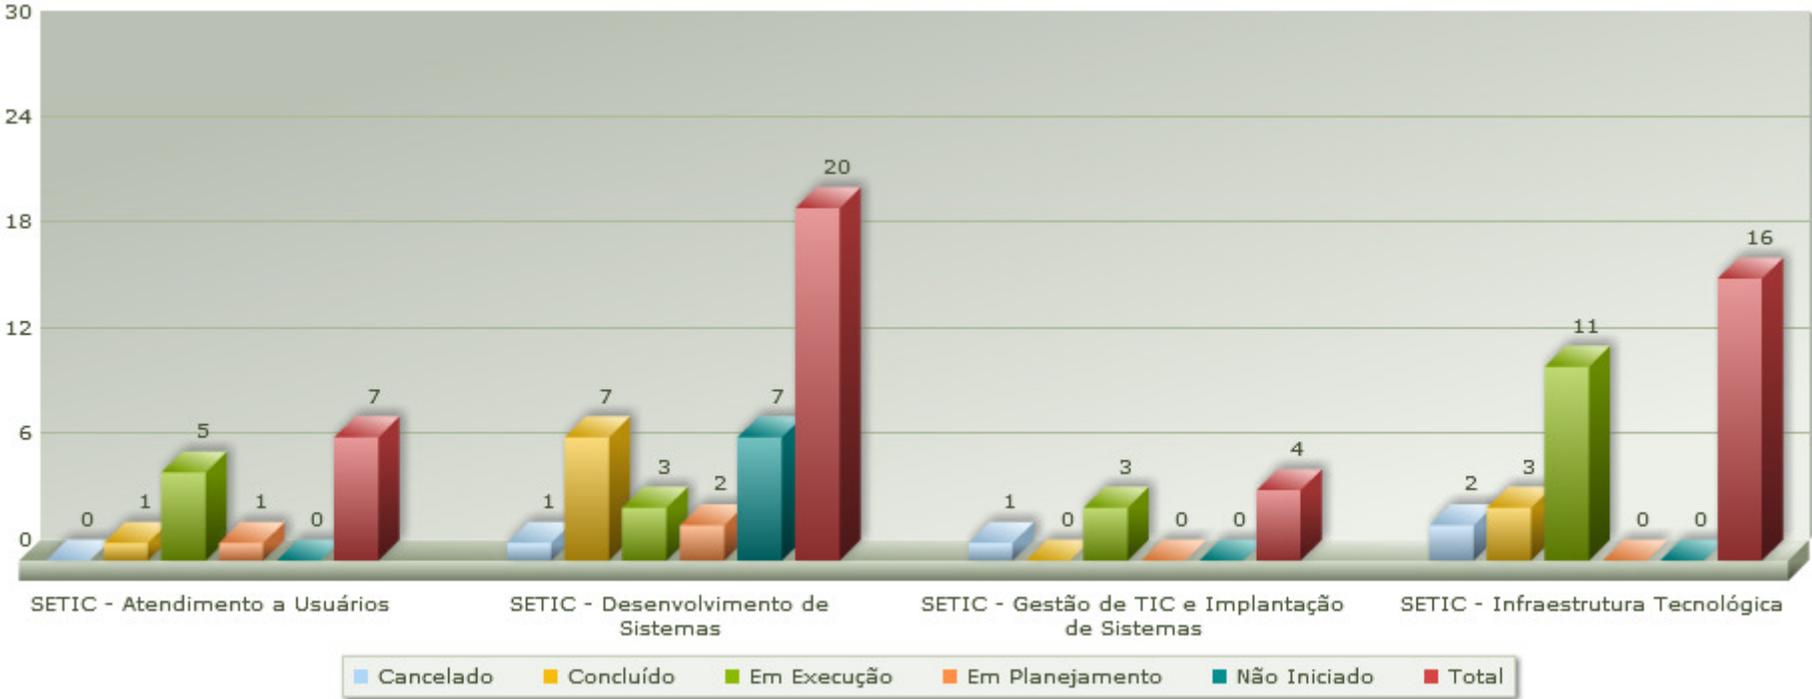


### Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório

O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p><b>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo</b> Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}</math></p>	<p><b>IEP - Indicador de Execução do Projeto</b> Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}</math></p>
<p><b>IDC - Indicador de Desempenho do Custo</b> Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}</math></p>	<p><b>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia</b> Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}</math></p>
<p><b>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento</b> Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p><b>Fórmula</b> <math>IPR = ((\text{Duração Real do Projeto} / \text{Duração da Primeira Linha de Base}) - 1) * 100</math></p>	


### ATENDIMENTO A USUÁRIOS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

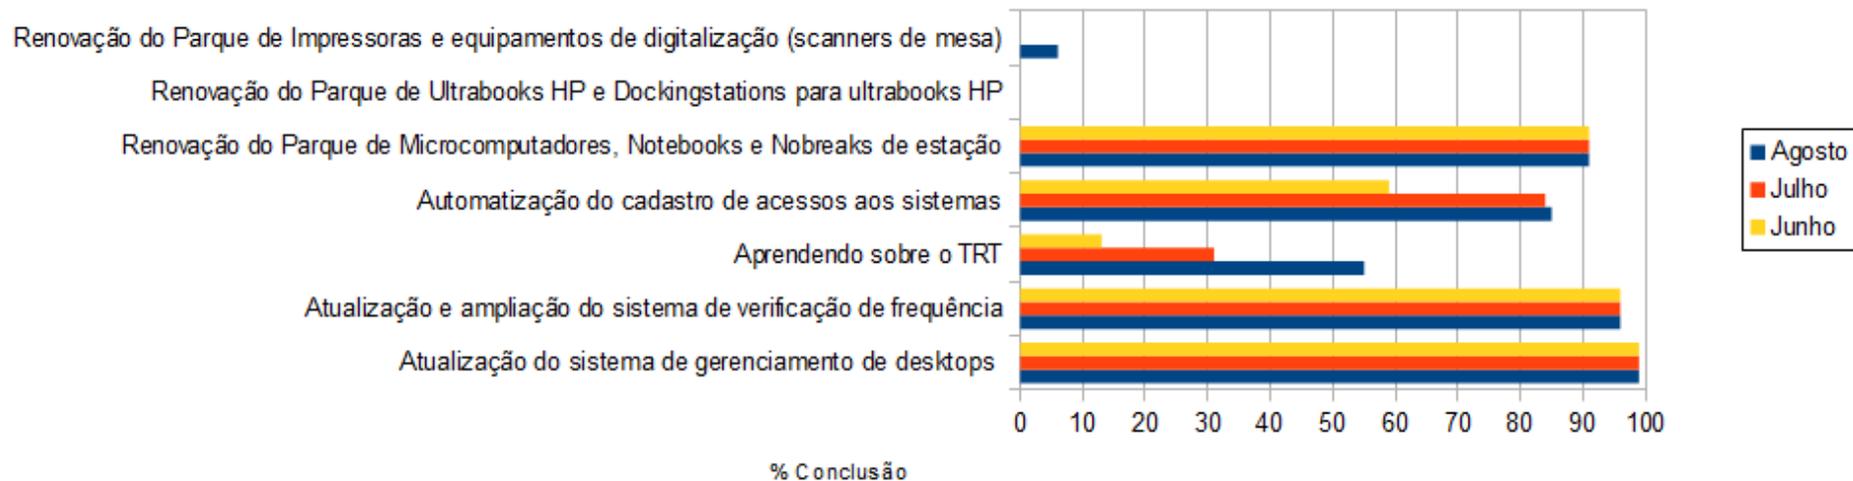

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
199	Atualização do sistema de gerenciamento de desktops	ANA LUCIA MOREIRA	Posição agosto/17: Aceite do produto (Assyst) em 20/01/2016. EP ajustar o Termo de Encerramento (metodologia anterior), para refletir o conteúdo do aceite do contrato.	Concluído	05/02/2014	18/05/2015	11/04/2014		99,53			1	0,99	0	0,83	117,98		20/01/2016
242	Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	ANA LUCIA MOREIRA	Posição agosto/17: dia 29/março/2017, assinado pela Presidente o termo de rescisão unilateral do contrato com a empresa Roless, em razão da inexecução total do objeto do contrato (PA da contratação 2884-44.2015, PA da inexecução 8343-90.2016). Fornecedor entrou com recurso dia 06/julho. Em paralelo, SEGESP já formalizou que não tem interesse em buscar outra solução e optou pelo fechamento do projeto. Essa posição está sendo apreciada pela Bárbara (DG) - solicitar que a Natacha valide como está.	Em Execução	10/04/2014	11/11/2016	10/04/2014		96,19	R\$ 222.650,00	R\$ 0,00	0,33	0,96	0	0,75	27,02	Estudar solução de relógio ponto com biometria com ou sem compra de software-Concluída; Licitação-Em andamento; Implantação-Em andamento	
425	Aprendendo sobre o TRT	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição agosto/17: 3 turmas já treinadas, falta 1 turma. Uma turma já realizou visita ao primeiro grau. Demais grupos de visitas e visitas ao segundo grau, em planejamento. Projeto deve ser encerrado em 2017.	Em Execução	04/05/2017	20/11/2017	15/05/2017		55,28			0,5	0,95	0	0,8	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Planejamento de Treinamentos e Visitas (MARCO)-Em andamento; Treinamentos (MARCO)-Em andamento; Visitas (MARCO)-Em andamento	31/10/2017
438	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição agosto/17: GP vai encaminhar mudança para registrar que os sistemas administrativos não estarão no escopo e registrar atraso no início da homologação, que tem nova previsão para iniciar em 12/julho para todos os sistemas, exceto o PJe. Provavelmente entrega do produto final será prorrogada para final de agosto. *** GP encaminhar mudança ***	Em Execução	24/03/2017	28/09/2017	03/04/2017		84,88			0,66	0,91	0	0,8	46,51	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definição da listagem de métodos necessária para a integração com cada sistema (MARCO)-Em andamento; Plano de implementação dos serviços para gestão do cadastro (MARCO)-Concluída; Desenvolvimento de serviços de automatização dos registros nas bases de dados (MARCO)-Em andamento; Desenvolvimento de uma interface de usuário única para a gestão de credenciais (MARCO)-Em andamento	14/07/2017
451	Renovação do Parque de Microcomputadores, Notebooks e Nobreaks de estação	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição agosto/17: Notebooks e microcomputadores já instalados. Encaminhada a licitação dos nobreaks. Desde julho está com pregoeiro para homologação (terceira empresa). Após assinatura do contrato, fazer registro de mudança no projeto.	Em Execução	18/07/2016	17/07/2017	20/07/2016		91,42	R\$ 6.060.308,00	R\$ 5.419.746,00	0,75	0,91	0,99	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Documentação técnica dos microcomputadores e notebooks para licitação-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de microcomputadores e notebooks (MARCO)-Concluída; Documentação técnica dos no-breaks para licitação (MARCO)-Concluída; Contrato assinado com o fornecedor de no-breaks (MARCO)-Designada; Recebimento de 1350 computadores desktop com configuração padrão (MARCO)-Concluída; Recebimento de 92 computadores desktop com maior capacidade (MARCO)-Concluída; Recebimento de 236 notebooks (MARCO)-Concluída; Recebimento de 972 no-breaks (MARCO)-Designada; Instalação dos 1350 computadores desktop e dos 58 notebooks da EJ (MARCO)-Concluída; Fornecimento dos 92 computadores desktop e dos 178 notebooks (MARCO)-Concluída	29/06/2017

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
459	Renovação do Parque de Ultrabooks HP e Dockingstations para ultrabooks HP	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição agosto/17: TRT4 será participe da licitação nacional (TRT2). Kickoff realizado dia 26/junho. Everton irá validar com Müller os prazos da licitação nacional, para ajustar cronograma e enviar para aprovação. Anexar documentos no Trace.	Em Planejamento	01/06/2017	26/10/2018			0	R\$ 1.362.000,00	R\$ 0,00						Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Elaborar documentação técnica dos notebooks e docking stations para licitação (MARCO)-Em planejamento; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos recebidos no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos patrimoniados (MARCO)-Em planejamento; Entrega dos equipamentos adquiridos aos usuários (MARCO)-Em planejamento; Preparação e entrega dos Ultrabooks HP 840 aos assistentes dos magistrados (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos HP Elitebook 8460 e suas respectivas docking stations indicados para desfazimento (MARCO)-Em planejamento	
460	Renovação do Parque de Impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição agosto/17: Kickoff realizado dia 26/junho. Plano aprovado e documentação anexada no Trace.	Em Execução	01/06/2017	05/06/2018	26/06/2017		6,21	R\$ 1.283.172,11	R\$ 0,00	0,33	0,24	0	1	-0,85	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Designada; Documentação técnica das impressoras para licitação elaborada (MARCO)-Designada; Documentação técnica dos escâneres para licitação elaborada (MARCO)-Designada; Contratos assinados com os fornecedores de impressoras (MARCO)-Designada; Contratos assinados com os fornecedores de escâneres (MARCO)-Designada; Impressoras recebidas no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Escâneres recebidos no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Instalação das impressoras (MARCO)-Em planejamento; Instalação dos escâneres (MARCO)-Em planejamento	


## DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

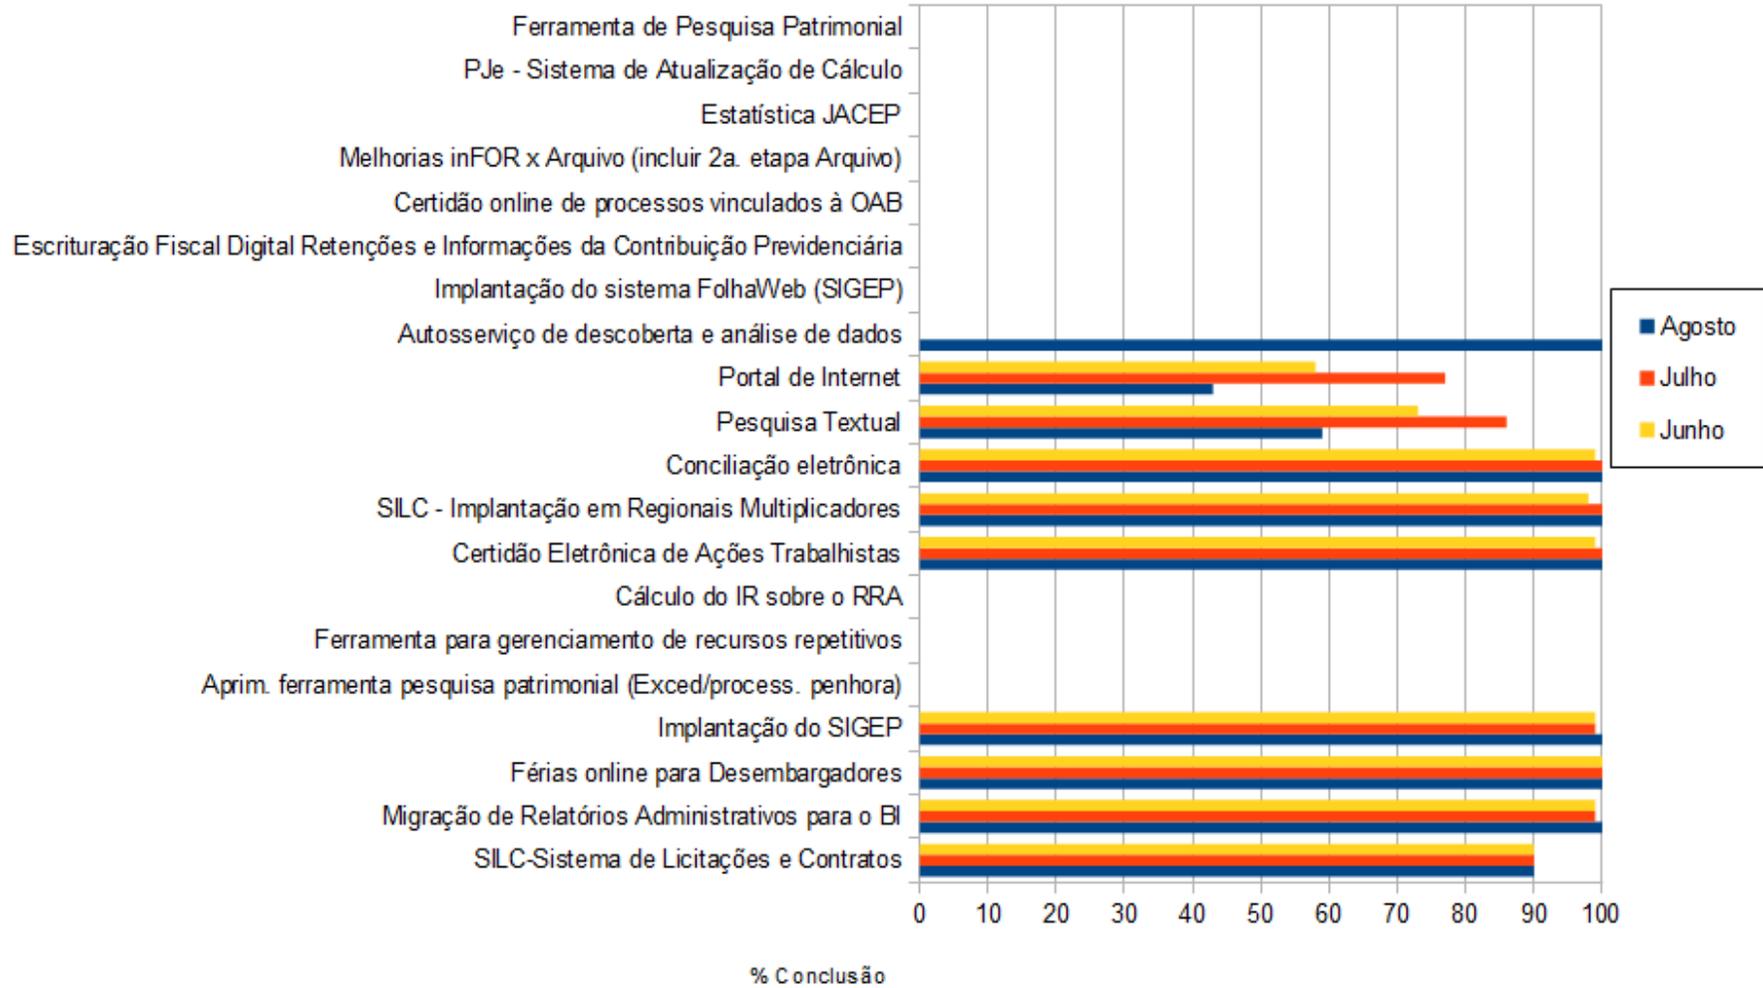

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
256	SILC-Sistema de Licitações e Contratos	MARCIO BYSTRONSKI	Posição agosto/17: GP realizou registro de mudança. Acordado entre Natacha, DG e CLC, a data de 01/09 para entrada em produção. Dia 18/08 haverá reunião para acompanhamento da homologação da retroalimentação. Dia 28/08 reunião para confirmar a entrada em produção.	Em Execução	07/03/2014	01/09/2017	05/06/2014		89,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,96	0,89	0	0,85	85,71	GERENCIAMENTO DE MUDANÇAS- Concluída; ENCERRAMENTO DO PROJETO-Em planejamento; Sprints 1 a 68: concluídas; Sprints 69 a 73: homologação e ajustes da retroalimentação; em andamento; Implantação: não iniciado.	01/09/2017
387	Migração de Relatórios Administrativos para o BI	TIAGO GOMES SANTOS	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 30/01/2017. Mapa benefícios anexado.	Concluído	25/02/2015	25/07/2017	25/02/2015	31/07/2017	100			1	1	0	1	61,42		30/01/2017
402	Férias online para Desembargadores	MARCIO BYSTRONSKI	Início utilização do sistema em produção dia 06/março/17. *** PROJETO CONCLUÍDO ***. Medir benefícios em Agosto/2017.	Concluído	23/03/2015	18/11/2015	23/03/2015	23/03/2017	100			1	1	0	0,83	0		06/03/2017
404	Implantação do SIGEP	MARCIO BYSTRONSKI	*** PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 30/09/2016. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	12/01/2015	30/09/2016	12/01/2015	25/07/2017	100			1	1	0	0,7	15,61		30/09/2016
428	Aprimoramento de ferramenta de pesquisa patrimonial (Excedentes e processamento de penhora)	LUCIA GONTARSKI SPERANZA	Posição agosto/2017: projeto sendo conduzido pela AGE, com escopo diferente da proposta inicial do projeto (criado projeto 474 para esse fim). Talvez o projeto 428 seja cancelado.	Em Planejamento	12/04/2016	22/04/2016			0									
430	Ferramenta para gerenciamento de recursos repetitivos	TIAGO GOMES SANTOS	Posição agosto/17: Projeto estratégico. Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016). Projeto deveria iniciar no segundo semestre/2017. Em definição se o projeto será iniciado e com qual escopo (dependência de vinda de recurso para a CDES - inteligência artificial).	Não Iniciado	12/04/2016	22/04/2016			0									
436	Cálculo do IR sobre o RRA	MARCIO BYSTRONSKI	Adiado para 2017 (ata reunião CI de 15/09/2016). DG deverá fornecer maiores informações antes do início. Posição agosto/17: Conforme conversa entre Farias e Eder em julho, esse projeto é menos prioritário do que o REINF (463).	Não Iniciado	13/04/2016	25/04/2016			0									
446	Certidão Eletrônica de Ações Trabalhistas	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	*** Projeto Concluído***. Medir Benefícios em 30/agosto.	Concluído	03/05/2016	08/03/2017	03/05/2016	04/07/2017	100			1	1	0	1	230,5		29/06/2017
447	SILC - Implantação em Regionais Multiplicadores	DEISE ALEXANDRA KOERBER ALBINO	Estudos Técnicos Preliminares aprovado pelo CSJT. A implantação nos demais regionais será projeto gerenciado pelo Conselho. *** Projeto CONCLUÍDO NO TRACE ***. Mapa de Benefícios enviado.	Concluído	12/09/2016	10/01/2017	12/09/2016	26/06/2017	100			1	1	0	1	-2,94		22/02/2017
448	Conciliação Eletrônica	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA	Produto final entregue em 09/05/2017. *** CONCLUÍDO NO TRACE***. Medir benefícios em 30/11/2017.	Concluído	12/12/2016	29/03/2017	12/12/2016	26/06/2017	100			1	1	0	1	23,06		09/05/2017
457	Pesquisa Textual	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição agosto/2017: migrações sendo feitas mas ainda não em produção. Suporte da ferramenta atual (GSA) terminou em abril/2017. GP elaborando mudança: pesquisa de acórdão ampla conclusão em 20/09 e demais aplicações em 30/11.	Em Execução	20/03/2017	14/12/2017	20/03/2017		58,75			1	0,92	0	0,83	1,12	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Estudo preliminar-Concluída; Pesquisa de Acórdãos Ampla-Em andamento; Sprint 10-Em planejamento; Sprint 11-Em planejamento; Entrega 1a. etapa - Pesquisa de acordos ampla-Em planejamento; Sprint 12-Em planejamento; Sprint 13-Em planejamento; Sprint 14-Em planejamento; Sprint 15-Em planejamento; Implantação-Em planejamento	30/11/2017

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
458	Portal de Internet	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição agosto/2017: primeira entrega será feita em 21/08, com os principais serviços migrados. Segunda entrega, com o restante, será feita em 30/11. GP elaborando mudança com essas datas.	Em Execução	20/03/2017	07/12/2017	20/03/2017		42,89			0,7	0,72	0	0,83	60,55	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definir escopo do produto-Concluída; Programação Portal - parte 1-Em andamento; Sprint 1 - Migração portlet Consulta Processual-Concluída; Sprint 2 - Migração das páginas   Portlet Agenda e notícias-Concluída; Sprint 3 - Migração Páginas   Portlet Atos Normativos-Concluída; Sprint 4 - Migração das páginas e menus-Concluída; Sprint 5 - Publicador de notícias-Concluída; Sprint 6 - Consulta processual-Em andamento; Sprint 7-Designada; Sprint 8-Em planejamento; Sprint 9-Em planejamento; Sprint 10-Em planejamento; Sprint 11-Em planejamento; Sprint 12-Em planejamento; Sprint 13-Em planejamento; Sprint 14-Em planejamento; Sprint 15-Em planejamento; Sprint 16-Em planejamento; Implantação-Em planejamento	30/11/2017
461	Autosserviço de descoberta e análise de dados	TIAGO GOMES SANTOS	*** PROJETO CONCLUÍDO***. Produto final entregue em 29/06/2017. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	15/12/2016	14/07/2017	15/12/2016	14/07/2017	100	R\$ 122.519,00	R\$ 122.519,00	1	1	1	0,62	3,2		29/06/2017
462	Implantação do sistema FolhaWeb (SIGEP)	MARCIO BYSTRONSKI	Motivo cancelamento: projeto sendo conduzido e gerenciado pela AGE. Internamente na SETIC, solicitações serão tratadas como demandas. Com isso, o Comitê Gestor de TIC sugeriu para a Comissão de Informática o cancelamento do projeto.	Cancelado	10/04/2017	04/05/2017			0									
463	Escrituração Fiscal Digital das Retenções e Informações da Contribuição Previdenciária Substituída (EFD-REINF)	MARCIO BYSTRONSKI	Posição agosto/17: Éder iria confirmar até final de junho se essa funcionalidade vai ser contemplada pelo SIGEO (Márcio vai validar com ele). Caso não seja, precisaremos priorizar esse projeto.	Não Iniciado	10/04/2017	28/04/2017			0									
464	Certidão online de processos vinculados à OAB	JOICE PAVEK FIGUEIRO	Posição agosto/17: verificar se pode ser atendido na CEAT. Em caso positivo, cancelar como projeto e atender como ação.	Não Iniciado	10/04/2017	28/04/2017			0									
465	Melhorias inFOR x Arquivo (incluir 2a. etapa Arquivo)	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	Posição agosto/17: Farias precisa avaliar a lista com as solicitações (Natacha) e o chamado no Assyst, para avaliar o que precisa ser feito.	Não Iniciado	10/04/2017	04/05/2017			0									
466	Estatística JACEP	TIAGO GOMES SANTOS	Posição agosto/17: ata de 19/05/2017 deliberou o início do projeto como "Integração eJus2/Secretarias de turma ao PJe". Farias vai validar com Jacep se já não foi atendido como Ação, que foi entregue em 29/06 para Rodrigo Citrin.	Não Iniciado	10/04/2017	04/05/2017			0									
467	PJe - Sistema de Atualização de Cálculo	FABIO DE OLIVEIRA GARCIA		Não Iniciado	10/04/2017	05/05/2017			0									
474	Ferramenta de Pesquisa Patrimonial	LUIZ FERNANDO ESTIVALET	Posição agosto/17: marcada reunião dia 14/ago para discussão do TAP com usuários. Anexar versão final do TAP como proposta de projeto. Previsão de conclusão para 30/nov.	Em Planejamento	09/08/2017	07/12/2017			0								Entrega do Quadro 1-Em planejamento; Entrega do quadro 2-Em planejamento; Entrega do quadro 3-Em planejamento; Treinar-Em planejamento; Liberar sistema em produção-Em planejamento	30/11/2017


### GESTÃO DE TIC e IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS Andamento dos projetos - últimos 3 meses

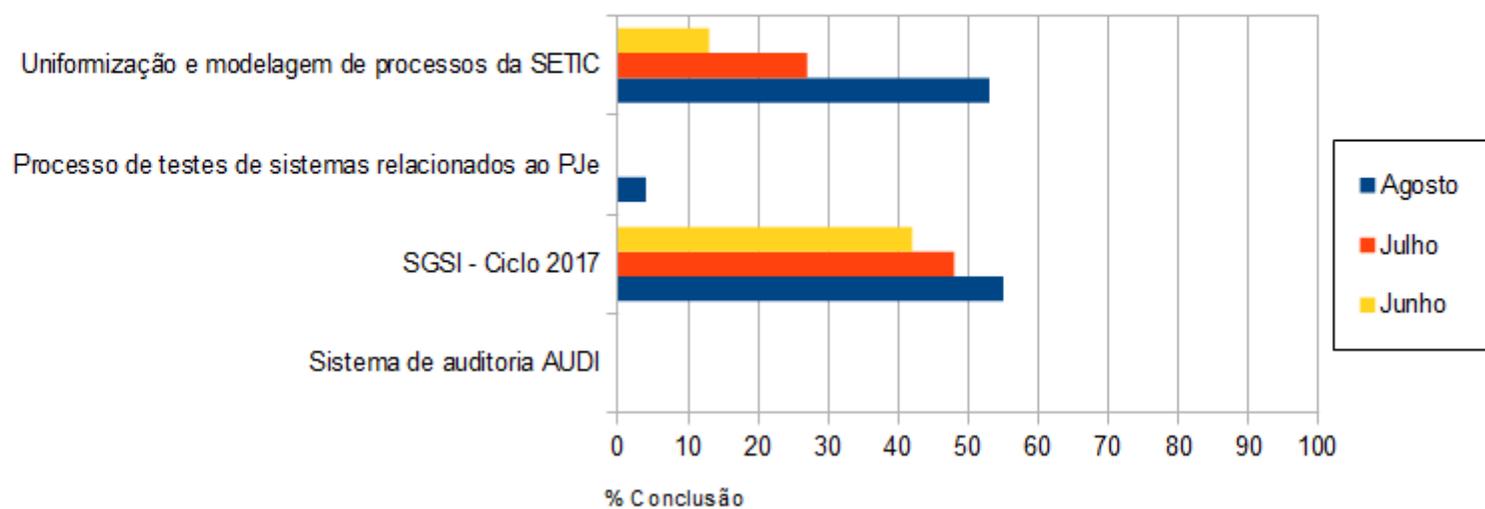

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final	
433	Sistema de auditoria AUDI	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	Motivo cancelamento: em 22/06/2017, projeto cancelado diante da informação recebida da SECONTI de que o CNJ irá disponibilizar o sistema AUDITAR que vai atender STJ, CSJT com a coordenação CNJ, no prazo de até 06 meses. Quando houver a demanda pela implantação do AUDITAR, a demanda será avaliada pela SETIC e será atendida por projeto ou ação, conforme a complexidade.	Cancelado	13/04/2016	01/08/2016			0										
452	SGSI - Ciclo 2017	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Posição agosto/17: plano de tratamento de riscos: encerrando, falta apresentar para CGTIC e Presidência. Declaração de aplicabilidade: aprovada. Relatório de análises de riscos: concluído. Repetição do teste PRD da Wan regional realizado dia 04/ago. Turma 3 EAD sem data definida. GP encaminhou mudança antecipando prazo de entrega final para 19/12/2017.	Em Execução	01/03/2017	29/01/2018	01/03/2017		54,64			1	0,95	0	1	-19,15	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Formalização do Escopo do SGSI-Concluída; Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos -Concluída; Análise e Avaliação de Riscos-Concluída; Declaração de Aplicabilidade-Concluída; Plano de Tratamento de Riscos-Em andamento; Testes do Plano de Continuidade de TIC-Concluída; Revisão do Plano de Continuidade de TIC-Designada; Treinamento e Conscientização em SI-Em andamento; Revisão da Política de Segurança da Informação-Designada; Indicadores SGSI-Em andamento; Análise Crítica do SGSI-Designada	19/12/2017	
470	Automatização de testes do PJe	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	Posição agosto/17: reunião de kick-off realizada dia 16/junho. Natacha definiu data de 30/11 para conclusão. Plano aprovado, anexar ata reunião kickoff no Trace. Em automatização dos testes (protocolar processo).	Em Execução	13/06/2017	16/11/2017	16/06/2017		4,03			1	0,21	0	0,75	-0,93	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Treinamentos relativos a testes de softwares pelos servidores da CIS-Designada; Automatização dos casos de testes de prioridade alta-Em andamento; Atualização e regulamentação do processo de testes do PJe-Designada; Orientação das áreas de negócios sobre a operação das automatizações desenvolvidas-Designada	30/11/2017	
471	Uniformização e modelagem de processos da SETIC	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	Posição agosto/17: processo de níveis de serviço e plano anual de capacitação concluídos. Processo de modelagem de processos e regulamentação em elaboração.	Em Execução	22/05/2017	31/01/2018	22/05/2017		52,61			1	1,06	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Modelagem processo de monitoramento e de aferição dos níveis de serviços (SLA's) (CAU/CGTIC)-Concluída; Modelagem processo de construção do plano anual de capacitação (CGTIC)-Concluída; Modelagem processo de modelagem de processos (CGTIC/SETIC)-Em andamento; Modelagem processo de gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC (CIT/CGTIC)-Em planejamento; Regulamentação (CGTIC/SETIC)-Em andamento	30/11/2017	

## INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

### Andamento dos projetos - últimos 3 meses

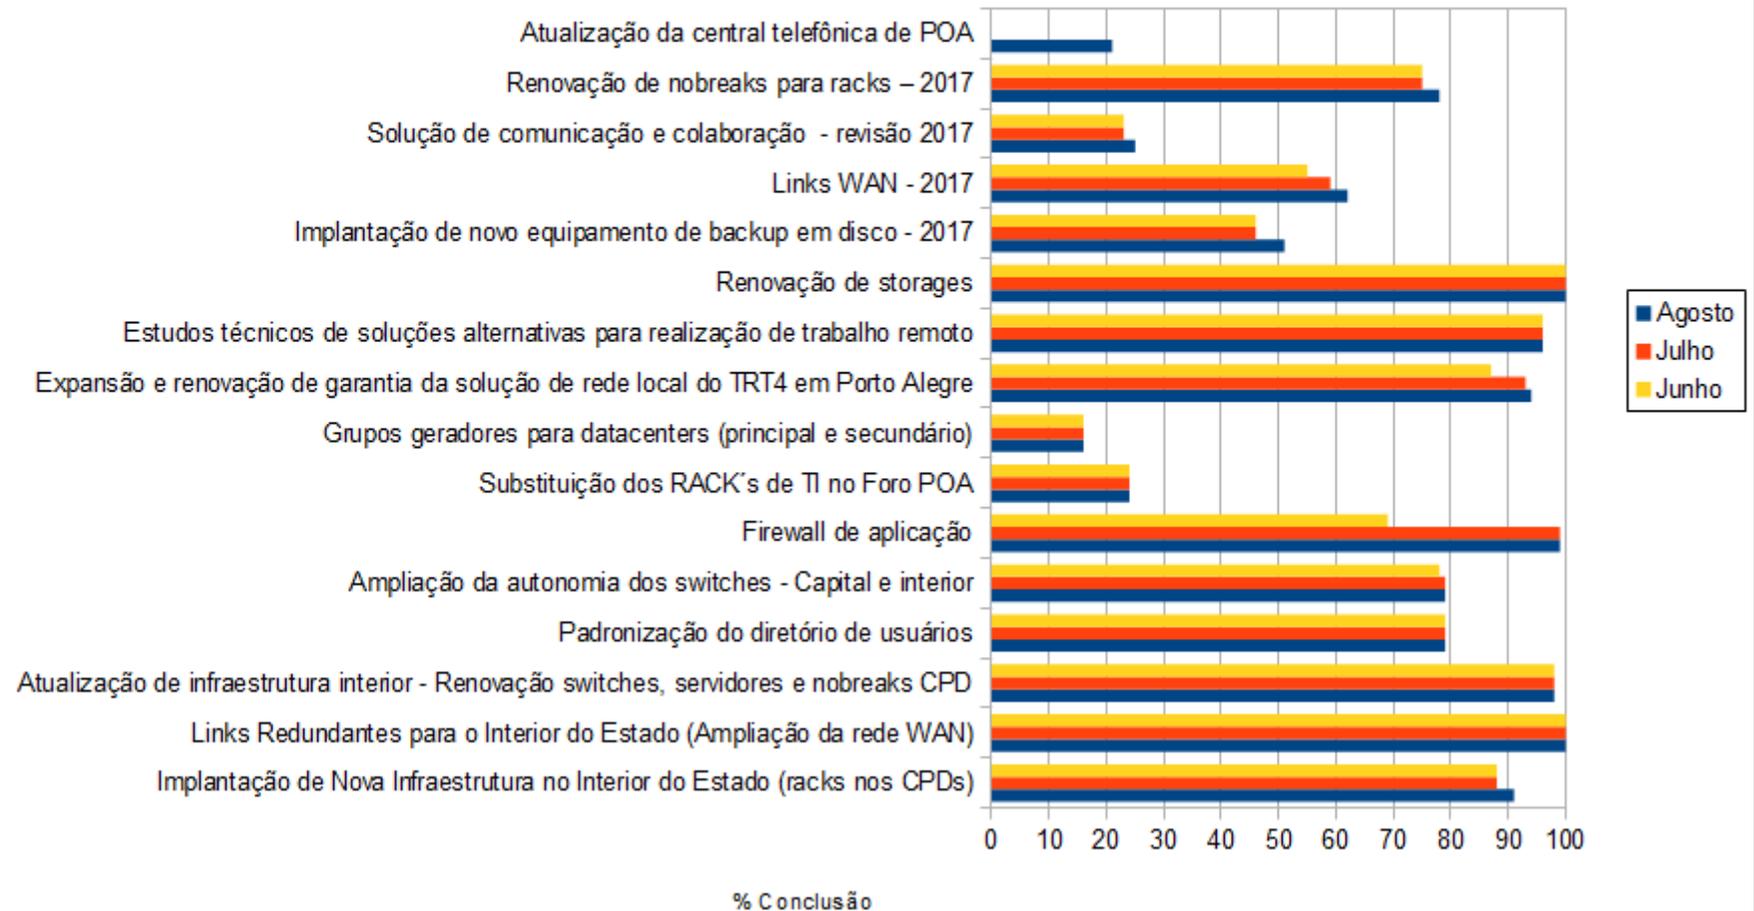

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição agosto/17: Arroio Grande: nova sede prevista para 2018. Rede ficará como está. Camaquã: setembro/2017. Cruz Alta: 2018. Ijuí: concluído. Lagoa Vermelha (excluído do projeto). Três Passos: 2018. Canoas: dezembro/2017. Viamão: nova sede prevista para dezembro/2017 e sala atual não comporta novo rack (rack3). Santiago: concluído. Gramado: Sempro e SETIC avaliaram que não é necessário pois a sala não comporta novo rack (seria necessária a realização de obra) e o CPD não apresenta problemas. Montenegro: concluído. GP encaminhando registro de mudança.	Em Execução	09/01/2012	04/06/2018	19/04/2012		91,01	R\$ 453.000,00	R\$ 453.000,00	1	0,99	1	0,8	200,99	Localidades 2012/1-Concluída; Localidades 2012/2-Concluída; Localidades 2013/1-Concluída; Localidades 2013/2-Concluída; Localidades 2014/01-Concluída; Localidades 2014/02-Concluída; Localidades 2015/01-Em andamento; Compra de 5 racks-Concluída; gerencia do projeto-Em andamento	15/12/2017
105	Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)	ADRIANO SIMIONI	PROJETO CONCLUÍDO. Anexar Mapa de Benefícios. Informações solicitadas para Adriano e Gustavo, dia 29/05 e para Paulo em 11/07.	Concluído	07/05/2010	14/11/2016	17/01/2014	11/05/2017	100	R\$ 1.326.840,00	R\$ 1.326.840,00	1	1	0,11	0,77	136,51		30/11/2016
202	Atualização de infraestrutura do interior - Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KERN	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição agosto/2017: Canoas: dezembro/2017 (em execução). Em conversa com o Luis da Sempro este informou que eles farão a reforma em Canoas em 1 VT de cada vez, instalando rack de parede, puxando a rede eletrológica, e incluindo o switch que forneceremos. As mudanças iniciaram e já realizada nas 1ª, 2ª e 4ª VT a migração do rack. GP fazer registro de mudança.	Em Execução	07/02/2014	11/01/2018	07/02/2014		98,26	R\$ 1.479.568,40	R\$ 1.479.559,40	1	1	0,99	0,8	4,94	Foros atendidos até 08/2014-Concluída; Canoas-Em andamento; Caxias do Sul-Concluída; Erechim-Concluída; Esteio-Concluída; Santa Rosa-Concluída; Santa Rosa II-Concluída; São Jerônimo-Concluída; São Leopoldo I-Concluída; Sapucaia do Sul-Concluída; Gerência de Projetos-Em andamento	28/02/2017
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUSIN	Posição agosto/2017: CIT fazer levantamento e avaliar custo benefício em adquirimos novos servidores para cada localidade. Testes em Capão da Canoa apresentaram obstáculos e estão sendo avaliados, para tomada de decisão sobre continuidade. Em caso positivo, realizar gestão de mudança.	Em Execução	28/08/2014	19/12/2017	28/08/2014		78,72			1	0,86	0	0,5	125,94	Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Em andamento; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência do Projeto-Em planejamento	
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KERN	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição agosto/2017: Prédio Sede: concluído. Prédio Adm: concluído. Prédio Foro 1: concluído SEMPRO. SETIC precisa realizar a migração. Prédio Foro 2: passou para agosto/2017. Está sendo avaliada a possibilidade de existirem outros equipamentos ligados na rede. Prédio Foro 3: passou para agosto/2017. Passo Fundo: curto circuito resolvido pela SEMPRO - SETIC validar. Concluído SEMPRO e SETIC verificar: Esteio e São Leopoldo até 18/08, Caxias do Sul, Erechin e Passo Fundo até 07/09 e Uruguiana está ok. GP registrar mudança.	Em Execução	25/08/2014	13/01/2017	10/11/2014		79,17	R\$ 77.900,00	R\$ 77.900,00	0,6	0,79	1	0,75	49,05	Análise de viabilidade do projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Prédios Interior (cabearmento elétrico)-Concluída; Prédios Capital-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	19/12/2016
211	Firewall de aplicação	ADRIANO SIMIONI	Motivo do cancelamento: A ferramenta adquirida não passou nos testes com o PJE. Somente com a reestruturação da arquitetura do PJE (em andamento, mas sem previsão de entrega) será viável utilizar ferramenta de firewall. É possível que as questões de segurança envolvidas sejam atendidas por licitação que será realizada pelo TRT12 e a adesão, se for o caso, será feita oportunamente.	Cancelado	09/02/2015	21/10/2016	04/03/2015		99,99	R\$ 248.437,00	R\$ 248.437,00							
389	Substituição dos RACK's de TI no Foro POA	ADRIANO SIMIONI	Motivo do cancelamento (ago/2017): SETIC tem a necessidade porém depende de obra e organização da SEMPRO. Comissão de informática encaminhará demandas para a DG.	Cancelado	24/04/2015	15/02/2016	24/04/2015		24,48	R\$ 60.000,00	R\$ 0,00							
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição agosto/17: pregão realizado dia 17/07. SETIC em análise da documentação da empresa vencedora. Itens a verificar com o pregoeiro. Após assinatura do contrato, GP registrar mudança.	Em Execução	01/06/2015	24/11/2016	01/06/2015		15,74	R\$ 797.085,61	R\$ 0,00	0	0,15	0	0,8	100,56	Análise de Viabilidade da Solução-Em andamento; Licitações-Em andamento; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	
392	Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4 em Porto Alegre	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição agosto/2017: projeto concluído. Em encerramento (em prazo para aprovação do Termo de Aceite).	Concluído	02/03/2015	28/02/2017	02/03/2015		94,01	R\$ 1.330.448,13	R\$ 1.324.798,93	0,75	0,94	0,99	0,85	197,43		16/06/2017
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição agosto/17: Retomar VDI. Natacha havia informado a data de 30/06/2017 como conclusão - replanejar nova data. Nova solução em testes.	Em Execução	02/03/2015	12/12/2016	14/08/2015		96,27	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	0,5	0,96	0	0,8	72,35	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento	
442	Renovação de solução de storage	ADRIANO SIMIONI	PROJETO CONCLUÍDO. Fazer Mapa de Benefícios (medir final de Junho).	Concluído	14/04/2016	17/03/2017	25/04/2016	15/05/2017	100	R\$ 5.000.000,00	R\$ 5.400.000,00	1	1	1,08	1	-16,78		17/03/2017

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
453	Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição agosto/2017: edital em elaboração na CLC Pregão previsto para final de agosto. Fazer registro de mudança no custo e escopo, pois a comissão aprovou mais 1 VTL (2 milhões). Anexar aprovação do plano no trace e ata kickoff.	Em Execução	13/03/2017	19/12/2017	19/05/2017		50,8	R\$ 900.000,00	R\$ 0,00	0,5	0,76	0	0,33	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em andamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	18/12/2017
454	Links WAN - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição agosto/17: pregão finalizado (Claro vencedora). Em análise da documentação. Verificar necessidade de prorrogação de prazo da OI e se há necessidade de aquisição de placa para o acelerador central. Necessário entrar em contato com a SEMPRO assim que encerrar a licitação, principalmente se o vencedor não for a OI (provável necessidades de adequações).	Em Execução	10/01/2017	30/11/2017	09/03/2017		62,08	R\$ 2.033.643,48	R\$ 0,00	0,66	0,83	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	30/11/2017
455	Solução de comunicação e colaboração - revisão 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição agosto/2017: simulação da microsoft (migração de contas), ainda não ocorreu. Licitação está pronta, no entanto, TRT8 fez licitação e a Google ganhou. Será submetido à Comissão de Informática a possibilidade de adesão. Edital TRT8 não atende a demanda de caixas especiais. GP anexar aprovação do plano do projeto.	Em Execução	13/03/2017	16/11/2017	06/06/2017		24,54	R\$ 414.612,00	R\$ 0,00	1	0,41	0	0,33	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Implantação-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	29/09/2017
456	Renovação de nobreaks para racks - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição agosto/17: Pregão homologado, compra de 18 unidades solicitada. Registro de preço realizado de 30 unidades, a DOD e o pedido continham 22 unidades e o projeto 20. GP realizar registro de mudança para a quantidade correta, custo e prazo.	Em Execução	07/07/2016	31/07/2017	30/09/2016		77,81	R\$ 176.000,00	R\$ 0,00	0,28	0,77	0	0,8	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Especificação Técnica-Concluída; Contratação-Em andamento; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	31/07/2017
473	Atualização da central telefônica de POA	ADRIANO SIMIONI	Posição agosto/2017: plano de projeto aprovado e docs anexados. Edital deve ser enviado para a CLC até o dia 18/08.	Em Execução	01/06/2017	11/01/2018	29/06/2017		20,9			0,25	0,61	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Documentação técnica para licitação elaborada-Em andamento; Contrato assinado com o fornecedor-Em planejamento; Monitoramento da entrega-Em planejamento; Central telefônica instalada-Em planejamento; Carga inicial da blacklist realizada-Em planejamento; Todos os terminais digitais substituídos por terminais IP-Em planejamento; Unidade de resposta audível implantada com 3 destinos configurados-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Treinamento da equipe de TIC-Em planejamento; Treinamento da equipe de operação de telefonia-Em planejamento; Destinação das partes originais não reaproveitadas-Em planejamento; Integração das centrais telefônicas do interior com o sistema de tarifação-Em planejamento	19/12/2017
