


RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO

PROJETOS DA SETIC PDTI 2016-2017

Data: Setembro/2017 v2.0

1) Resumo da situação dos projetos – por Coordenadoria

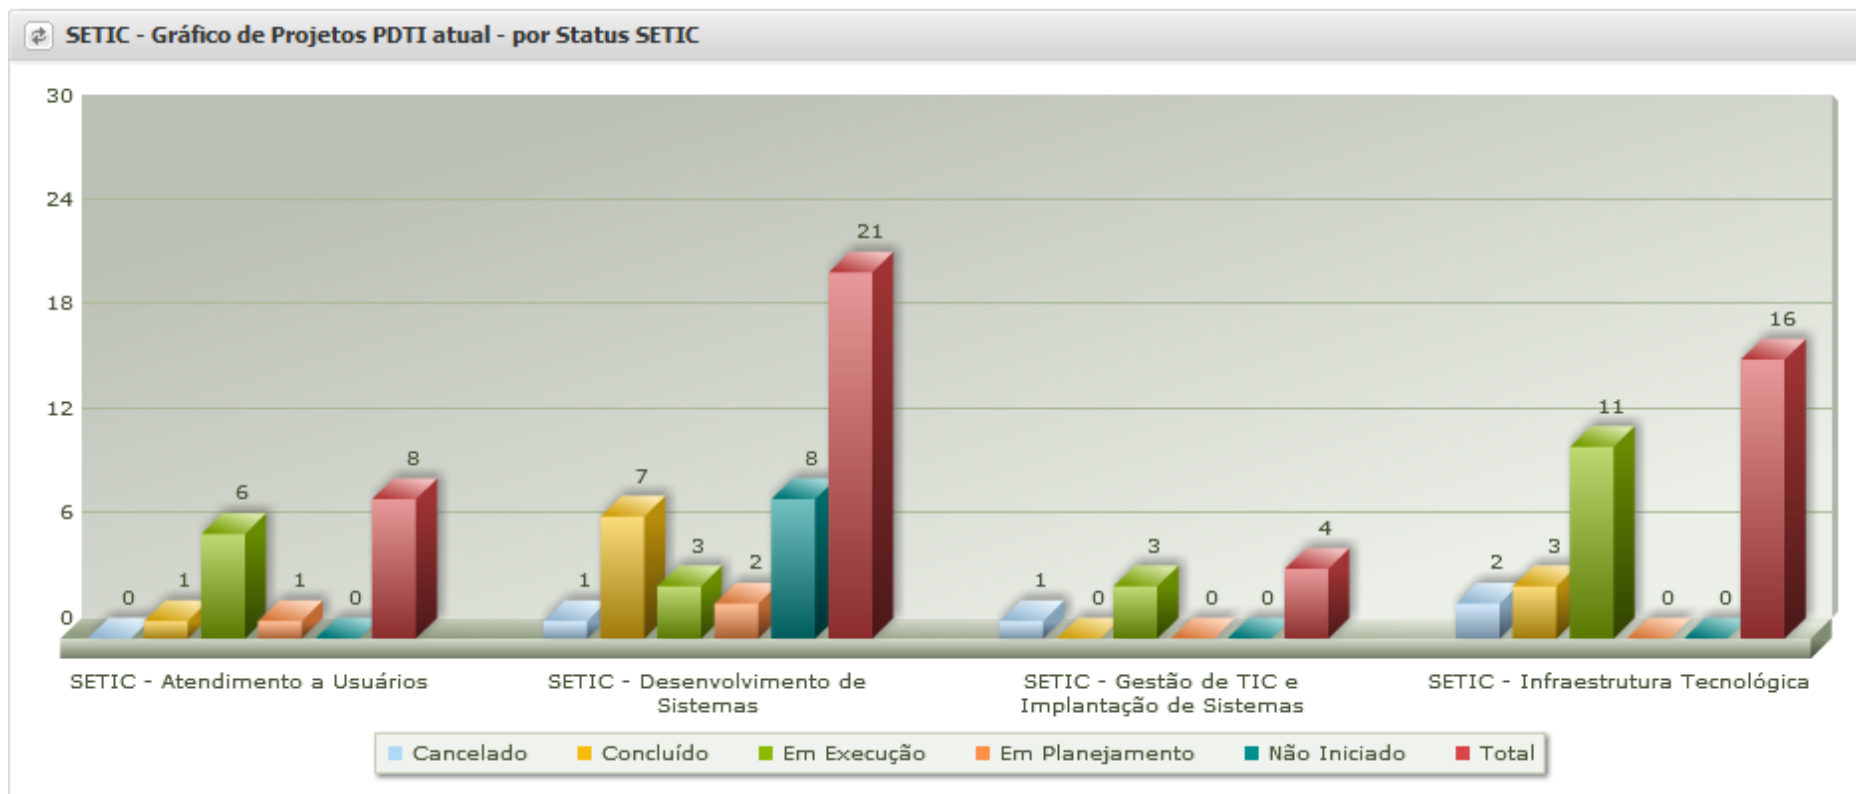

Descrição dos indicadores medidos e apresentados neste relatório


O detalhamento das faixas, cores e metas poderá ser obtido no documento complementar fornecido pelo Escritório de Projetos.

<p>IDE - Indicador de Desempenho de Escopo Avalia a variação das entregas previstas e as realizadas no momento da medição, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDE = \frac{\text{Quantidade de entregas realizadas no momento da medição}}{\text{Quantidade de entregas previstas no momento da medição}}$</p>	<p>IEP - Indicador de Execução do Projeto Mede o percentual acumulado de realização do Projeto em relação ao percentual acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IEP = \frac{\text{Percentual de execução realizado}}{\text{Percentual de execução previsto}}$</p>
<p>IDC - Indicador de Desempenho do Custo Mede o custo acumulado real do Projeto em relação ao custo acumulado previsto na Linha de Base até a data atual, conforme a fórmula abaixo.</p> <p>Fórmula $IDC = \frac{\text{Custo acumulado real}}{\text{Custo acumulado previsto}}$</p>	<p>IAM - Indicador de Aderência a Metodologia Mede o uso da metodologia de gerenciamento de projetos pela SETIC, a aplicação correta dos métodos, técnicas e ferramentas apresentados na MGP, por meio da quantidade de documentos obrigatórios apresentados.</p> <p>Fórmula $IAM = \frac{\text{Qtd. de itens obrigatórios apresentados}}{\text{Qtd. de itens obrigatórios previstos}}$</p>
<p>IPR - Indicador de Percentual de Replanejamento Mede o percentual de adiamento da entrega do projeto, considerando os replanejamentos ocorridos em relação à duração da primeira linha de base criada.</p> <p>Fórmula $IPR = ((\text{Duração Real do Projeto} / \text{Duração da Primeira Linha de Base}) - 1) * 100$</p>	

ATENDIMENTO A USUÁRIOS

Andamento dos projetos - últimos 3 meses

sub-title

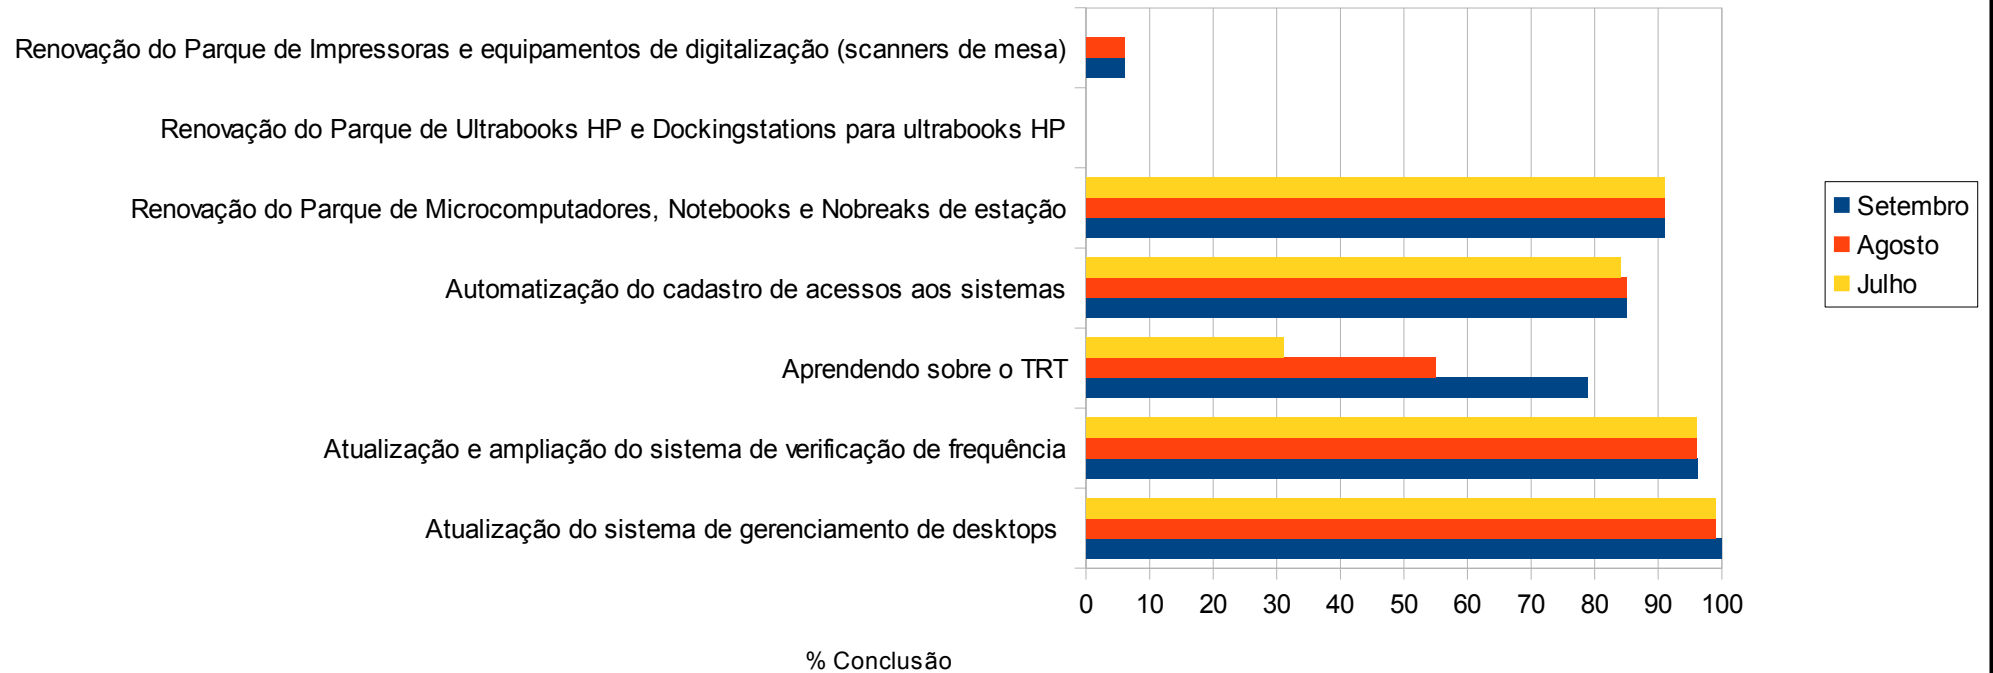


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
199	Atualização do sistema de gerenciamento de desktops	ANA LUCIA MOREIRA	Posição agosto/17: Aceite do produto (Assyst) em 20/01/2016. ***PROJETO CONCLUÍDO***. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	05/02/2014	18/05/2015	11/04/2014	10/10/2016	100			1	1	0	0,83	117,98		20/01/2016
242	Atualização e ampliação do sistema de verificação de frequência	ANA LUCIA MOREIRA	Posição setembro/17: dia 29/março/2017, assinado pela Presidente o termo de rescisão unilateral do contrato com a empresa Roless, em razão da inexecução total do objeto do contrato (PA da contratação 2884-44.2015. PA da inexecução 8343-90.2016). Fornecedor entrou com recurso dia 06/julho e em agosto foi julgado improcedente pela Administração do Tribunal. Em paralelo, SEGESP já formalizou que não tem interesse em buscar outra solução. Essa posição está sendo apreciada pela Bárbara (DG), PA encaminhado para a DG.	Em Execução	10/04/2014	11/11/2016	10/04/2014		96,19	R\$ 222.650,00	R\$ 0,00	0,33	0,96	0	0,85	27,02	Estudar solução de relógio ponto com biometria com ou sem compra de software-Concluída; Licitação-Em andamento; Implantação-Em andamento	
425	Aprendendo sobre o TRT	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição setembro/17: Todas as turmas realizadas. Em andamento as visitas às varas, segundo grau e sessões de julgamento. Incluído custo de instrutoria de R\$ 6.896,18. GP fazer registro de mudança para incluir o custo. Projeto deve ser encerrado conforme o plano.	Em Execução	04/05/2017	20/11/2017	15/05/2017		78,87			1	0,97	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Planejamento de Treinamentos e Visitas (MARCO)-Concluída; Treinamentos (MARCO)-Concluída; Visitas (MARCO)-Em andamento	31/10/2017
438	Automatização do cadastro de acessos aos sistemas	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição agosto/17: GP vai encaminhar mudança para registrar que os sistemas administrativos não estarão no escopo e registrar atraso no início da homologação, que tem nova previsão para iniciar em 12/julho para todos os sistemas, exceto o PJe. Provavelmente entrega do produto final será prorrogada para final de agosto. *** GP encaminhar mudança ***	Em Execução	24/03/2017	28/09/2017	03/04/2017		84,88			0,4	0,85	0	0,8	46,51	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Definição da listagem de métodos necessária para a integração com cada sistema (MARCO)-Em andamento; Plano de implementação dos serviços para gestão do cadastro (MARCO)-Concluída; Desenvolvimento de serviços de automatização dos registros nas bases de dados (MARCO)-Em andamento; Desenvolvimento de uma interface de usuário única para a gestão de credenciais (MARCO)-Em andamento	14/07/2017
451	Renovação do Parque de Microcomputadores, Notebooks e Nobreaks de estação	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição setembro/17: Notebooks e microcomputadores já instalados. Pregão dos nobreaks homologado. Informada a quantidade da compra (980 unidades) para confecção do contrato. Após assinatura do contrato, fazer registro de mudança no projeto.	Em Execução	18/07/2016	17/07/2017	20/07/2016		91,42	R\$ 6.060.308,00	R\$ 5.419.746,00	0,75	0,91	0,89	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Documentação técnica dos microcomputadores e notebooks para licitação-Concluída; Contratos assinados com os fornecedores de microcomputadores e notebooks (MARCO)-Concluída; Documentação técnica dos nobreaks para licitação (MARCO)-Concluída; Contrato assinado com o fornecedor de nobreaks (MARCO)-Designada; Recebimento de 1350 computadores desktop com configuração padrão (MARCO)-Concluída; Recebimento de 92 computadores desktop com maior capacidade (MARCO)-Concluída; Recebimento de 236 notebooks (MARCO)-Concluída; Recebimento de 972 nobreaks (MARCO)-Designada; Instalação dos 1350 computadores desktop e dos 58 notebooks da EJ (MARCO)-Concluída; Fornecimento dos 92 computadores desktop e dos 178 notebooks (MARCO)-Concluída	29/06/2017

459	Renovação do Parque de Ultrabooks HP e Dockingstations para ultrabooks HP	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição setembro/17: TRT4 será parceiro da licitação nacional (TRT2). Kickoff realizado dia 26/junho. Everton irá validar com Müller os prazos da licitação nacional, para ajustar cronograma e enviar para aprovação. Anexar documentos no Trace.	Em Planejamento	01/06/2017	26/10/2018		0	R\$ 1.362.000,00	R\$ 0,00	0	0	0	0	0	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; Elaborar documentação técnica dos notebooks e docking stations para licitação (MARCO)-Em planejamento; Contratos assinados com os fornecedores (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos recebidos no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos patrimoniais (MARCO)-Em planejamento; Entrega dos equipamentos adquiridos aos usuários (MARCO)-Em planejamento; Preparação e entrega dos Ultrabooks HP 340 aos assistentes dos magistrados (MARCO)-Em planejamento; Equipamentos HP Elitebook 8460 e suas respectivas docking stations indicados para desluzamento (MARCO)-Em planejamento
460	Renovação do Parque de Impressoras e equipamentos de digitalização (scanners de mesa)	EVERTON RAFAEL POLINA	Posição setembro/17: Kickoff realizado dia 26/junho. Licitação encaminhada para CLC em 08/09. Houve redução do nro de scanners. Fazer gestão de mudanças para constar os novos prazos, novo nro de scanners e alteração de escopo incluindo a contratação da entrega dos equipamentos.	Em Execução	01/06/2017	05/06/2018	26/06/2017	6,21	R\$ 1.283.172,11	R\$ 0,00	0,33	0,21	0	1	-0,85	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Designada; Documentação técnica das impressoras para licitação elaborada (MARCO)-Designada; Documentação técnica dos escâneres para licitação elaborada (MARCO)-Designada; Contratos assinados com os fornecedores de impressoras (MARCO)-Designada; Contratos assinados com os fornecedores de escâneres (MARCO)-Designada; Impressoras recebidas no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Escâneres recebidos no TRT4 (MARCO)-Em planejamento; Instalação das impressoras (MARCO)-Em planejamento; Instalação dos escâneres (MARCO)-Em planejamento	
476	Renovação do parque de monitores dos microcomputadores	EVERTON RAFAEL POLINA	setembro/2017: Licitação já encaminhada para CLC. aguardando aprovação da proposta pela Natacha. Pendente reunião de kick off.	Em Execução	08/09/2017	22/01/2018		0			0	0	0	0	0	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Em planejamento; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em planejamento; (Exemplo) Levantamento de Requisitos-Em planejamento; (Exemplo) Execução-Em planejamento; (Exemplo) Homologação-Em planejamento; (Exemplo) Transição para a Produção-Em planejamento

DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Andamento dos projetos - últimos 3 meses


sub-title

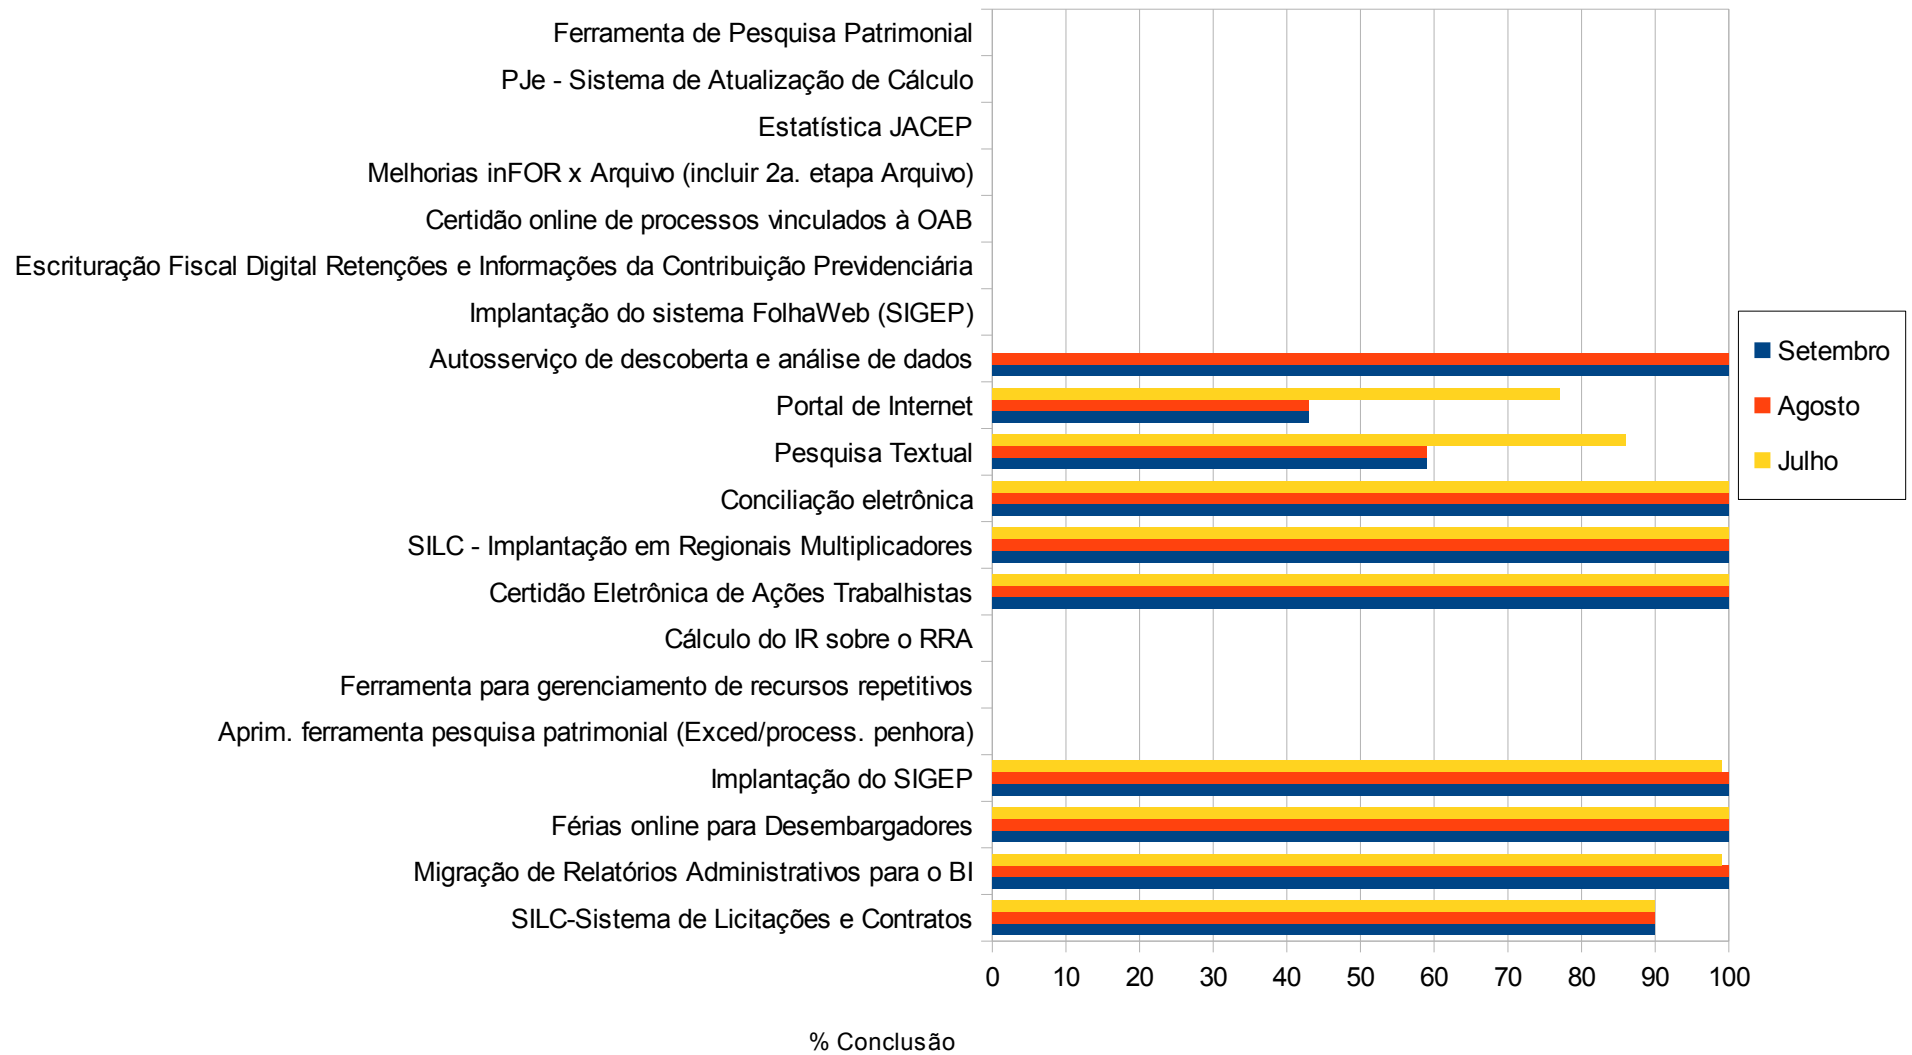

GESTÃO DE TIC e IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS

Andamento dos projetos - últimos 3 meses

sub-title

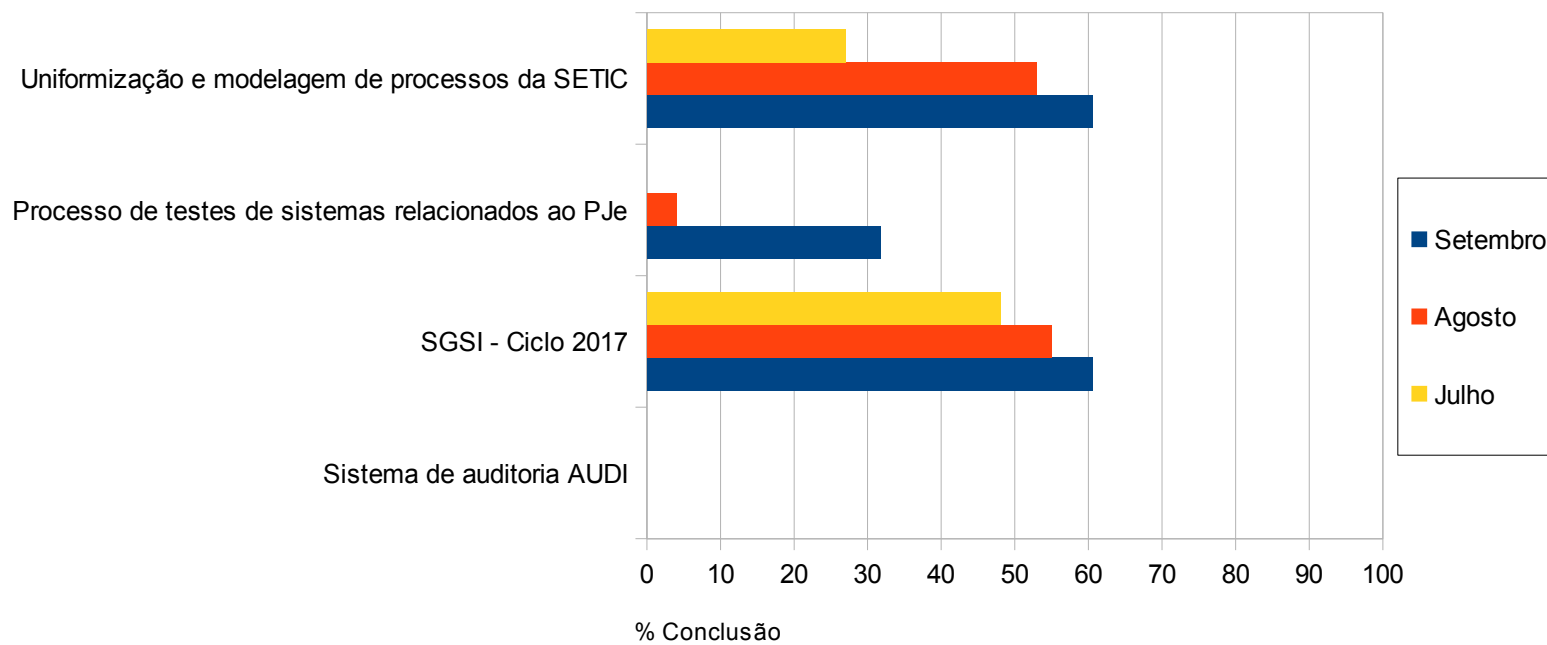


Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
433	Sistema de auditoria AUDI	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	Motivo cancelamento: em 22/06/2017, projeto cancelado diante da informação recebida da SECONTI de que o CNJ irá disponibilizar o sistema AUDITAR que vai atender STJ, CSJT com a coordenação CNJ, no prazo de até 06 meses. Quando houver a demanda pela implantação do AUDITAR, a demanda será avaliada pela SETIC e será atendida por projeto ou ação, conforme a complexidade.	Cancelado	13/04/2016	01/08/2016			0			0	0	0		0		
452	SGSI - Ciclo 2017	CLEONICE SANTOS CONDOTTA	Posição setembro/17: plano de tratamento de riscos: encerrado, validado pelo CGTIC; aguardando aprovação da administração do TRT. Declaração de aplicabilidade: aprovada. Relatório de análises de riscos: concluído. Repetição do teste PRD da Wan regional realizado dia 04/ago. Turma 3 EAD agendada para 05/09 a 03/10. Iniciada revisão dos POCs e PRDs.	Em Execução	01/03/2017	29/01/2018	01/03/2017		60,48			1	0,89	0	1	-19,15	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Formalização do Escopo do SGSI-Concluída; Revisão da Metodologia de Gestão de Riscos -Concluída; Análise e Avaliação de Riscos-Concluída; Declaração de Aplicabilidade-Concluída; Plano de Tratamento de Riscos-Em andamento; Testes do Plano de Continuidade de TIC-Concluída; Revisão do Plano de Continuidade de TIC-Em andamento; Treinamento e Conscientização em SI-Em andamento; Revisão da Política de Segurança da Informação-Em andamento; Indicadores SGSI-Em andamento; Análise Crítica do SGSI-Designada	19/12/2017
470	Automatização de testes do PJe	PABLO PAULO LOPES BARROS (COORDENADOR-CJ2)	Posição setembro/17: reunião de kick-off realizada dia 16/junho. Natacha definiu data de 30/11 para conclusão. 10 testes já automatizados. Em uso ferramentas livres (não será necessário aquisição). Em andamento também a documentação e regulamentação.	Em Execução	12/06/2017	16/11/2017	16/06/2017		31,75			1	0,67	0	1	-0,93	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Designada; Treinamentos relativos à testes de softwares pelos servidores da CIS-Designada; Automatização dos casos de testes de prioridade alta-Em andamento; Atualização e regulamentação do processo de testes do PJe-Em andamento; Orientação das áreas de negócios sobre a operação das automatizações desenvolvidas-Designada	30/11/2017
471	Uniformização e modelagem de processos da SETIC	RICARDO KRAUSE KURYLENKO	Posição setembro/17: processos de níveis de serviço e do plano anual de capacitação concluídos. Processo de modelagem de processos e regulamentação em simulação. Processo de gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TI: em andamento. Regulamentação em andamento.	Em Execução	22/05/2017	31/01/2018	22/05/2017		60,43			1	0,95	0	0,66	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Modelagem processo de monitoramento e de aferição dos níveis de serviços (SLA's) (CAJ/CGTIC)-Concluída; Modelagem processo de construção do plano anual de capacitação (CGTIC)-Concluída; Modelagem processo de modelagem de processos (CGTIC/SETIC)-Em andamento; Modelagem processo de gerenciamento da disponibilidade e capacidade de TIC (CIT/CGTIC)-Em andamento; Regulamentação (CGTIC/SETIC)-Em andamento	30/11/2017

INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA

Andamento dos projetos - últimos 3 meses

sub-title

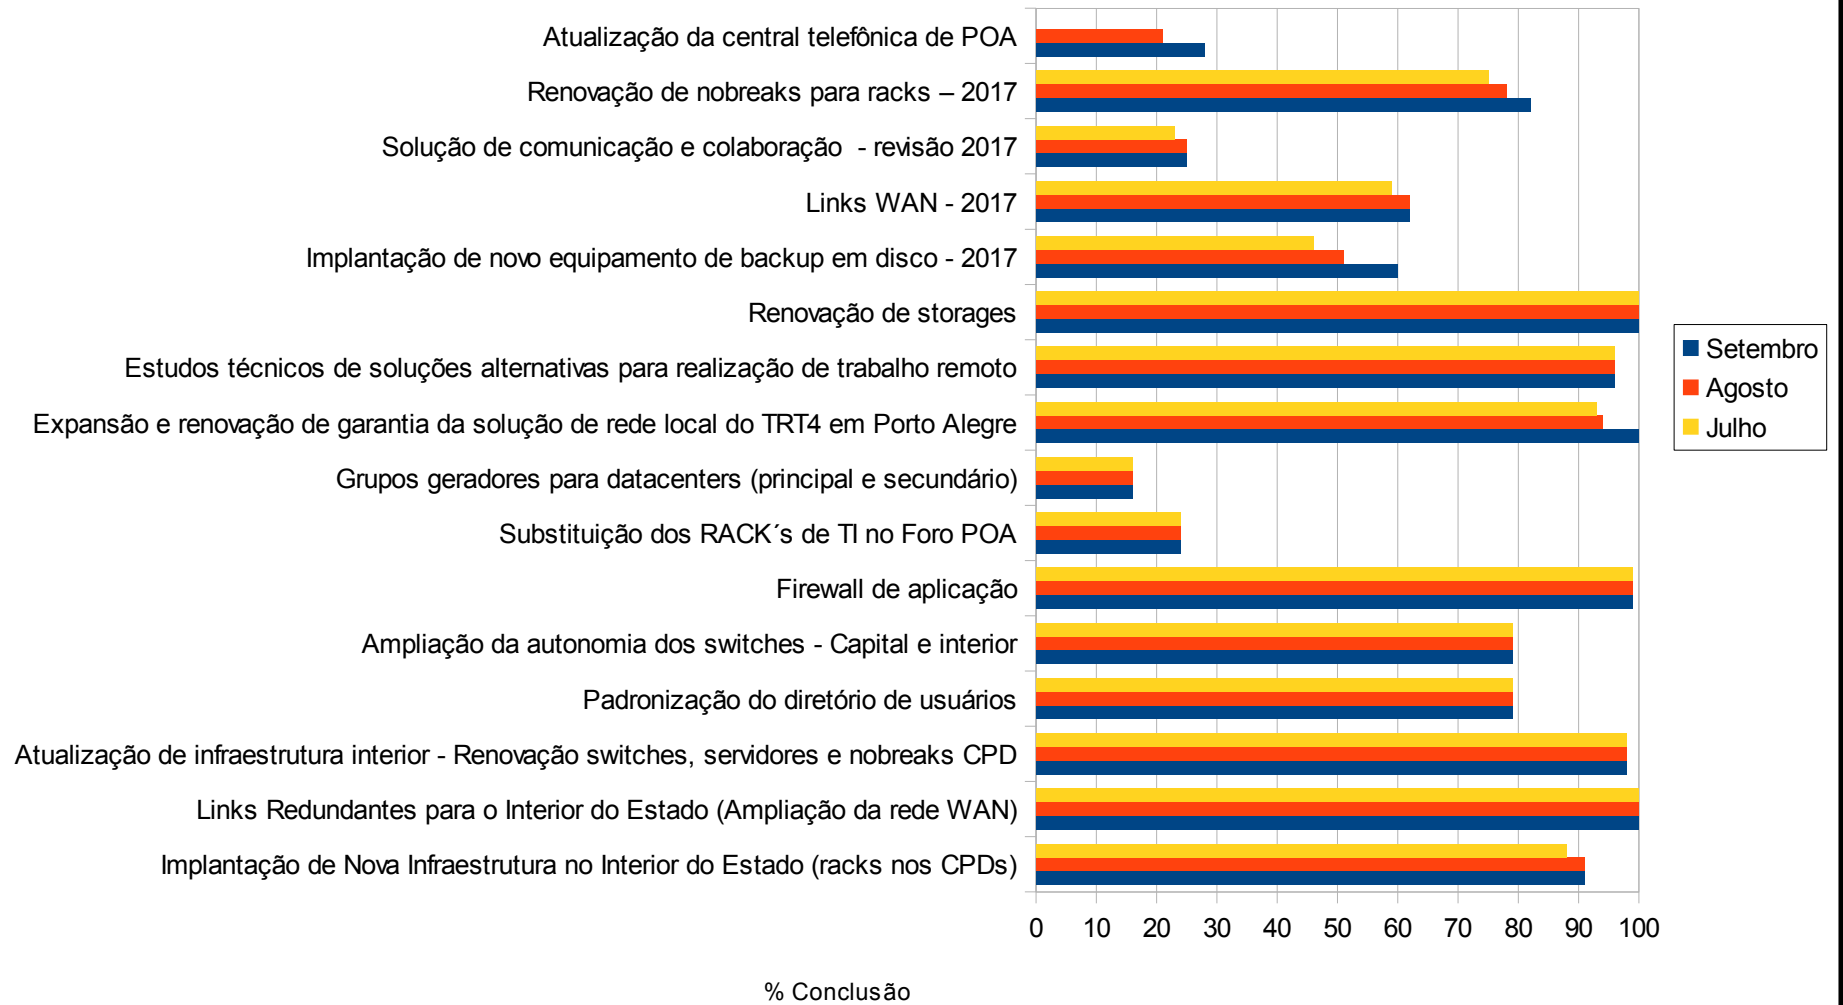

Id	Projeto	GP	Observação	Status	Início Previsto	Fim Previsto	Início Realizado	Fim Realizado	%C	Custo Estimado	Custo Realizado	IDE	IEP	IDC	IAM	IPR	Status Entregas	Entrega Produto Final
52	Implantação de Nova Infraestrutura no Interior do Estado (racks nos CPDs)	ADRIANO SIMIONI	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição setembro/17: Arroio Grande: nova sede prevista para 2018. Rede ficará como está. Camaquã: setembro/2017. Cruz Alta: 2018. Ijuí: concluído. Lagoa Vermelha (excluída do projeto). Três Passos: 2018. Canoas: dezembro/2017. Viamão: nova sede prevista para dezembro/2017 e sala atual não comporta novo rack (rack3). Santiago: concluído. Gramado: Sempro e SETIC avaliaram que não é necessário pois a sala não comporta novo rack (seria necessária a realização de obra) e o CPD não apresenta problemas. Montenegro: concluído. GP encaminhar registro de mudanças e anexar no trace.	Em Execução	09/01/2012	04/06/2018	19/04/2012		91,02	453000	453000	1	0,99	1	0,8	200,99	Localidades 2012/1-Concluída; Localidades 2012/2-Concluída; Localidades 2013/1-Concluída; Localidades 2013/2-Concluída; Localidades 2014/01-Concluída; Localidades 2014/02-Concluída; Localidades 2015/01-Em andamento; Compra de 5 racks-Concluída; gerencia do projeto-Em andamento	15/12/2017
105	Links Redundantes para o Interior do Estado (Ampliação da rede WAN)	ADRIANO SIMIONI	PROJETO CONCLUÍDO. Anexar Mapa de Benefícios. Informações solicitadas para Adriano e Gustavo, dia 29/05 e para Paulo em 11/07.	Concluído	07/05/2010	14/11/2016	17/01/2014	11/05/2017	100	1326840	1326840	1	1	0,11	0,77	136,51	Análise de Soluções-Concluída; Contratação-Concluída; Implementação do link redundante-Concluída; Homologação e Aceite-Concluída; Gerenciamento do Projeto-Concluída	30/11/2016
202	Atualização de infraestrutura do interior – Renovação dos switches, servidores e nobreaks de CPD	ERNANI SOARES KE	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição agosto/2017: Canoas: dezembro/2017 (em execução). Em conversa com o Luis da Sempro este informou que eles farão a reforma em Canoas em 1 VT de cada vez, instalando rack de parede, puxando a rede eletrológica, e incluindo o switch que forneceremos. As mudanças iniciaram e já realizada nas 1, 2 e 4 VT a migração do rack. GP fazer registro de mudança.	Em Execução	07/02/2014	11/01/2018	07/02/2014		98,26	1479568,4	1479559,4	1	1	0,99	1	4,94	Foros atendidos até 08/2014-Concluída; Canoas-Em andamento; Caxias do Sul-Concluída; Erechim-Concluída; Esteio-Concluída; Santa Rosa-Concluída; Santa Rosa II-Concluída; São Jerônimo-Concluída; São Leopoldo I-Concluída; Sapucaia do Sul-Concluída; Gerência de Projetos-Em andamento	28/02/2017
209	Padronização do diretório de usuários	VOLNEI CESAR SUS	Posição setembro/2017: CIT fazer levantamento e avaliar custo benefício em adquirirmos novos servidores para cada localidade. Testes em Capão da Canoa apresentaram obstáculos e estão sendo avaliados (conflito com assinador instalado nas máquinas), para tomada de decisão sobre continuidade. Em caso positivo, realizar gestão de mudança. SDINT trabalhando com a SM.	Em Execução	28/08/2014	19/12/2017	28/08/2014		78,72			0,75	0,84	0	0,5	125,94	Motivação e Recursos do Projeto-Concluída; Estudo de Possíveis Cenários e montagem de Laboratório-Concluída; Estratégia de Migração a ser adotada-Em andamento; Licitação-Concluída; Execução-Em andamento; Gerência do Projeto-Em planejamento	
210	Ampliação da autonomia dos switches - Capital e interior	ERNANI SOARES KE	Projeto com dependência da SEMPRO. Posição setembro/2017: Prédio Sede: concluído. Prédio Adm: concluído. Prédio Foro 1: concluído SEMPRO e SETIC. Prédio Foro 2: passou para agosto/2017. Está sendo avaliada a possibilidade de existirem outros equipamentos ligados na rede. Prédio Foro 3: passou para agosto/2017. Passo Fundo: ok situação do curto circuito. Concluído SEMPRO e SETIC verificar: Caxias do Sul - ok Esteio - ok Uruguaiânia ok, Erechim - feita a infraestrutura no nobreak errado. Será reaberto chamado para a SEMPRO. São Leopoldo - ok Novo Hamburgo - a verificar pela SETIC (switch dentro de armário) GP registrar mudança.	Em Execução	25/08/2014	13/01/2017	10/11/2014		79,17	77900	77900	0,6	0,79	1	0,75	49,05	Análise de viabilidade do projeto-Concluída; Licitação-Concluída; Prédios Interior (cabearamento elétrico)-Concluída; Prédios Capital-Em andamento; Gerencia de Projeto-Em andamento	19/12/2016
211	Firewall de aplicação	ADRIANO SIMIONI	Motivo do cancelamento: A ferramenta adquirida não passou nos testes com o PJE. Somente com a reestruturação da arquitetura do PJE (em andamento, mas sem previsão de entrega) será viável utilizar ferramenta de firewall. É possível que as questões de segurança envolvidas sejam atendidas por licitação que será realizada pelo TRT12 e a adesão, se for o caso, será feita oportunamente.	Cancelado	09/02/2015	21/10/2016	04/03/2015		99,99	248437	248437	0	0,99	1	0,6	48,71	Análise Técnica-Cancelada; Licitação-Cancelada; Execução-Cancelada; Gerencia de projeto-Cancelada	

389	Substituição dos RACK's de TI no Foro POA	ADRIANO SIMIONI	Motivo do cancelamento (ago/2017): SETIC tem a necessidade porém depende de obra e organização da SEMPRO. Comissão de informática encaminhará demandas para a DG.	Cancelado	24/04/2015	15/02/2016	24/04/2015		24,48	60000	0	0	0,24	0	0	0	Análise de Viabilidade de Projeto-Cancelada; Licitação-Cancelada; Execução do Projeto-Cancelada; Gerencia de Projeto-Cancelada	
391	Grupos geradores para datacenters (principal e secundário)	ADRIANO SIMIONI	Posição agosto/17; pregão realizado dia 17/07. Contrato enviado para a empresa em 08/09. Reunião com a empresa agendada para dia 21/09. GP replanejar projeto.	Em Execução	01/06/2015	24/11/2016	01/06/2015		15,74	797085,61	0	0	0,15	0	0,8	100,56	Análise de Viabilidade da Solução-Em andamento; Licitações-Em andamento; Execução-Em andamento; Gerência de Projeto-Em andamento	
392	Expansão e renovação de garantia da solução de rede local do TRT4 em Porto Alegre	ADRIANO SIMIONI	***PROJETO CONCLUÍDO***. Produto entregue em 16/06/2017. Mapa de benefícios anexado.	Concluído	02/03/2015	28/02/2017	02/03/2015	31/08/2017	100	1330448,13	1324798,93	1	1	0,99	1	197,43	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Licitações-Concluída; Execução-Concluída; Gerência de Projeto-Concluída	16/06/2017
394	Estudos técnicos de soluções alternativas para realização de trabalho remoto	ADRIANO SIMIONI	Posição setembro/17: Retomar VDI. Natacha havia informado a data de 30/06/2017 como conclusão - replanejar nova data. Nova solução em testes (desenvolvida internamente). Serão feitos testes com mais servidores em setembro e em outubro com Desembargadores, entrega da solução prevista para novembro/2017. GP replanejar.	Em Execução	02/03/2015	12/12/2016	14/08/2015		96,27	30000	0	0,5	0,96	0	0,8	72,35	Análise de Viabilidade da Solução-Concluída; Instalação do novo ambiente definido-Em andamento; Testes-Concluída; Gerência de Projeto-Em andamento	06/11/2017
442	Renovação de solução de storage	ADRIANO SIMIONI	PROJETO CONCLUÍDO. Fazer Mapa de Benefícios (medir final de Junho).	Concluído	14/04/2016	17/03/2017	25/04/2016	15/05/2017	100	5000000	5400000	1	1	1,08	1	-16,78	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Concluída; Contratação-Concluída; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Concluída; Homologação-Concluída; Transição para a Produção-Concluída; Treinamento-Concluída	17/03/2017
453	Implantação de novo equipamento de backup em disco - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição setembro/2017; Pregão agendado para 21/09. Fazer registro de mudança no custo e escopo, pois a comissão aprovou mais 1 VTL (2 milhões). Anexar ata kickoff.	Em Execução	13/03/2017	09/01/2018	19/05/2017		60,06	900000	0	1	0,97	0	0,66	1,06	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	18/12/2017
454	Links WAN - 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição agosto/17; pregão finalizado (Claro vencedora). Aguardando assinatura do contrato. Em elaboração do pedido de prorrogação de prazo do contrato da Oi. Verificar se há necessidade de aquisição de placa para o acelerador central. Necessário entrar em contato com a SEMPRO provável necessidades de adequações por troca da Oi pra Claro).	Em Execução	10/01/2017	30/11/2017	09/03/2017		62,08	2033643,48	0	0,66	0,74	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Execução-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	30/11/2017

455	Solução de comunicação e colaboração - revisão 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição setembro/2017: Será feita adesão ata do TRT8 (vencedor foi a Google).	Em Execução	13/03/2017	16/11/2017	06/06/2017		24,54	414612	0	0,66	0,32	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto-Concluída; Encerramento do projeto-Em planejamento; Contratação-Em andamento; Levantamento de Requisitos-Concluída; Implantação-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	29/09/2017
456	Renovação de nobreaks para racks – 2017	ADRIANO SIMIONI	Posição setembro/17: Pregão homologado, compra de 18 unidades solicitada. Registro de pregão realizado de 30 unidades, a DOD e o pedido continham 22 unidades e o projeto 20. Reunião inicial com a empresa dia 19/09. GP deve fazer Mudança para ajustar quantidade, custo e prazo.	Em Execução	07/07/2016	31/10/2017	30/09/2016		82,12	176000	0	0,75	0,91	0	0,8	25,2	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Especificação Técnica-Concluída; Contratação-Concluída; Execução-Em andamento; Homologação-Em planejamento; Transição para a Produção-Em planejamento	31/07/2017
473	Atualização da central telefônica de POA	ADRIANO SIMIONI	Posição setembro/2017: Edital enviado para a CLC em 08/09. GP fazer mudança no projeto para especificar melhor o escopo, deixando claro que não será adquirida nova central e sim, substituídas partes da central atual.	Em Execução	01/06/2017	11/01/2018	29/06/2017		28,36			0,5	0,62	0	1	0	Elaboração e aprovação do Plano de Projeto (MARCO)-Concluída; Encerramento do projeto (MARCO)-Em planejamento; Documentação técnica para licitação elaborada-Concluída; Contrato assinado com o fornecedor-Em planejamento; Monitoramento da entrega-Em planejamento; Central telefônica instalada-Em planejamento; Carga inicial da blacklist realizada-Em planejamento; Todos os terminais digitais substituídos por terminais IP-Em planejamento; Unidade de resposta audível implantada com 3 destinos configurados-Em planejamento; Homologação-Em planejamento; Treinamento da equipe de TIC-Em planejamento; Treinamento da equipe de operação de telefonia-Em planejamento; Destinação das partes originais não reaproveitadas-Em planejamento; Integração das centrais telefônicas do interior com o sistema de tarifação-Em planejamento	19/12/2017
