

Registros de Reunião
Comitê de Governança de TIC - 4ª Reunião 2019

No dia 23 de agosto de 2019, às 14h10min, teve início a reunião do Comitê de Governança de TIC do TRT da 4ª Região, na sala de convivência do Prédio Administrativo, sob a Presidência do Exmo. Des. Claudio Antonio Cassou Barbosa e com as presenças do Desembargador George Achutti eleito pelo Tribunal Pleno; do Juiz Evandro Luis Urnau (por videoconferência), eleito pelos juízes de 1º grau em atividade; e dos servidores Onélio Luis Soares dos Santos, Secretário-Geral Judiciário; Natacha Moraes de Oliveira, Diretora da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicações; Jeferson Andrade, Assessor Técnico-Operacional da Secretaria da Corregedoria; Pablo Barros, Coordenador de Implantação de Sistemas. Reunião contou ainda com cobertura pela ASCOM para divulgação das informações sobre a mudança de versão do Pje..

PAUTA

A reunião foi solicitada para comunicar ao Comitê de Governança de TIC as ações planejadas para a migração do PJe para versão 2.4.2, ações já realizadas para mitigar e reduzir os riscos envolvidos nesta migração. Atividades estão planejadas para serem realizadas a partir da 00:00 hora do dia 24 de agosto e em princípio previstas para serem concluídas até o final da noite de domingo, dia 25/08. Há o risco de o sistema não estar disponível na segunda-feira, dia 26/08.

1	Migração Pje 2.4.2 - Atividades de preparação
Relato: <ul style="list-style-type: none">- Construção das bases de homologação e treinamento;- Homologação da versão 2.4.0 rc, em conjunto com SEGJUD e ASSTECO, tendo sido cadastradas 57 issues de defeito em homologação;- Homologação da instalação e das funcionalidades dos módulos e sistemas satélites:<ul style="list-style-type: none">- Nova Central de Mandados- Pesquisa Textual- SAOPJe (alterado para Relatórios Gerenciais)- Nova Consulta Processual (consulta por login e senha)- JTe Assinatura QRCode- SIF 2- NUGEP- PJE-CALC- Treinamento para grupo de multiplicadores, ministrado pelos Juízes Auxiliares do CSJT<ul style="list-style-type: none">- quarenta e duas pessoas no primeiro grau- vinte pessoas no segundo grau- Treinamentos presenciais, que contaram com pelo menos um representante de cada Vara do Trabalho, Postos, CCDF, JAEP e CEJUSC.<ul style="list-style-type: none">- 9 turmas, com cerca de 180 pessoas treinadas.- Treinamentos por videoconferência para magistrados<ul style="list-style-type: none">- Foram agendados seis encontros, e seis magistrados participaram.- Liberação de base de treinamento, pela primeira vez, a todos os magistrados e servidores.- Encontro com o segundo grau, para instruções.<ul style="list-style-type: none">- Disponibilização de material instrucional na página Setic/Segjud.- Instruções para a equipe do Recurso de Revista	

- uma visita da Setic no local.
- Instruções para Coordenadoria de Recursos
 - duas visitas no local e uma reunião com Leopoldo, na Setic, que atuou como multiplicador.
- Treinamento da Assessoria de Recurso de Revista, pelos multiplicadores
 - servidores Leopoldo e Vania, e pela estagiária Mariana, da Coordenadoria de Recursos.
- Encaminhamento de material para peritos.
- Preparação cursos EAD:
 - Primeiro grau - servidores (539 inscritos)
 - Primeiro grau - magistrados
 - Segundo grau - material autoinstrucional

Deliberação: Relato aprovado.

2	Integrações - revisão para compatibilidade
----------	---


Relato: Os sistemas abaixo descritos estão integrados com o PJe e tiveram que ser adaptados para o funcionar com na versão 2.4.2. As integrações foram todas testadas no ambiente de homologação porém terão que ser testadas após a migração, também durante o final de semana:

1. Aeropauta
2. PJe - Infor - Lista dos Correios
3. AUD 3
4. SABB - Sistema de automação de bloqueios bancários
5. AutoCCLE
6. CEAT - certidão de ações trabalhistas
7. Conciliação Virtual
8. Pesquisa PJe (Consulta Nomes de Partes)
9. e-Sentença
10. NJ4 e-Jus - Enviar Apto para Pauta, Download da íntegra do processo, buscar dados de autuação de processos eletrônicos, Assinatura de Acórdãos;
11. RPHP
12. PJePortable + Shodô + PJeOffice
13. Shodô no Windows nas máquinas internas
14. PJeOffice no Windows nas máquinas internas
15. RobôPauta
16. RobôGIGS

Deliberação: Relato aprovado

Relato:

- É a maior versão desde a implantação do PJe.
- Apresentou problemas em todos os Tribunais, tendo maior impacto nos de grande porte.
- Suporte do CSJT precisou ser acionado em todas as implantações dessa versão, realizando ajustes específicos em cada Regional.
- No dia 24 de agosto atualizarão o PJe os TRTs da 2ª, 4ª, 15ª e 24ª, o que poderá trazer alguma concorrência no acesso ao suporte, caso necessário.

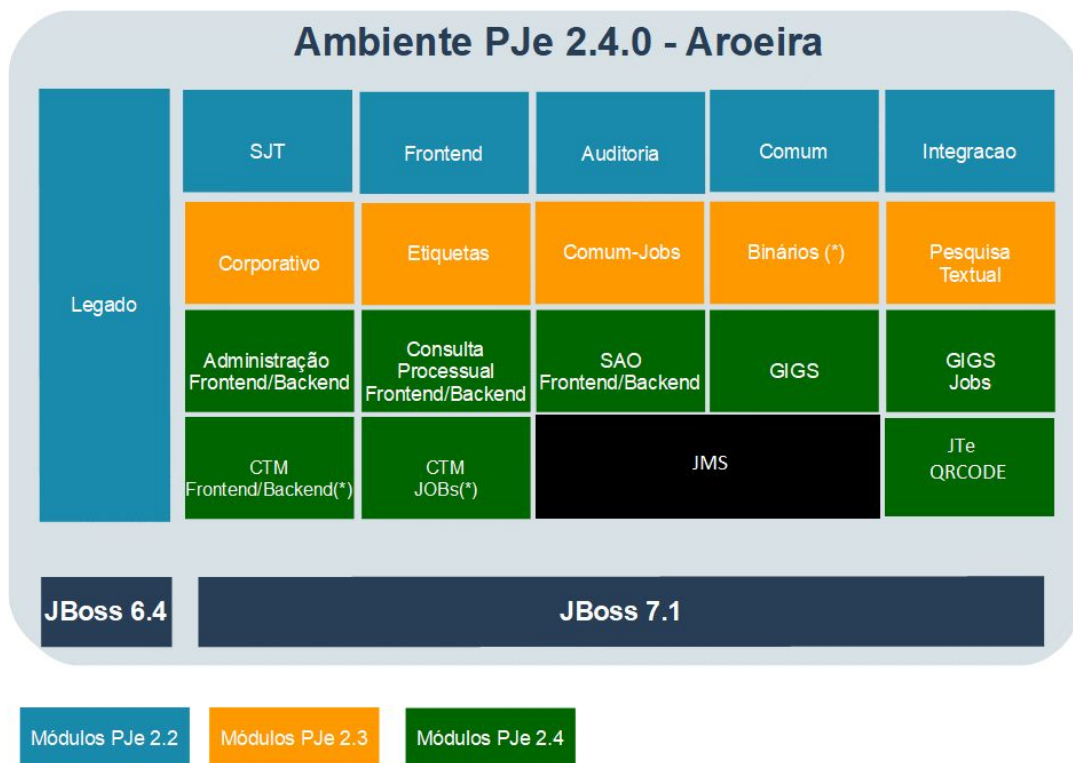

Deliberação: Aprovado por unanimidade.

Relato: Considerando o risco de habilitar imediatamente todos os serviços, e as informações sobre problemas obtidas junto aos Tribunais que já migraram, a Setic propõe o seguinte cronograma para migração dos módulos:

- Consulta processual unificada- 28/08/2019
- Pesquisa textual - 02/09/2019
- Central de Mandados - 09/09/2019

OFÍCIO CIRCULAR CSJT.CPJe.SETIC N° 44/2019

Brasília, 19 de agosto de 2019.

AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES COORDENADORES DO COMITÊ GESTOR REGIONAL DO SISTEMA PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO (PJe)

Assunto: Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) instalado na Justiça do Trabalho. Versão 2.4 - Habilitação da Consulta Pública Integrada.

Senhor(a) Coordenador(a),

Com os meus cumprimentos, informo que os Tribunais que já estão com a versão 2.4 do PJe instalada e aqueles que ainda vão implantá-la precisam habilitar a consulta pública integrada, caso contrário ela não funcionará.

Assim, encareço que adotem tal procedimento, seguindo o manual próprio, disponibilizado por meio do endereço https://pje.csjt.jus.br/documentacao/index.php/Consulta_Processual_2.4_-_Implanta%C3%A7%C3%A3o#Integra.C3.A7.C3.A3o_da_Consulta_Processual_com_Outros_C3.93rq.C3.A3os.

Na expectativa da costumeira atenção de Vossa Excelência, renovo os agradecimentos pelo apoio e colaboração desse Tribunal para a evolução conjunta do Sistema PJe.

Atenciosamente,

FABIANO DE ABREU PFEILSTICKER
Juiz Auxiliar da Presidência do TST e do CSJT
Coordenador do Comitê Gestor Nacional do PJe

Deliberação: Cronograma aprovado.

5	Módulo não funcional, dependendo da atuação da Caixa
<p>Relato: SIF - 2 Caixa atuando, mas possivelmente não estará operacional.</p> <p>Será necessário emitir as guias de depósito a partir do site do Tribunal.</p>	
<p>Deliberação: Risco aceito.</p>	

6	Fim das versões modificadas
<p>Relato: Natacha lembrou que a resolução 242/2019 proíbe que os Tribunais tenham versões alteradas do PJe.</p> <p>Art. 4º É vedado o desenvolvimento de funcionalidades, módulos ou satélites do PJe que não atendam aos dispositivos desta Resolução e que não tenham sido previamente aprovados pelas áreas responsáveis do Conselho Superior da Justiça do Trabalho.</p> <p>§ 1º Os Tribunais devem manter versão idêntica do código do Sistema PJe, distribuído pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no ambiente de produção.</p> <p>§ 2º O Conselho Superior da Justiça do Trabalho publicará em site específico o portfólio de projetos e a prioridade de cada iniciativa para a gestão.</p> <p>Art. 5º O Tribunal que desenvolver ou implantar, ainda que em ambiente de desenvolvimento, funcionalidade, módulo ou satélite do PJe em desconformidade com os termos desta Resolução deverá promover a imediata desinstalação, sob pena de suspensão de eventual repasse de valores para investimentos pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho até que a situação seja regularizada. Parágrafo único. Constatada a inconformidade, a Presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho poderá determinar a adoção de medidas complementares, incluindo a apuração das circunstâncias e responsabilidades, considerando os impactos decorrentes da sobreposição e/ou fragmentação de ações, bem como da duplicidade de investimentos e desperdício de recursos públicos.</p> <p>O QUE ISSO AFETA NO TRT4:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Interrupção de contagem de prazos em processos em decorrência da interrupção de prazos quando da entrada em vigor da Reforma Trabalhista; <ol style="list-style-type: none"> a. Os processos que ainda estavam com prazos pendentes foram revisados pela Segjud e Assteco, e corrigidos. ● [PJEJT-59339] Melhoria em combobox de seleção de partes no lançamento de movimentos em sessão de julgamento (V1) ● [PJEJT-59412] Otimizações de velocidade no Painel da Sessão de Julgamento (V1) <ol style="list-style-type: none"> a. Sem essas alterações, as Secretarias de Turmas e especializadas voltarão a enfrentar lentidão para lançar o resultado das sessões, e terão novamente a lista inteira de partes para selecionar a cada lançamento. 	

- filtro anti-robôs(V1)
 - a. Esse item é extremamente preocupante. O TRT4 tinha um serviço de identificação e bloqueio de robôs na consulta processual, implementado no código do PJe, razão pela qual era muito eficiente.
 - b. Para contornar a falta desse recurso, a equipe da Seção de Redes e Telecomunicações está desenvolvendo controles em infraestrutura, mas que ainda serão menos efetivos que os anteriores.


Deliberação: Aprovado pelo Comitê.

7 Mudança para infraestrutura baseada em containers


Relato: Natacha expôs ao Comitê que a infraestrutura que suporte o Pje deverá ser alterada para containers, por exigência e padronização do CSJT. É uma mudança bastante radical pois altera toda a camada de servidores e sistema operacional que suporta o Pje. Optou-se por não alterar esta infraestrutura junto com a implementação da versão 2.4.2 para que se possa inicialmente estabilizar a versão e isolar possíveis problemas relacionados a ela. Assim que estabilizada, será programada a mudança de infraestrutura em produção. Já estão sendo realizados laboratórios em outros ambientes pois a tecnologia é nova e está sendo absorvida pelos técnicos do TRT4. Haverá acompanhamento de técnico do TRT da 15ª Região pois este TRT já fez a implantação dos containers.

Dr. Cassou solicitou que não seja programada essa mudança para antes de 16 de setembro pois nesta data iniciará a semana de conciliação. Natacha irá informar data possível posteriormente.

Estrutura atual

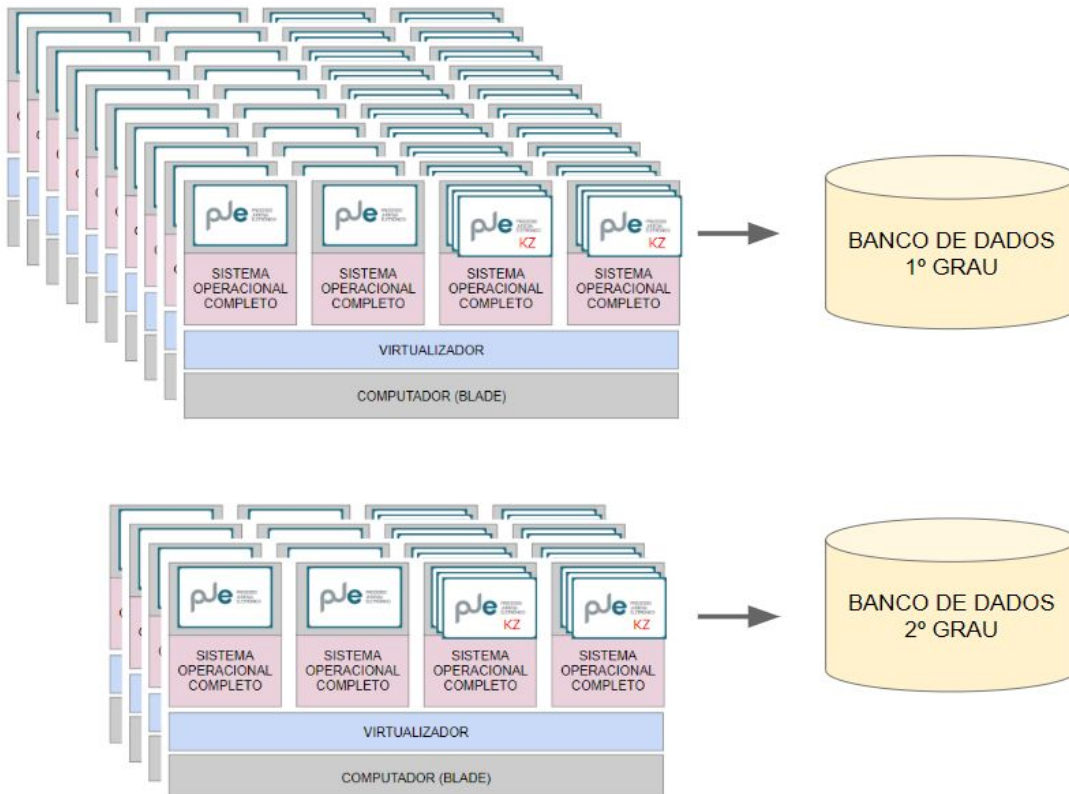

Estrutura em containers

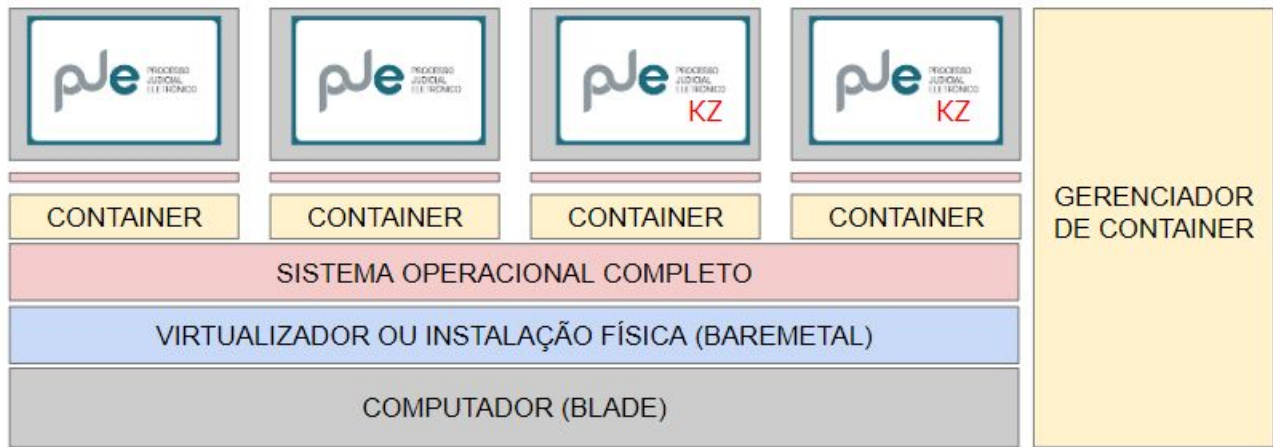

Deliberação: Aprovado.

8 Implantação do PROAD em todo o TRT da 4ª Região

Relato: Natacha relatou que o Proad novo sistema de tramitação de processos administrativos, passará a ser de uso obrigatório a partir de 02/09, por determinação da Presidência. O sistema já está implantado em toda a área administrativa do TRT, realizados treinamentos e operações assistidas.

9 Outros assuntos

Dr. Cassou demonstrou preocupação com os usuários, que terão sua forma de trabalho bastante alterada com a nova versão do Pje. Pablo ressaltou que todas as novas funcionalidades e mudanças em funcionalidades já existentes foram profundamente abordadas nos treinamentos e que os Diretores de Varas foram bem preparados e estão tranquilizados. Treinadas 180 pessoas nas turmas presenciais e mais 500 através do EAD. Ressaltou ainda que a participação de Juízes foi baixa nos treinamentos específicos para Magistrados mas que acredita que serão bem apoiados pelos Diretores de Secretaria. Jeferson salientou que as mudanças são para melhorar as atividades e que os Diretores mostraram-se satisfeitos nos treinamentos.

Reunião foi encerrada às 15h.
